

**INFORME
TECNICO DE
CAMPO**

INFORME TÉCNICO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN" AÑO 2021

VISTA PREVIA ESTADO ACTUAL DE TRAMO DE CALLE



CANDIDO HERNANDEZ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



F
[Handwritten signature]




ADMINISTRADOR DE CONTRATO

REPORTE TECNICO DE CAMPO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: mayo Día 17 Año 2021</p>	<p>PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO, INICIANDO CON LA DEMOLICIÓN DE LA CAPA DE CONCRETO.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Operador de retroexcavadora, 1- Motorista. Equipo: 1- Retroexcavadora, 1- Camión de volteo.</p>
<p>Para este día se autoriza la ORDEN DE INICIO DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021</p> <p>SE HACE UN RECORRIDO, EL PERSONAL ADMINISTRATIVO INVOLUCRADO PARA IDENTIFICAR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL USO VEHICULAR Y AUNADO A ELLO LOS NACIMIENTOS DE AGUA OCACIONADO POR LAS LLUVIAS.</p>	<p>Administrador de contrato</p> <p>Cándido Hernández</p> <p>F</p>  


REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: mayo Día 18 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
 <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Operador de retroexcavadora, 1- Motorista. Equipo: 1- Retroexcavadora, 1- Camión de volteo.</p>	La actividad se realiza con maquinaria y equipo proporcionado por la alcaldía municipal. Cantidad existente realiza con maquinaria y equipo 316.69 M ² Desajo de material. Cantidad 33.00 M ³ Realizado. 100%	Demolicion de capa de concreto existente realiza con maquinaria y equipo 316.69 M ² Desajo de material. Cantidad 33.00 M ³ Realizado. 100%

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: mayo Día 19 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Acumulación de agua en el tramo a reparar</p> 	<p>Un (01) días La actividad se realiza con herramienta manual.</p>	<p>Limpeza y desajo de agua acumulada.</p>
<p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albañil, 5- Auxiliares. Equipo: herramienta menor</p>		

F. 

Cándido Hernández

Administrador de contrato




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: mayo Día 19 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Personal preparando el suelo de base para colocar lodocreto y estabilizar</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albalil, 5- Auxiliares. Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Un (01) días</p> <p>La actividad se realiza con herramienta menor, proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Limpeza y preparación de la base para colocar lodocreto.</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: mayo Día 20 Año 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal colocando lodocreto y nivelando la base</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albariles, 3- Auxiliares Herramienta menor: picochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>La actividad se realiza con herramienta menor y 1- Concreta nivelación de base manual de una bolsa, 1 vibrador, proporcionado por la alcaldía municipal.</p> <p>Cantidad 316.69 M²</p> <p>Realizado</p> <p>100%</p>	<p>➤ Trazo por unidad de área y colocación de lodocreto proporción 20:1 y nivelación de base</p> <p>➤ Colocación de concreto proporción 20:1 y nivelación de base manual de una bolsa, 1 vibrador, proporcionado por la alcaldía municipal.</p> <p>➤ Cantidad 316.69 M²</p> <p>➤ Realizado</p> <p>➤ 100%</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

F. 




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: mayo Día 21 Año 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACION</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal colocando lodocreto y nivelando la base con lodocreto.</p>  <p>Personal: 1-Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albariles, 3- Auxiliares, 1- miembro del equipo: Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc.</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: se coloca lodocreto en proporción 20:1 y nivelación de base menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trazo por unidad de área y colocación de lodocreto en proporción 20:1 y nivelación de base menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal. ➤ Realizado 100% ➤ Cantidad 316.69 M² ➤ colocación de lodocreto en proporción 20:1 y nivelación de base menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.



Candido Hernández

F

Administrador de contrato


REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: mayo Día 22 Año 2021</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p> <p>TIEMPO MÁXIMO PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>Obligaciones del contratista</p>
<p>Personal rezanando para evitar fugas de agua</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albañiles, 2- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: se realiza con herramienta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Trazo por unidad de área y colocación de concreto colocación de concreto se realiza con herramienta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

F 




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: mayo Día 24 Año 2021</p>	<p>Personal colocando lodocreto y nivelando la base</p>	<p>Trazo por unidad de área y colocación de lodocreto proporción 20:1 y nivelación de base</p>
<p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albañiles, 3- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p> 	<p>Dos (2) días Actividad: se coloca lodocreto se realiza con herramienta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 1- Albañiles, 3- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: mayo Día 25 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACION	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Personal colocando concreto $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albariles, 3- Auxiliares, 3- Auxiliares, etc. Herramienta menor: picochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días Actividad: se inicia la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm² ➤ Cantidad 316.69 M² ➤ Realizado 100%

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: mayo Día 26 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Personal colocando concreto f'c = 210 kg/ cm²</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: mayo Día 27 Año 2021</p>	<p>Personal colocando concreto f'c = 210 kg/cm²</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm²</p>
<p>Equipo: Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 6- Auxiliares</p> 	<p>Dos (2) días Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 6- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: mayo Día 28 Año 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal colocando concreto f'c = 210 kg/cm²</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 3- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: mayo Día 29 Año 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal colocando concreto $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ y cortando para sisa de dilatación @ 2.50 cm.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 3- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal. Corte de concreto con pulidora.</p>	<p>Colocación de concreto $E=10 \text{ cm}$, $F'c = 210 \text{ kg/cm}^2$</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

F 




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: mayo Día 31 Año 2021</p> <p>Personal colocando concreto f'c = 210 kg/cm²</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 4- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández





REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: Junio Día 01 Año 2021</p> <p>Personal colocando concreto f'c = 210 kg/cm² y cortando para sisa de dilatación @ 2.50 cm.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: Junio Día 01 Año 2021</p>	<p>Personal colocando concreto f'c = 210 kg/ cm²</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm, F'c =210 kg/cm²</p>
<p>Equipo: Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días Actividad: se continúa con la colocación de concreto, se realiza con herramienta menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm, F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: Junio Día 02 Año 2021</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p> <p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>Excavación para colocar tubería perforada para drenar agua de un nacimiento en tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p> <p>Excavación para colocar tubería perforada para drenar agua de un nacimiento en tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p> <p>▶ Cantidad 32.00 ML:</p> <p>▶ ▶</p>
<p>Personal: Excavando, perforando tubo de pvc 4" para colocar y drenar un nacimiento de agua para proteger el concreto.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares</p> <p>Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc.</p> <p>Equipo:</p>	<p>Actividad: Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p> <p>Dos (2) días</p>	<p>▶ Excavación para colocar tubería perforada para drenar agua de un nacimiento en tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p> <p>▶ ▶</p> <p>▶ Cantidad 32.00 ML:</p> <p>▶ ▶</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

F




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: Junio Día 03 Año 2021</p>		
<p>Personal: colocando tubo de pvc 4" y drenar un nacimiento de agua para proteger el concreto.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albaniles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Excavación para colocar tubo</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: Junio Día 03 Año 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal: perforando tubo de pvc 4" y drenar un nacimiento de agua para proteger el concreto.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albaniles, 5- Auxiliares, Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc.</p> <p>Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocación de tubo pvc de 4" para drenaje ➤ Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal. ➤ Realizado 100% ➤ Cantidad 32 ML. ➤ Colocación de tubo pvc de 4" para drenaje ➤ Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1- Concretera manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.

Administrador de contrato

Cándido Hernández

[Handwritten signature]




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: Junio Día 03 Año 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal: colocando tubo de pvc 4" y drenar un nacimiento de agua para proteger el concreto.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1-Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocación de tubo pvc de 4" para drenaje ➤ Cantidad para colocar 32 ML. ➤ Realizado 100%

Administrador de contrato

Cándido Hernández

F 



REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: Junio Día 03 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Personal: colocando grava #1 y tubo de pvc 4" para drenar un nacimiento de agua para proteger el concreto.</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albariles, 5- Auxiliares, Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días Actividad: Preparación de suelo y excavación para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1-Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colocación de tubo pvc de 4" para drenaje ➤ Preparación de frases ➤ Cantidad para colocar tubería de pvc de 4", se realiza con herramienta menor y 1-Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal. ➤ Realizado 100%

Administrador de contrato

Cándido Hernández





REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

<p>SEGUIMIENTO DEL CONTRATO</p> <p>Mes: junio Día: 04 Año: 2021</p>	<p>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN</p>	<p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p>
<p>Personal: Colocando concreto</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: colocación de concreto se realiza con herramienta menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal.</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm. F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández

F. 




REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: junio Día 05 Año 2021</p> <p>Personal: Colocando concreto</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días</p> <p>Actividad: colocación de concreto se realiza con herramienta menor y 1- Concreta manual de una bolsa, 1- vibrador proporcionado por la alcaldía municipal. Este día se termina el concretoado y se continúa con la limpieza y resane de cordón cuneta</p>	<p>Colocación de concreto E=10 cm, F'c =210 kg/cm²</p>

Administrador de contrato

Cándido Hernández





REPORTE TECNICO DE CAMPO


ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AÑO 2021"

Realizador: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISIÓN: ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Mes: junio Día 05 Año 2021	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA CADA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Personal: Resanando canaleta</p>  <p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albariles, 5- Auxiliares Herramienta menor: piochas, palas, barras. Etc. Equipo:</p>	<p>Dos (2) días Actividad: se continúa con la limpieza y resane de cordón cuneta</p>	<p>Resane y limpieza de canaleta. Cantidad 125.70 ML. Realizado 100%</p>

F. 
Cándido Hernández
Administrador de contra



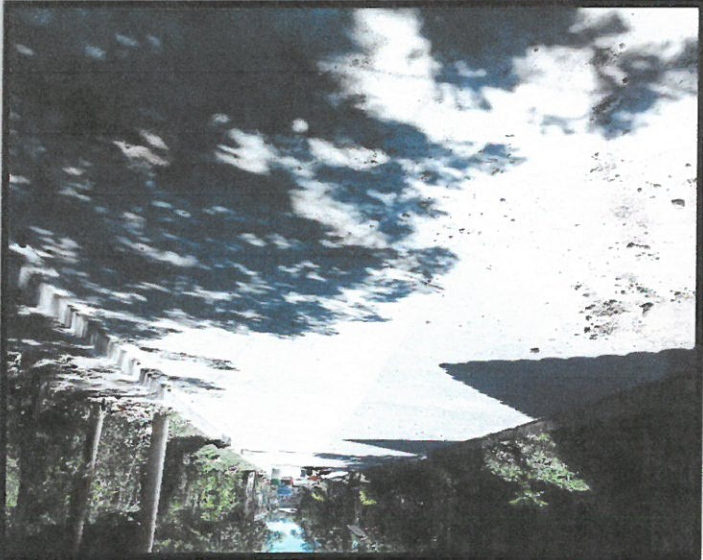
REPORTE TECNICO DE CAMPO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Nombre del proyecto: "REPARACION DE BACHES EN CALLE MORAZAN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AÑO 2021"


Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO

SUPERVISION: ADMINISTRACION ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO.

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PARA LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
<p>Mes: junio Día 05 Año 2021</p> <p>Vista de tramo ya terminado</p>  <p>Vista de tramo ya terminado</p>	<p>Veinticuatro (24) días</p>	<p>Resane y limpieza de canaleta</p>
<p>Personal: 1- Administrador de contrato, 1- miembro del consejo, 4- Albañiles, 5- Auxiliares</p> <p>Herramienta menor: piochas, palas, barras, Etc.</p> <p>Equipo:</p>		

Administrador de contrato

Cándido Hernández





HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN PROYECTO: REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN,
MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.

Herramienta o material	Cantidad	Unidad	Calidad	Estado actual
Carretilla manual (Truper)	3.00	Un.	nuevas	Buenas
Barriles de metal	2.00	Un.	nuevos	buenos
Pala cuadrada mango corto	4.00	Un.	nuevos	buenas
Piocha	1.00	Un.	nuevos	buena
Cubetas plásticas	10.00	Un.	Usadas	buenas
Guacal plástico pequeño	1.00	Un.	Usado	bueno
Polín c de 4" ch. 16, enteros.	9.00	Un.	nuevos	buenos
Tubo 2x2" galvanizado	2.00	Un.	nuevos	buenos
Barras lineales	2.00	Un.	nuevas	buenas
Depósito para agua 2.500 lit.	1.00	Un.	Usados	bueno
Tubos rectangulares 2x1" galv.	5.00	Un.	nuevos	buenos
Concretera (alq.)	1.00	Un.	Usada	buena
Escobas	3.00	Un.	nuevas	buenas
Azadón	1.00	Un.	nuevo	bueno
Almádana de 4 lbs.	1.00	Un.	nueva	buena

MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO

CEMENTO HOLCIN
GRAVA # 1
ARENA
MATERIAL SELECTO (TIERRA BLANCA)


Cándido Hernández
Administrador de contrato



INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO

No. de Contrato: LG 01/2021 AMC		Año: 2021	
Nombre del Contratista:		ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO	
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	Hasta:
Día	Mes	Año	Día
17	05	2021	09
Año		Año	
2021		2021	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: "REPARACIÓN DE BACHES EN CALLE MORAZÁN, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.							
Vigencia del contrato		Desde		Hasta		Año	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes
17	enero	2021	09	junio	2021		
Año		Año		Año		Año	
2021		2021		2021		2021	

Periodo de vigencia de Garantía de:

Cumplimiento de contrato:		NO APLICA	
Garantía de anticipo		NO APLICA	
Buena obra:		NO APLICA	
Buen servicio, funcionamiento y calidad:		NO APLICA	
Otras (Especificar)		NO APLICA	

(Cuando aplique)

FECHA DE ORDEN DE INICIO		FECHA DE LA RECEPCIÓN FINAL	
Día	Mes	Año	Día
17	MAYO	2021	09
Año		Año	
2021		2021	

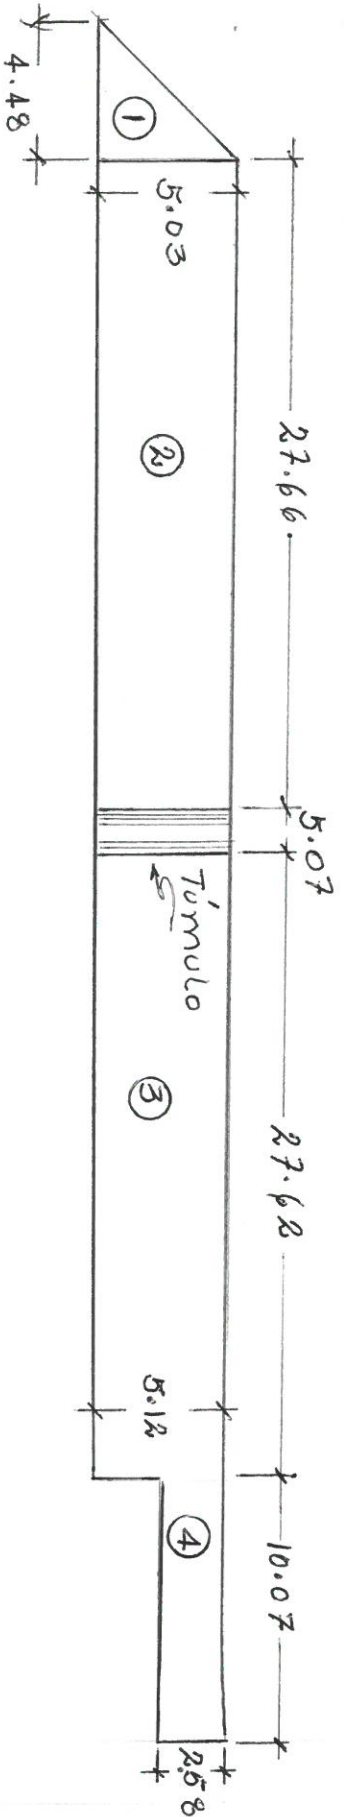
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	1
FECHA DE ENTREGA CONFORME A CONTRATO	09/06/2021
FECHA REAL DE ENTREGA	09/06/21
AVANCE/ ESTADO	100%

3 MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ORDENES DE CAMBIO/PRORROGAS



TRAMO DE CALLE A REPARAR



① A = 11.267

② A = 139.13

③ A = 141.41

④ A = 25.98

Total 317.787

