



**INFORME TRABAJOS PREVIOS
ANDALP-T-RL-D-010 Memoria Descriptiva**

JULIO 2018

UDP CONSORCIO VIELCA EC CONSULTORES
POTABILIZADORA LAS PAVAS

VIELCA EC
INGENIEROS

Índice

1.	OBJETO.....	3
2.	RESUMEN EJECUTIVO.....	3
3.	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.....	3
	3.1. TRABAJOS PREVIOS.....	4
4.	DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA MEMORIA DESCRIPTIVA.....	5
	4.1. ESQUEMA GENERAL DE UBICACION.....	5
	4.2. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA.....	5
	4.3. GEOLOGÍA Y MECÁNICA DE SUELOS.....	6
	4.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y BALANCE HÍDRICO.....	6
	4.4.1. HIDROLOGÍA.....	6
	4.4.2. HIDRÁULICA.....	6
	4.4.3. BALANCE HÍDRICO.....	7
	4.5. CÁLCULOS ESTRUCTURALES.....	7
	4.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.....	7
	4.7. CRONOGRAMA DE TRABAJOS.....	7
	4.8. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.....	8
	4.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL.....	9
5.	PRESUPUESTO.....	9
6.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA.....	9
7.	PROGRAMACION FINANCIERA.....	10
8.	CONCLUSIÓN.....	10

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir las actuaciones a desarrollar en el río Lempa para mejorar la calidad de las aguas captadas en la Bocatoma de la Planta Potabilizadora de Las Pavas, al tiempo que se establece una protección del entorno para avenidas de hasta 200 años de periodo de retorno.

2. RESUMEN EJECUTIVO.

El presente documento desarrolla, los trabajos necesarios para llevar a cabo la construcción de las Actuaciones en el río Lempa, dentro del contrato de construcción “TRABAJOS PREVIOS”,


3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El río Lempa atraviesa gran parte de El Salvador y su cuenca abarca otras dos naciones vecinas, como son Guatemala y Honduras. Es uno de los emblemas nacionales y cualquier actuación propuesta en su entorno debe ser realizada desde el máximo respeto y consideración hacia el medio ambiente y los ecosistemas que lo constituyen.

Las obras propuestas en los trabajos previos a la altura de la obra de Bocatoma de la Planta Potabilizadora de Las Pavas, incluyen los trabajos previos como el corte y transporte del material depositado en la margen derecha, así como la construcción del paso provisional por el río para acceder a la margen izquierda.

El objetivo perseguido con su construcción, es tener acceso a la margen izquierda, además de contar con el material necesario para construcción de la ataguía.


3.1. TRABAJOS PREVIOS.

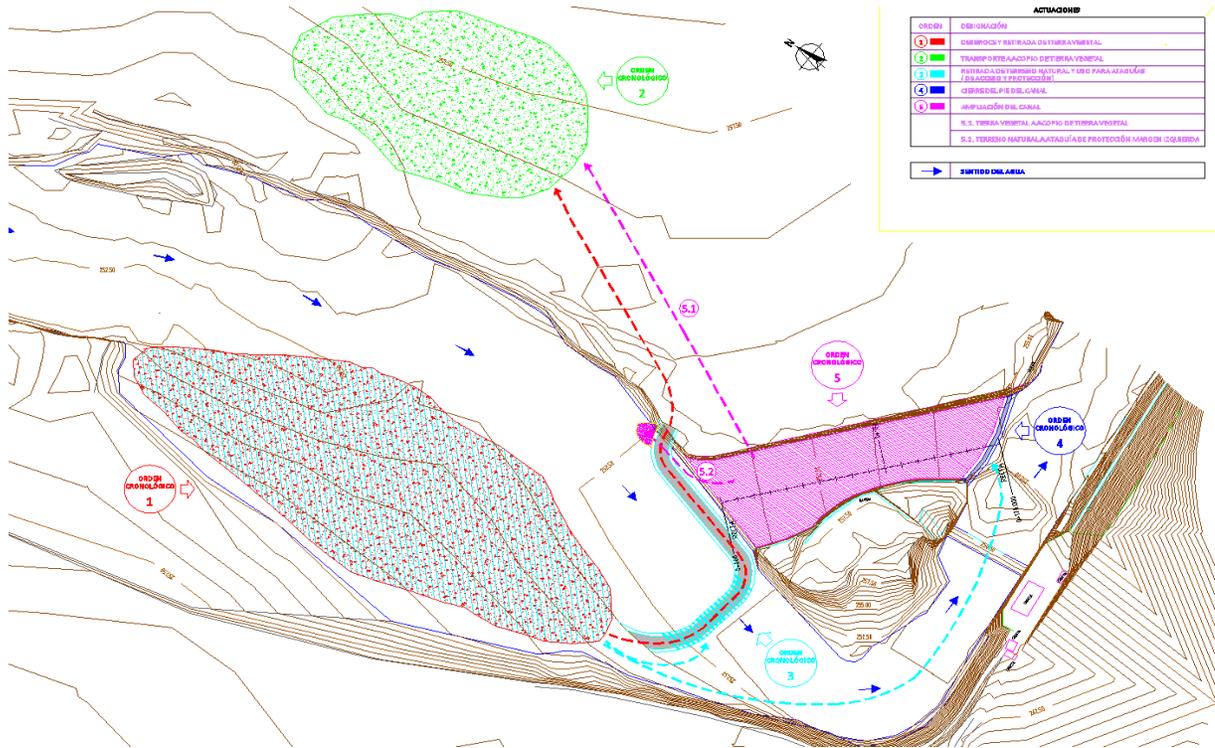

Previo al inicio de las obras de la protección de la margen izquierda, se plantea la construcción de un paso provisional, para el desarrollo de dicha obra, este servirá para el traslado del material proveniente de las excavaciones, como materiales para la construcción de la ataguía y el muro de gaviones.

4. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA MEMORIA DESCRIPTIVA.

4.1. ESQUEMA GENERAL DE UBICACION

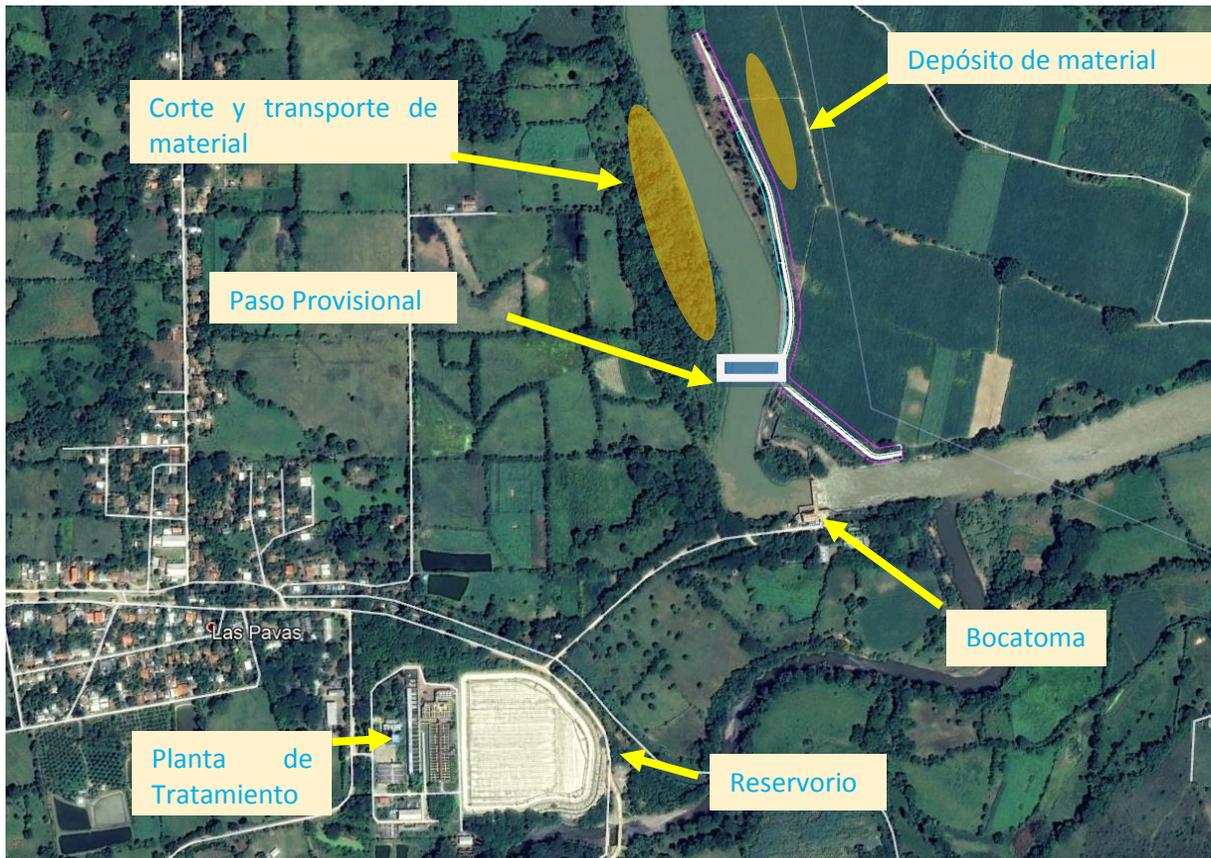

4.2. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA

Dentro de los estudios previos de la consultoría se presentó un estudio topográfico y batimétrico que define el estado actual del río Lempa en el entorno de la Bocatoma.

Los levantamientos realizados sirven como base para el desarrollo de los modelos hidráulicos que justifican el dimensionamiento de las infraestructuras proyectadas en el presente proyecto.

4.3. GEOLOGÍA Y MECÁNICA DE SUELOS

Una parte de los resultados geológicos y de mecánica del suelo presentados en los estudios previos hace referencia al entorno de estudio donde se van a realizar las actuaciones en el río Lempa.

El anejo presenta el encuadre geológico del entorno de la Bocatoma y los resultados de los sondeos y demás ensayos realizados en el río para el diseño y construcción de las obras de protección.

4.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y BALANCE HÍDRICO

El presente estudio comprende tres estudios secuenciales diferenciados que establecen por orden: los caudales, el comportamiento hidráulico y el balance hídrico en el entorno de la Bocatoma.

4.4.1. HIDROLOGÍA

La hidrología es la encargada de determinar los caudales circulantes por el río.

En este caso se ha establecido un modelo matemático que relaciona los caudales con las precipitaciones máximas diarias en la estación pluviométrica de El Zapotillo. El modelo está calibrado para dicho punto y permite delimitar la cuenca hasta dicho punto.

De este modo, la cuenca del río Lempa comprendida entre cabecera y la estación de El Zapotillo, que corresponde casi en su totalidad con el Área del Trifinio y engloba tres naciones (Guatemala, Honduras y El Salvador), queda determinada.

A partir de ahí se completa la hidrología con un modelo HEC-HMS entre la estación de El Zapotillo y el entorno de la Bocatoma de la Planta Potabilizadora de Las Pavas.

4.4.2. HIDRÁULICA

Se ha empleado el modelo *IBER* para resolver la hidráulica en 2D del entorno de la Bocatoma.

La geometría de cálculo queda determinada por los estudios topográfico y batimétrico, mientras que las condiciones de contorno e internas varían en los distintos modelos planteados.

Se han planteado tres modelos diferenciados, que determinan el funcionamiento del Estado Actual del río Lempa, su comportamiento tras realizar unas obras de Dragado y Protección de la Margen Izquierda, y su respuesta.

Finalmente se ha realizado un modelo 1D con *HEC-RAS* para evaluar el comportamiento de los diseños propuestos para un caudal de diseño correspondiente con un periodo de retorno de 200 años.

4.4.3. BALANCE HÍDRICO

El balance hídrico se determina estudiando el comportamiento del sistema río Lempa en los distintos modelos e hipótesis planteados en el apartado hidráulico.

En todos los casos el río está controlado por vertederos que plantean una relación unívoca entre caudal y calado, por lo que el estudio se centra en la determinación de dichas relaciones.

4.5. CÁLCULOS ESTRUCTURALES

Se definen los cálculos estructurales de la protección de márgenes.

4.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Se trata del documento donde se desarrollan y argumentan las conclusiones presentadas de la presente memoria descriptiva.

4.7. CRONOGRAMA DE TRABAJOS

El cronograma de trabajos define el orden y las interacciones de las distintas actuaciones planteadas durante su construcción.

Cabe destacar que los trabajos en el río deben realizarse en época seca, para minimizar los problemas que puedan surgir en las protecciones temporales y trabajar con mayor seguridad.

4.8. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Establece los procedimientos constructivos para llevar a cabo los diferentes trabajos definidos en las obras.

Para cada uno de los trabajos definidos establece en qué momento se debe ejecutar cada uno, el tipo de protecciones y desvíos que son necesarios, las condiciones de humedad del terreno, los accesos de materiales y maquinaria, etc.

Para ejecutar los distintos trabajos se plantea la ejecución de ataguías de tierra de manera que se puedan desarrollar en seco.

Una secuencia lógica de ejecución de los trabajos planteados sería la siguiente:

- Trabajos previos.
- Obras de protección de la margen izquierda.
- Ampliación del canal de alivio.
- Obras de dragado en el lecho del cauce principal.
- Protección del fondo de la bocatoma.
- Construcción del rebosadero.
- Protección del estribo izquierdo de la bocatoma.
- Desvío de obras de drenaje.

Las obras se inician con los “trabajos previos”, que comprenden la construcción provisional de un paso vehicular a través del río para el transporte de materiales. Con los trabajos previos realizados se procederá a ejecutar las “Obras de protección de la margen izquierda”, y por último las obras construcción del rebosadero.

Por su parte, las “obras de desvío de drenaje” se pueden abordar indistintamente de manera conjunta con las otras obras.

4.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL

Se presentan los criterios fundamentales y específicos de seguridad industrial e higiene ocupacional relacionados con obras de movimientos de tierra y construcción de defensas en ambientes fluviales.

5. PRESUPUESTO.

01.01 TRABAJOS PREVIOS DESVÍO CAUCE					
Código	Ud	Resumen	Cantidad	Precio Unitario	Parcial
01.01.01	m3	Extendido y compactado de suelo saturado de la obra en cauce	13,060.00	\$6.20	\$80,972.00
		Extendido y compactación en cauce de suelo saturado procedente de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % AASHTO T-180, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado.			
01.01.02	m3	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.	13,060.00	\$2.64	\$34,478.40
		Excavación en zona de desmonte, de terreno saturado, con medios mecánicos y carga sobre camión.			
01.01.03	m3	Transp.material excavación a vertedero autorizado	15,019.00	\$6.25	\$93,868.75
		Transporte de tierras a vertedero o lugar autorizado, con camión y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a cualquier distancia.			
01.01.04	m	Tub.concreto Ø1000 mm.	220.00	\$97.51	\$21,452.20
		Tubo de concreto de diámetro 1000 mm, rejuntado interiormente con mortero seco de cemento 1:4 con aditivos plastificantes, colocado. Se incluye el desplazamiento y la recolocación en varios puntos dentro de la obra.			
Sub Total					\$230,771.35
Iva					\$30,000.28
Total 01.01					\$260,771.63

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA.

Se ha establecido un inicio de las obras con fecha 17/12/2018 con el objeto de que todos los trabajos en el cauce se realicen durante la época seca.

El Plazo total previsto para la ejecución de la obra asciende a DOS (2) meses desde la firma de inicio de los trabajos.

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	TOTAL
1.01	TRABAJOS PREVIOS			
01.01.01	Extendido y compactado de suelo saturado de la obra en cauce			35%
01.01.02	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.			15%
01.01.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado			41%
01.01.04	Tub.concreto Ø1000 mm.			9%
	AVANCE MENSUAL	50%	50%	100%
	AVANCE ACUMULADO	50%	100%	

7. PROGRAMACION FINANCIERA.

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1 (\$)	MES 2 (\$)	SUB TOTAL (\$)
1.01	TRABAJOS PREVIOS DESVÍO CAUCE			
01.01.01	Extendido y compactado de suelo saturado de la obra en cauce	\$ 30,000.00	\$ 50,972.00	\$ 80,972.00
01.01.02	Excavación desmonte suelo saturado,m.mec.,carga cam.	\$ 20,000.00	\$ 14,478.40	\$ 34,478.40
01.01.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado	\$ 45,000.00	\$ 48,868.75	\$ 93,868.75
01.01.04	Tub.concreto Ø1000 mm.	\$ 21,452.20		\$ 21,452.20
	SUB TOTAL	\$116,452.20	\$ 114,319.15	\$ 230,771.35
	IVA =	\$ 15,138.79	\$ 14,861.49	\$ 30,000.28
	MONTO TOTAL =	131,590.99	129,180.64	260,771.63
	AVANCE MENSUAL	50.46%	49.54%	100.00%
	AVANCE ACUMULADO	50.46%	100.00%	


8. CONCLUSIÓN.

Se han descrito las actuaciones previstas para mejorar la operatividad y captación en la bocatoma de la Planta Potabilizadora de Las Pavas.

Al mismo tiempo se han presentado los documentos que acompañan a la presente memoria descriptiva y los indicadores presupuestarios y de planificación de obra relativos al presente proyecto constructivo.

Con todo ello se considera que el proyecto es completo y su definición suficiente para poder llevar a cabo los trabajos planteados.

Anexo 1. Resolución Ambiental.

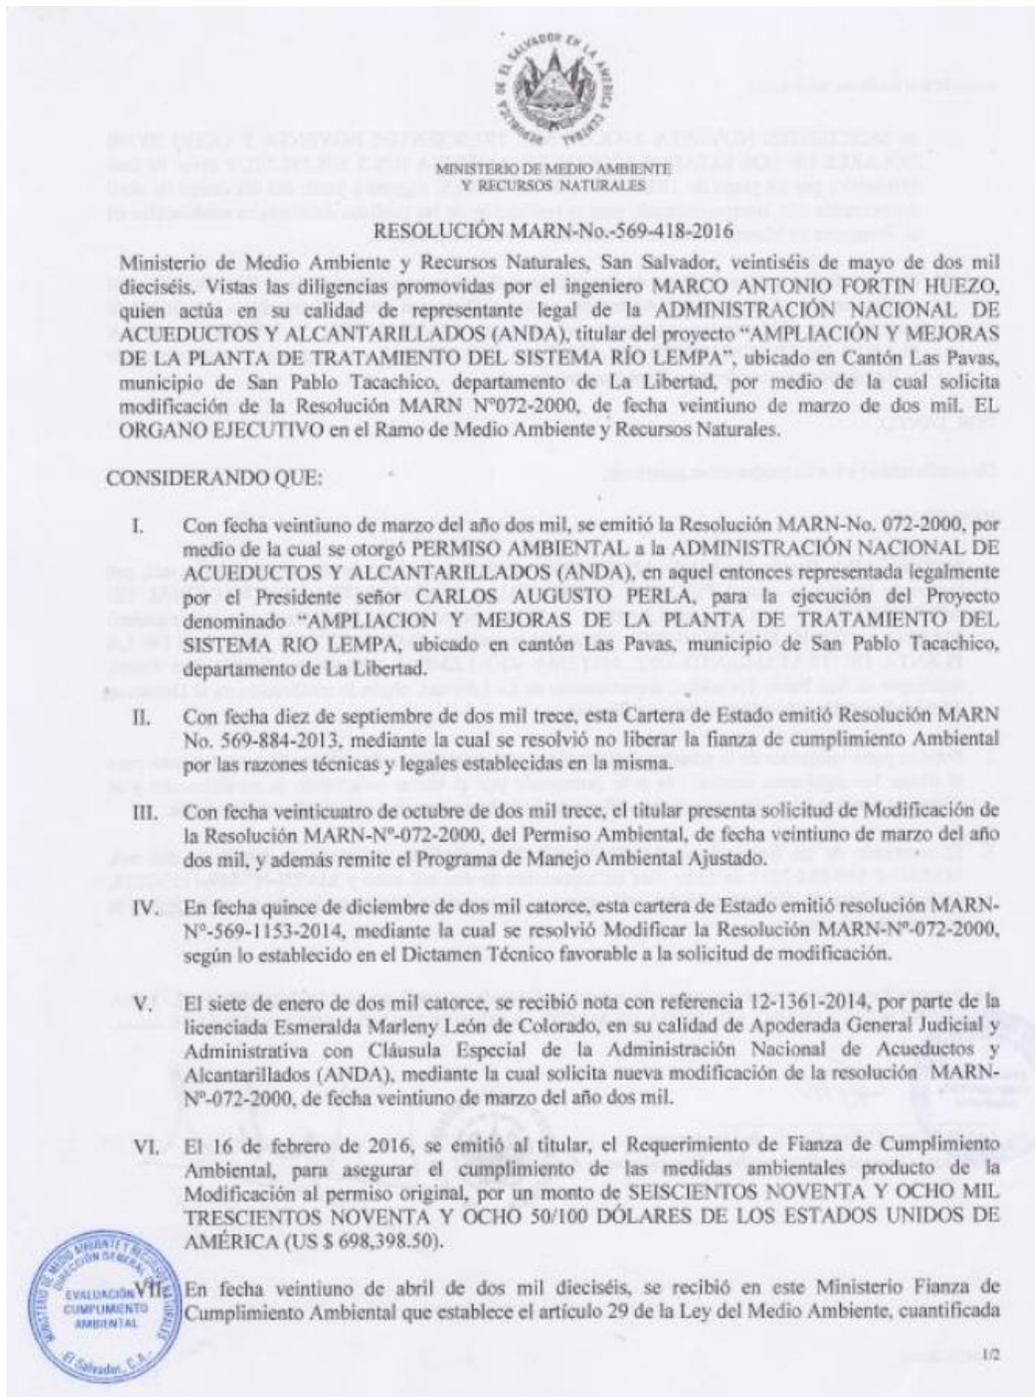



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

RESOLUCIÓN MARN-No.-569-418-2016

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, San Salvador, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Vistas las diligencias promovidas por el ingeniero MARCO ANTONIO FORTIN HUEZO, quien actúa en su calidad de representante legal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANANDA), titular del proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA RÍO LEMPA", ubicado en Cantón Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, por medio de la cual solicita modificación de la Resolución MARN N°072-2000, de fecha veintiuno de marzo de dos mil. EL ORGANISMO EJECUTIVO en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CONSIDERANDO QUE:

- I. Con fecha veintiuno de marzo del año dos mil, se emitió la Resolución MARN-No. 072-2000, por medio de la cual se otorgó PERMISO AMBIENTAL a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANANDA), en aquel entonces representada legalmente por el Presidente señor CARLOS AUGUSTO PERLA, para la ejecución del Proyecto denominado "AMPLIACION Y MEJORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA RIO LEMPA, ubicado en cantón Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad.
- II. Con fecha diez de septiembre de dos mil trece, esta Cartera de Estado emitió Resolución MARN No. 569-884-2013, mediante la cual se resolvió no liberar la fianza de cumplimiento Ambiental por las razones técnicas y legales establecidas en la misma.
- III. Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, el titular presenta solicitud de Modificación de la Resolución MARN-N°-072-2000, del Permiso Ambiental, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil, y además remite el Programa de Manejo Ambiental Ajustado.
- IV. En fecha quince de diciembre de dos mil catorce, esta cartera de Estado emitió resolución MARN-N°-569-1153-2014, mediante la cual se resolvió Modificar la Resolución MARN-N°-072-2000, según lo establecido en el Dictamen Técnico favorable a la solicitud de modificación.
- V. El siete de enero de dos mil catorce, se recibió nota con referencia 12-1361-2014, por parte de la licenciada Esmeralda Marleny León de Colorado, en su calidad de Apoderada General Judicial y Administrativa con Cláusula Especial de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA), mediante la cual solicita nueva modificación de la resolución MARN-N°-072-2000, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil.
- VI. El 16 de febrero de 2016, se emitió al titular, el Requerimiento de Fianza de Cumplimiento Ambiental, para asegurar el cumplimiento de las medidas ambientales producto de la Modificación al permiso original, por un monto de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 698,398.50).



VII. En fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se recibió en este Ministerio Fianza de Cumplimiento Ambiental que establece el artículo 29 de la Ley del Medio Ambiente, cuantificada

1/2

Anexo 2. Programa de Manejo Ambiental.

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GERENCIA DE EVALUACION AMBIENTAL**

Cronograma de Ejecución del Programa de Manejo Ambiental Ajustado:

Tabla 40. Cronograma de ejecución de las medidas ambientales de prevención, atenuación y compensación propuestas.
Preparación del Sitio, Construcción y Funcionamiento

DESCRIPCIÓN	US \$	MES												AÑOS		
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN																
1. Compensación:																
Tala Controlada	8,600.00															
Arborización Compensatoria	8,329.50															
Traspante a Zonas verdes según propuesta de revegetación	13,825.00															
2. Prevención: Observación, Captura y Restauración de la Fauna Terrestre por alteración temporal de hábitats de la zona de acceso provisional con un área de 225 m ² en la margen derecha del río por el dragado de la barra de sedimentación	7,600.00															
3. Atenuación:																
Construcción de Atajados terrestres para obras de cierre parcial del flujo del caudal hacia la Sonajera	220,773.23															
Talón de Desviación	1,200.00															
Rehabilitación	950.00															
Construcción de canal rectangular de tierra en segunda Bosque de Galería	10,099.00															
4. Atenuación: Humectación durante la época seca en calles donde circula la maquinaria pesada y Mantenimiento preventivo de Mamparas	12,960.00															
5. Prevención: Señalización y seguridad personal en las calles adyacentes a la zona del proyecto	3,840.00															
6. Atenuación: Manejo y disposición adecuada de los desechos generados en el proyecto	32,910.00															
7. Prevención: Uso de sanitarios portátiles con su respectivo mantenimiento de limpieza sanitaria, dotamiento autorizado por el SANSA	5,120.00															
8. Prevención: Implementación del Plan de Contingencias Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en los Lugares de trabajo	6,500.00															
9. Atenuación: Construcción de medidas de control de la erosión en sitios de disposición final del material. Obra de Drenaje Hidráulico Sitios B, C y Bocanera. Cerramiento de Taludes Sitios B y C.	230,254.00															
ETAPA DE CIERRE DE PLANTEL Y OBRAS TEMPORALES (aceros, atajados)	25,860.00															
SUB-TOTAL	5096,295.65															

DESCRIPCIÓN	US \$	MES												AÑOS		
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO																
10. Atenuación: Realización de agua de proceso por mejora al sistema de potabilización	0.00															
11. Mitigación: Distribución de agua potable	0.00															
12. Mitigación: Inspección y Mantenimiento de obras en el río	49,032.10															
13. Compensación: Reforestación por compensación de Áreas Verdes seleccionadas	6,256.07															
14. Prevención: Mantenimiento de Contenedores Sitios de disposición final y Obras de drenaje hidráulico en sitios B, C y Bocanera	19,254.40															
SUB-TOTAL	75,532.57															
15. Monitoreo Medidas Ambientales-Etapa Construcción	17,694.00															
16. Monitoreo Medidas Ambientales-Etapa Funcionamiento	8,402.00															
TOTAL	\$ 594,280.22															

LIDIA BARLENY LEÓN DE COLORADO
 Apoderada General-Audicial-Administrativa con Causalidad Especial

9. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO Y SU MODIFICACIÓN:

- Con excepción de las restricciones y condiciones de cumplimiento obligatorio indicadas en el presente documento, el titular deberá ejecutar la obras planteadas según lo especificado en la documentación presentada con fecha 23 de diciembre de 2015, la cual respalda la evaluación ambiental de las obras complementarias asociadas con los impactos no previstos por el proyecto, incluyendo el nuevo Programa de Manejo Ambiental presentado y la demás información complementaria que sirvió de fundamento para el presente dictamen técnico.
- Es responsabilidad exclusiva del titular del proyecto ejecutar el Programa de Manejo Ambiental Ajustado, tal como está especificado en el documento de Modificación que sirvió de fundamento para este dictamen, pudiendo este Ministerio realizar, sin previo aviso, las Auditorías de Evaluación Ambiental correspondientes, para efectos de verificar el cumplimiento del desempeño ambiental y las condiciones establecidas en la documentación ambiental vigente.
