



FISDL



Documento en versión pública elaborada de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP): “En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.

En inscrito Oficial de Información hace del conocimiento del público en general, que el documento es una copia fiel del documento original en su versión electrónica, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la LAIP “Los documentos emitidos por los órganos de la Administración Pública utilizando tecnologías de la información y comunicaciones gozarán de la validez de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación, y el cumplimiento de requisitos y garantías que disponga la legislación pertinente”.


Roberto Molina





Oficina de información y respuesta

10º Avenida Sur y Calle México, barrio San Jacinto, frente a ex casa
Presidencial, San Salvador, El Salvador. Email: oir@fisdl.gob.sv,
teléfonos +503 2133-1309 y +503 7850-4654

HOJA

Nº 010

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, S.A. de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 03.03.20

Asesor Mpa

- En fecha 04.03.20 finalizan los primeros 30 días en periodo de multa por parte del realizador, por lo que se solicita al supervisor establecer la brevedad, a través del reporte de levantamiento de obra, el % de obra pendiente de ejecutar al inicio del 2º periodo de 30 días.
- Se requiere que el Ing. Presidente haga sus anotaciones en bitácora de las incidencias del proyecto.
- Durante esta visita se verificó que la actividad de suministro y colocación de grava 3/4" en la cancha de fútbol no ha tenido avances, por lo que se le recuerda al contratista lo establecido en la Cláusula Decima Cuarta: Responsabilidad del Contratista, literal a) "Realizar todo el trabajo y entregar la obra finalizada y que el Contratante la reciba a entera satisfacción, utilizando todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para llevar a cabo lo estipulado en este contrato, ..."; literal h) "Encargar con anticipación el suministro de materiales a emplear en la obra para que no sea objeto de retraso y evitar así posibles alzas de precios de materiales, ...".



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Herbert Cisneros Jrias
 Representante Supervisor No A-1324



Representante Contratista
 Representante FISDL

Representante Comunidad/
 Otros (Si Aplica)

HOJA Nº 011

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Crodisa
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 03.03.20

Asesor Mpa

- Respecto a las Conexiones domiciliarias tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario que requiere el proyecto, en repetidas ocasiones se solicitó al personal técnico del contratista, documentos que comprueben las gestiones realizadas en agencia AINDA para su instalación, sin que a la fecha se hayan presentado comprobantes. Se recuerda al Contratista que éstas instalaciones son actividades contractuales, y que no se podrá recibir provisionalmente el proyecto mientras no sean terminadas y finalizadas.

- En esta fecha se ha solicitado al Contratista la ampliación en tiempo de la póliza de seguro de protección contra todo riesgo para construcciones en proceso, debido a su próximo vencimiento.

Al Gto CC se le recuerda que debe mantener señalizada o delimitar con cinta amarilla las zonas de trabajo, y mantener al día el expediente correspondiente al PCC.

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Jrias
 Representante Supervisor **Nº A-1324**

[Redacted Signature]



Representante Contratista
 [Redacted Signature]

Representante Comunidad/
 Otros
 (Si Aplica)

Representante FISDL

HOJA No. 012

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA

Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COSTE PEQUE

Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR

Nombre del Contratista: ML CONSTRUCTORA SA de CV.

Código del Proyecto: 344310 Fecha: 3 DE ~~FEVERO~~ 2020
MARZO

Del SUPERVISOR

- Se continúan realizando las actividades de Colados de Acera en diferentes áreas del proyecto, se requiere de un mayor suministro de arena, ya que actualmente existe poco de este petreo para la cantidad de obra que hace falta.
- Se esta a la espera de que se suministre mas grava de $\phi 3/4"$ de tal forma de terminar con este petreo y aplicar en la superficie de la cancha de football la capa de grava de $\phi 3/8"$.
- El proceso de pintura en paredes ya no ha continuado en las partes internas de la edificación del GICC, en cuanto a las paredes externas su acabado final sera de color GRIS PERLA (B5A36) de la cartilla de colores de la linea EXCELLO latex de Sherwin Williams.
- Asimismo las actividades que no se les esta dando continuidad se pueden mencionar; - colocación de piso de ceramica; instalación de cielo falso; instalación de ventanas entre otras.
- el día de mañana 4 Marzo finalizan los primeros 30 días de multa, por lo que se haya un nuevo balance de las actividades que estan pendientes para iniciar el 2do. mes de marzo.

Representante Supervisor **REGISTRACION NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS**
Walter Herbert Lisneros Jrias
No A-1324

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Representante Contratista
 Representante FISDL



HOJA No. **013**

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación col. Oredisa

Ubicación del Proyecto: AV. Coatepeque

Municipio: Soyapango Departamento: S.S.

Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de Cv.

Código del Proyecto: 344310 Fecha: 04-03-2020

✓ DEL CONSTRUCTOR:

- Este día se trabaja en Actividades de: Limpieza general Area perimetral de cancha fútbol.
- ✓ Complemento de Balcones de Ventanas.
- ✓ concreto en Aceras
- ✓ firme de concreto para piso de cerámica
- ✓ Instalación de tubería perforada sector sur cancha de futbol.
- ✓ Finalización de Bajadas de Aguas lluvias.
- ✓ Complemento Pied Agua potable para bebederos.
- ✓ Ingreso de Grava para FILTRO. de Cancha foot ball-



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS


Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor

No A-1331



Representante Contratista



Representante FISDL


Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Nombre del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Ubicación del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL CREDISA
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA MARZO
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 15/03/2020

- DEL SUPERVISOR,
- ✓ ESTE DIA CONSTATE EL SUMINISTRO DE LA GRAVA DE $\phi 3/4"$ QUE SE TRajo AL PROYECTO, CUMPLIENDO CON LA CANTIDAD Y TAMPANO QUE SE REQUIERE
 - ✓ SE LE EXIGE AL CONTRATISTA MOSTRAR LOS COMPROBANTES DE GESTION QUE SE EXEN HACIENDO EN ANDO, EN RELACION AL TRAMITE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS QUE YA HASTA LA SAJEDAD SE HA SAJOTADO, ES IMPORTANTE ACUAR QUE SI ESTE ITEM NO SE FINIJA, LA LIQUIDACION NO SE PODRA DAR Y ESTARA SIEMPRE EN PROCESO DE MULTA EL PROYECTO.
 - ✓ ESTE DIA SE PRESENTACION LOS SUBCONTRATISTAS QUE ESTAN INSTALANDO EL CIELO FALSO PARA COMPLETAR DE COLOCAR LAS LOSETAS EN EL AREA DE COFETERIA.
 - ✓ SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA MANTENER EN OBTICAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TERRENERIA A USAR EN LOS TRABAJOS DE COMPACTACION EN LA CANCHA DE FOOTBALL, DE TAL FORMA DE NO OCASIONAR MAS STRASOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
 - ✓ EL DIA DE AYER 4 MARZO FINALIZAN LOS PRIMEROS 30 DIAS DE multa, POR LO QUE ~~QUITA~~ EL PORCENTAJE PENDIENTE PARA INICIAR EL SEGUNDO PERIODO DE multa HA SIDO DE TERMINADO EN

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Representante Supervisor Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-1324

Representante Contratista
 Representante FISDL



Representante Comunidad/
 Otros
 (Si Aplica)

HOJA No. 015

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CRODISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COSTEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA SA DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 6 MARZO 2020



Del SUPERVISOR

- ✓ HAN LLEGADO AL PROYECTO EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA 6 BOLQUETAS DE GRAVA $\phi 3/4"$ CON CAPACIDAD DE $10M^3$ CAD UNO, EN BASE A ESO SE ESTAN INICIANDO LOS TRABAJOS DE DESPLAYAR Y COMPACTAR DICHA GRAVA HASTA LLEGAR A LOS NIVELES REQUERIDOS,
- ✓ SE REQUIERE DE PARTE DEL CONTRATISTA CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE LA "COSTANERA CURIDA" QUE VA A SER COLOCADA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FOOT BALL,
- ✓ SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE ACEPAS
- ✓ SE ESPERA DE ACUERDO A CONTRATISTA QUE LA PROXIMA SEMANA SE COMENZARAN CON LOS SIGUIENTES ACTIVIDADES
 - COLOCACION DE FASO A Y ALERO
 - CONCRETO ESTAMPADO
 - OBRA DE MECANICA DE BANCO (PASAMENOS, PUERTAS, PORTONES, BASURENOS, PORTERA ENTRE OTROS)



REGISTRO NACIONAL DE ARCHITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Jrias
 No A-1324

Representante Supervisor



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)

HOJA No. 016

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en colonia Credisa.

Ubicación del Proyecto: Final AV. Coatepeque

Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador

Nombre del Contratista: MC Constructora Sa de CV

Código del Proyecto: 344310 Fecha: 06-03-2020

del constructor:


- ✓ Se trabaja en la hechura de filtro cancha de foot ball., con el complemento de grava gruesa en la parte norte y colocación de franja en costado sur.
- ✓ Se trabaja en la construcción de aceras en la zona de canchas de BKB.
- ✓ Se Realiza limpieza general en zona poniente de cancha de foot ball.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

alter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA Nº 017

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en Cobnía credisa.
Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
Nombre del Contratista: MC Constructora Sa de cv.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: 09-03-2020.

→ DEL CONSTRUCTOR.

✓ Actividades Básicas.

- ✓ Conformación de FILTRO cancha football.
- ✓ Limpieza zona poniente de cancha.
- ✓ Preparación de terreno para Aceras
- ✓ Excavación para red de Agua potable
Zona Bebederos.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: final Av. Contepaque,
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: MARZO 9/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ Este día se continúa con los trabajos de compactación con grava $\phi 3/4"$ en la cancha de football, este día según el contratista llegaron 3 bolquetos de grava de $\phi 3/8"$ (sepa a implementar pastura a la base de grava de $\phi 3/4"$) En consecuencia se prevé que el próximo fin de semana se estará iniciando con el proceso de instalación de la grama artificial.
- ✓ Se continúa con los trabajos de concretado para aceras identificadas en diferentes zonas del proyecto.
- ✓ Se les recuerda al contratista presentar comprobantes a la brevedad sobre los tramites pertinentes relacionadas a la conexión del servicio de agua potable y aguas negras en la institución con ANDA.
- ✓ Con urgencia se advierte agilizar las siguientes actividades:
 - elaboración de pasamanos
 - puentes metálicas
 - concreto estampado
 - techura de fascias/alero
 - techura de basureros entre otras




REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias
Representante Supervisor
No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No. 019

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en col. CREDITA.

Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque

Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador

Nombre del Contratista: UC constructores sa de cv.


Código del Proyecto: 344310 Fecha: 10-03-2020.

DEL SUPERVISOR.

- En relación al porton de Acceso A canchas de Basket Ball. se propone: Desplazar ubicación,

Según planos

SE PROPONE

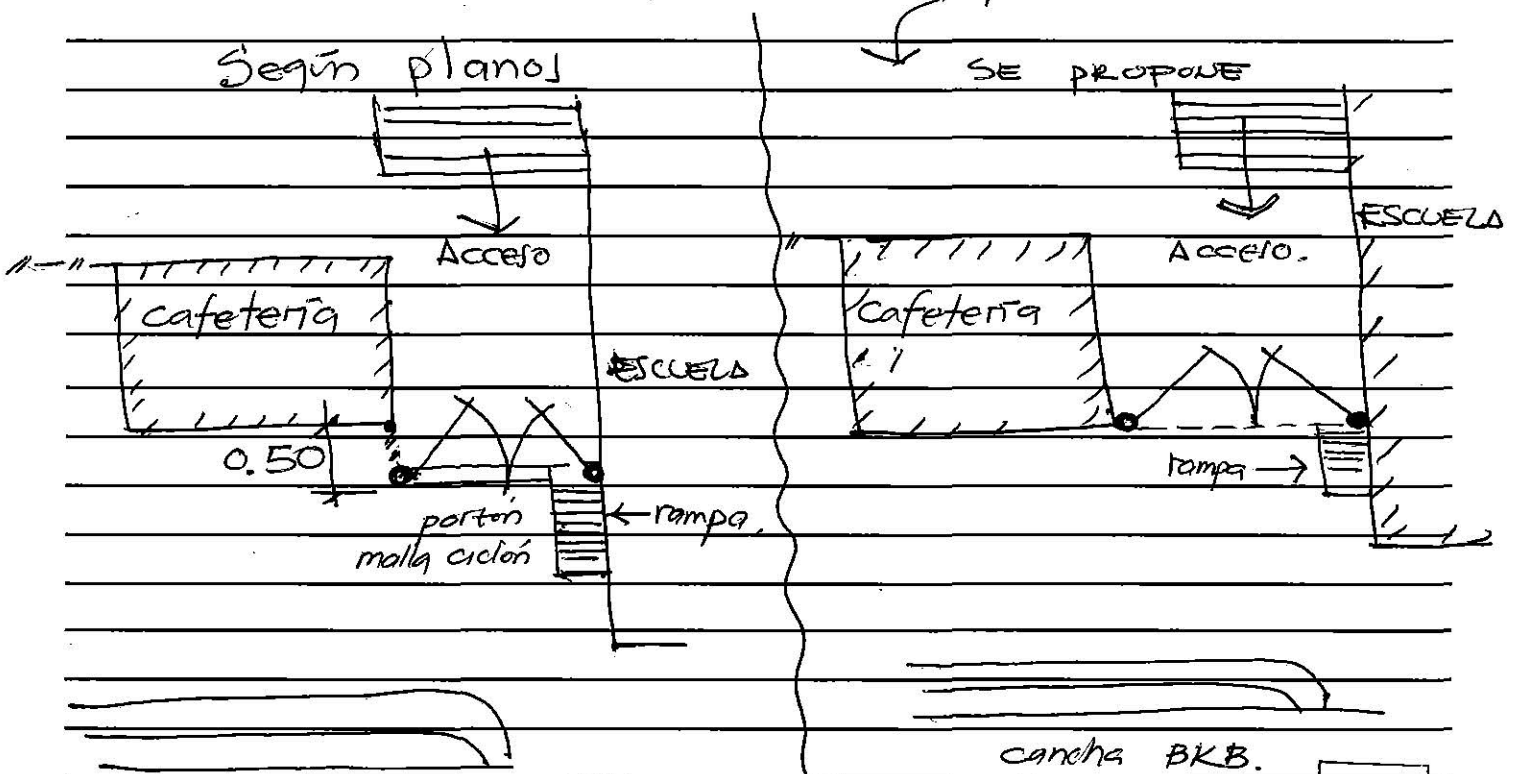

Cancha BKB



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324

Representante Supervisor



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 020

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: MARZO 10/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ ESTE DÍA EVALUAMOS CON EL RESIDENTE DEL PROYECTO SOBRE LA PROPUESTA DE DESPLAZAR EL PORTON DE ACCESO A AREA DE ZONA 2 (BASKET BALL) Y COMO SUPERVISOR AVALO DICHO DESPLAZAMIENTO YA QUE DICHA MEDIDA NO AFECTA EN NADA.
- ✓ SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA NO DESQUIPAR AREAS DE TRABAJO PARA EVITAR ENTRAR A UNA 3A. MULTA, POR OTRO PARTE SE LE PIDE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA TOMAR NUEVAMENTE MEDIDAS DE REACCION EN EL SENTIDO DE EXTENDER LAS JORNADAS DE TRABAJO INCLUYENDO TRABAJAR A TIEMPO COMPLETO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS.
- ✓ SE REQUIERE DE PARTE DEL CONSTRUCTOR NO DESQUIDADR EL SUMINISTRO DE AGUA, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE CURADO DE ACERA QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO.




Representante Supervisor


REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)




HOJA No. 021

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 12-03-2020

DEL CONSTRUCTOR:

✓ Se solicita aprobación para la instalación de colector A-LL y Cajas de captación con parrilla en zona separación entre canchas de Basketball. Según se detalla:

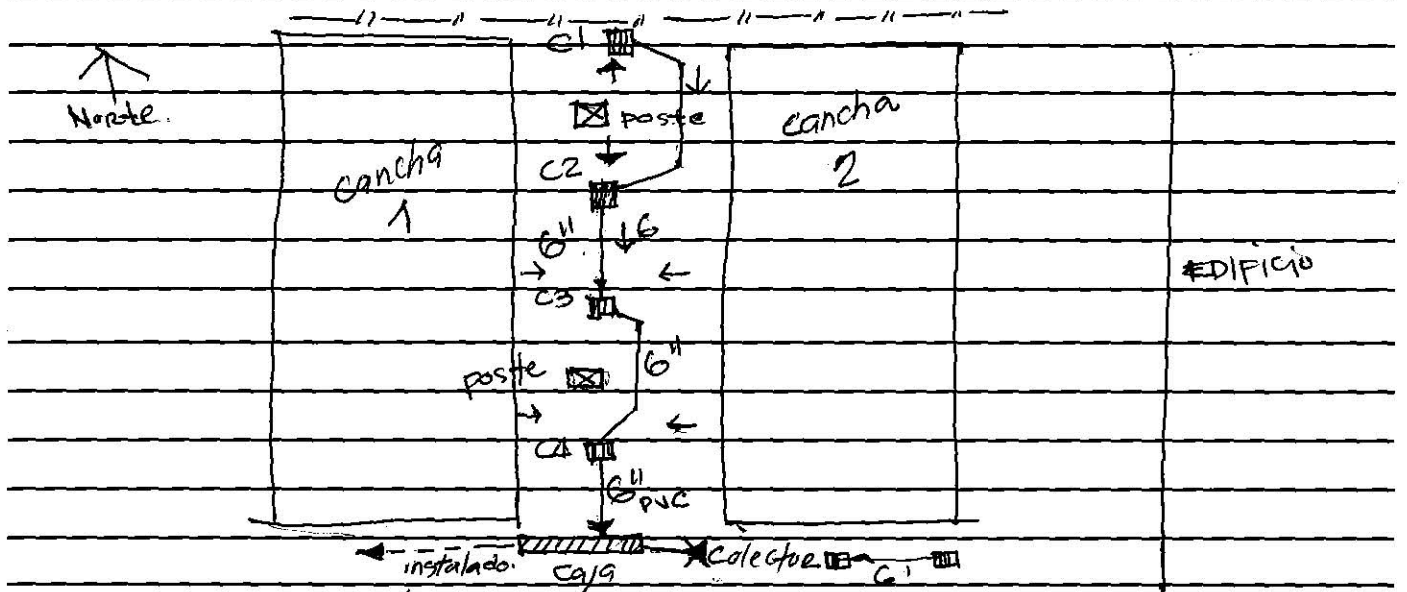

✓ Las cajas al centro. exist.
 ✓ El colector desplazado para evitar los postes de energía eléctrica existentes.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor

No A-1371



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 022

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL CRE-DISA.
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyupango Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC Constructivos SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 12.3.2020

DEL SUPERVISOR.

- Después de analizar en conjunto la propuesta de drenajes de aguas lluvias, con el Residente, se der por aprobada la alternativa presentada en hoja 21 de esta bitácora.
- ✓ Ese día se continúa avanzando en la aplicación de acabado de pintura en área de edificación CICC.
- ✓ También se avanza el trazo de la tubería y pomp de aguas negras sobre el centro de la ~~carretera~~ Avenida Coatepeque
- ✓ Se requiere agilizar los trabajos relacionados a obras ~~de~~ metálicas tales como:
 - hechora de puentes metálica
 - Portones
 - Basureros
 - Pasamanos



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor

No A-1331



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 023

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. CESTOPEQUE.
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: M.C. CONSTRUCTORA
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: MARZO 13/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ Este día me sentí mal de salud ~~así~~ por lo que en el transcurso de la mañana me vi en la necesidad de ausentarme.
- ✓ En cuanto a los procesos constructivos que se están llevando a cabo se han verificado los siguientes:
 - Chequeo constante de niveles y compactación en trabajos de la cancha de football.
 - Niveles finales en área donde irá el concreto estampado.
 - Seguimiento de trabajos de colado de concreto en aceras viales.
- ✓ Se requiere que se vaya haciendo limpieza ~~para~~ e ir preparando aquellas áreas en donde se sembrará la grama, con ajuste de tal forma de que cuando sea el periodo de recepción esta ya se encuentre estabilizada.
- ✓ Asimismo se requiere que se agilicen los trabajos relacionados a la colocación de bancos (barridos, paramanos, puentes, portones entre otros).




REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Lisneros Jrias

Representante Supervisor

No A-1371



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA

Nº 024

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: MARZO 16/2020

DEL SUPERVISOR:

SE LE SOLICITA AL CONSTRUCTOR ATENDER LAS SIGUIENTES INDICACIONES.

- INICIAR LA BÚSQUEDA DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS DESCRITOS EN CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE ORNAMENTACIÓN (PLANO AMBIENTAL AMB 1/1).
- INICIAR PROCESO DE LIMPIEZA EN ÁREA DE BASKETBALL PARA CONSIDERAR LA PINTURA DE DEMARCAÇÃO EN LA MISMA
- INICIAR PROCESO DE LIMPIEZA EN ÁREAS DONDE ESTÁ PROYECTADO ZONA DE JARDINES
- HACER BASE DE CONCRETO DONDE ESTÁ PROYECTADO EL JUEGO DE CASTIJO, DE TAL FORMA QUE CUANDO DICHS JUEGOS ESTEN EN EL PROYECTO LA BASE HAYA FRAGUADO CORRECTAMENTE.
- INICIAR PROCESO DE LIMPIEZA EN GENERAL, INCLUYENDO CAJAS DE AGUAS LUVIAS.




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL


Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 025

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Crodisa
 Ubicación del Proyecto: Dos Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructoras SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 17.03.20

Asesor Fiesdl

- Con anterioridad a la propuesta de Cajas y tuberías de A.C.C. planteada y realizada y aprobada por supervisor en hoja de bitácora # 022, la obra a realizarse deberá estar conformada dentro de las cantidades incluidas en el plan oferta, no se pagará por éstas cantidades como obra adicional.
- Se solicita al personal del realizador y supervisor garantizar una adecuada compactación de las capas (2) de grave de 3/4" y 3/8" en cancha de fútbol, respetando las exposiciones de la misma y los niveles establecidos en el replanteo.
- Se requiere que el subcontratista, responsable de la instalación de la grama artificial, brinde su conformidad a la base de grave compactada, previo a su instalación.
- Se solicitó al G.C.C. Soncar y/o retirar materiales de desperdicio en todo el perímetro de la cancha fútbol (madera, cascajo, tuberías, Ho, etc) y mantener limpia esa zona para evitar contaminación de la grama.
- Se recuerda al Contratista el cumplimiento de las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno Central, relacionadas a la pandemia del Covid-19, cuando en cuenta también las sanciones que puede aplicar el ministerio de trabajo



Representante Supervisor



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Lisneros Jrias

No A-1271



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA




Nº 026

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyopango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 17.03.20

En cuanto al personal en el proyecto, esto es limitado, y en vista de que el realizador se encuentra en periodo de multa, es necesario un incremento significativamente el # de albaniles y auxiliares, e intervenir las estructuras de obra de banco (balcones, puertas, portones de malla ciclista, parrillas, etc.).

Se realizó recorrido junto con Residente, GCC, Supervisor, en el cual se señalaron diversos detalles constructivos que requirieron ser consensados por el Contratista, previo a la recepción provisional.

- Se solicita a Supervisor, presentar al Administrador de Contrato, el detalle de obra pendiente de ejecutar al corte de inicio del 2º periodo de 30 días en multa.
- Se recuerda al Supervisor la entrega del informe mensual del periodo anterior finalizado. La entrega tardía o fuera del plazo establecido es penalizado según lo da. Contratos.
- Se recuerda al Contratista presentar en la ACI, la ampliación de la póliza de todo riesgo p/ Construcción en Progreso. Supervisor debe dar seguimiento a este requerimiento.


 REPRESENTANTE SUPERVISOR
Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-1324
 REPRESENTANTE CONTRATISTA

 REPRESENTANTE FISDL

 REPRESENTANTE COMUNIDAD/ OTROS (SI APLICA)



HOJA Nº 027

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COSTEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 18 MARZO 2020

DEL SUPERVISOR

- Este día por parte del contratista se suministró 30 m³ de grava #3/8" (capa final) para ser colocada en superficie de cancha de football, se le han dado indicaciones de colocar dicha grava con una adecuada compactación de tal forma que cuando se instale la grama, esta no presente deformaciones en su superficie
- Se insiste en retirar todas aquellos materiales, troncos, escombros que estorban en áreas de trabajo y que sean de cualquier parte del proyecto, asimismo limpiar área donde el contratista ha tirado escombros sin ninguna autorización de esta supervisión, tal es el caso del terreno adyacente en parte sur de edificación CICE.
- Se comienzan haciendo colados de acera tanto en áreas aledañas a cancha de football y basket ball.




REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor

No A-1774



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 028

Nombre del Proyecto: OBRAS NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COSTEPEQUE
Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: MARZO 19/2020

Del Supervisor

- ESTE DIA SE CONTINUA CON TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICACION CICC, CAFETERIA, CASITAS ENTRE OTROS
TAMBIEN ESTE DIA INGRESO AL PROYECTO OTROS BOMBOS DE GRANO #3/8", PARA COLOCAR EN LA CANCHA DE FOOTBALL.
SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EXPRESADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CADENA NACIONAL EL DIA DE AYER, SE DEBE DE RETIENE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE TRABAJANDO, PARA EL CASO EL PROYECTO Y CUYAS CONDICIONES SEAN QUE
- SON PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS
- PRESENTEN O PODEZCAN ENFERMEDADES CRONICAS COMO POR EJEMPLO: - DIABETES
- HIPERTENSION
- INSUFICIENCIA RENAL.
ASIMISMO SE LE RECUERDA QUE TODO EL PERSONAL DEBE USAR MASCARAS, JUNTO A OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA, DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.

Representante Supervisor
Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-13

Representante Contratista
Representante FISDL
Circular stamp of the National Register of Architects and Engineers

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)

HOJA No. 029

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREPISA
Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COATEPEQUE
Municipio: SOYA PANGO Departamento: S.S.
Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: JUNIO 13 de JUNIO 2020

DEL SUPERVISOR:

- ESTE DIA DESPUES DE HABER PASADO VARIAS ETAPAS DE CUARENTENAS DECRETADAS POR EL ORGANO EJECUTIVO, A LA IZ DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, LAS CUALES INICIARON DESDE EL 21 de MARZO de 2020, se reinician las actividades CONSTRUCTIVAS, responsabilizandose de transportar al personal que laborará en esta obra, si asi se requiere.

Cabe mencionar que durante el periodo de la cuarentena desde el 21 de marzo a la fecha, se presentaron eventos de tormentas denominados "AMANDA/Cristobal" suscitadas en fechas 31 de mayo y 6 de junio respectivamente, dichas tormentas afectaron áreas de trabajo en el proyecto tales como:

- Conformación de terraplenes que ya estaban establecidos
- Conformación de talud en zona frontera de cancha de basket ball
- Rebalses en cajas retenedoras de aguas lluvias, identificadas como 1 y 2
- Daños en Sector perimetra Sur y oriente de cancha de football.
- Parte lateral puente de gradas existentes colindantes con Centro Escolar CREPISA.

En ese sentido la empresa constructora y supervisor coordinaron una visita de campo el día 7 de junio para evaluar los daños



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-1324



Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)

HOJA

Nº 030

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FISDL AV. COSTEPEQUE
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: M.C. CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 13 JULIO 2020

.... Continuación

.... Ocasionalmente por las tormentas antes mencionadas, a partir de la visita y presentación de un informe de dichos daños, se establecieron medidas de mitigación a implementar, de tal forma de proteger las obras ya construidas.

- ES preciso mencionar que a partir de esta reapertura, el contratista ha identificado que reiniciará esta semana con las siguientes actividades:

- Extensión y colocación de la grama artificial, con su respectiva instalación de costanera curada
- Continuación de instalación de piso de cerámica en áreas de cafetería, sanitarios para personas con discapacidad, y baños de H y M, entre otras áreas
- Enchapes en Sanitarios Sanitarios.
- Instalación de portales de cancha de football
- Instalación de puertas metálicas
- Reparación de estructuras de Marcos de cancha de football
- Hechura de lavabos
- Limpieza entre otras



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS


Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COATEPEQUE
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC. CONSTRUCTORA S.A. DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Julio 13/2020.

.... Continúa.

... Asimismo es importante destacar que para este reinicio se le exige al contratista tomar todas las medidas preventivas de BIENSEGURIDAD, entre las que se mencionan las siguientes entre otras:


- La exigencia del USO de MASCARILLA
- La toma de temperatura al trabajador, antes de iniciar su jornada laboral
- La sanitización de herramientas e implementos de trabajo
- Exigencia de lavado de MANOS para los trabajadores
- La implementación del USO de Alcohol - Gel.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL


Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA Nº 032

Nombre del Proyecto: Obra nueva y Remodelación en col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Avenida Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructora SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 15-07-2020

Del Constructor:

- ✓ Actividades en Desarrollo
- ✓ Construcción de Bordillos area de juegos.
- ✓ Inst. Grama sintética
- ✓ EXCAN. para colector Descarga de caja retención a pozo.
- ✓ Limpieza general canchales de BKB.
- ✓ Enchape de paredes y piso S.Sanitarios
- ✓ Muro Guardanivel pie talud oriente: necesario para sostener y conformar talud; A fin de evitar daños en viviendas colindantes, así como la conformación del talud.

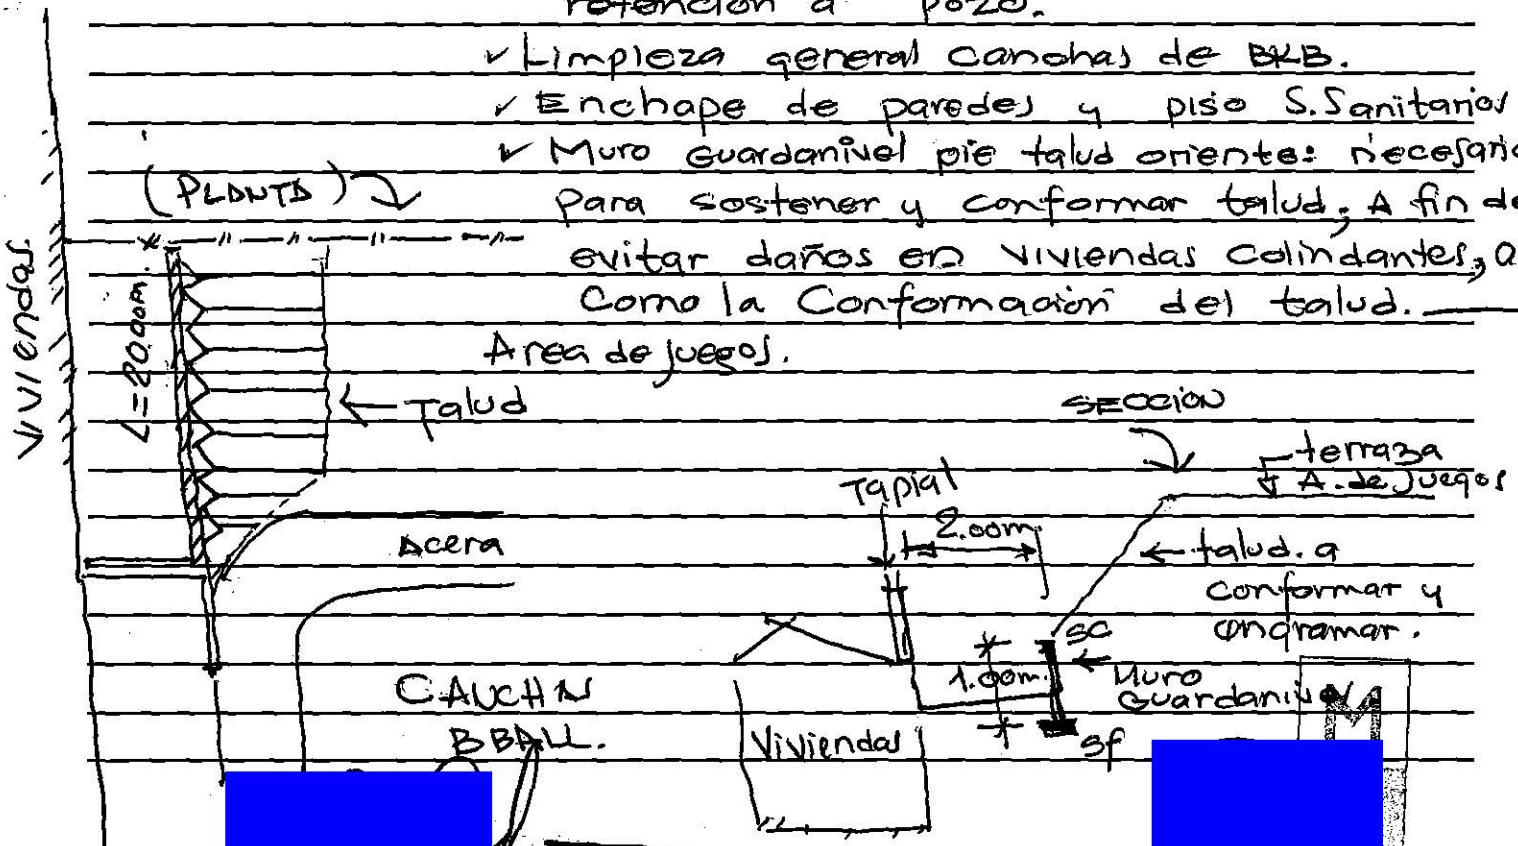

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Representante Supervisor Walter Herbert Lisneros Jrias
 No A-1324



Representante Contratista
 Representante FISDL

Representante Comunidad/
 Otros (Si Aplica)

HOJA No. 033

Nombre del Proyecto: OBRAS NUEVAS Y REMODELACION EN CAL. CREDISA.
Ubicación del Proyecto: Final Av. Cortapeque
Municipio: Sapopango Departamento: S.S.
Nombre del Contratista: M.C. CONSTRUCTORES S.A. de C.V.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: Miércoles 15.7.2020.

Del SUPERVISOR:

Dentro de las actividades que se están llevando a cabo este día se mencionan las siguientes:

- INSTALACION DE PORTUCCAS EN CANCHA DE FOOTBALL, se verificó que cumplieran con las medidas establecidas en los planos constructivos.
- Continuación en instalación de piso de cerámica, enchapados y hechura de lavabrazos.
- Extensión y colocación de grama artificial.

También he verificado que se están tomando todas las medidas de seguridad, así como el uso de los medios de seguridad e higiene ocupacional, entre lo que se menciona el uso de casco y mascarillas entre otros.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)



Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación col. credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: SS.
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sade SA.
 Código del Proyecto: 344310. Fecha: 16-07-2020

DEL CONSTRUCTOR:

Actividades en proceso.

- ✓ Instalación de Grama Sintética Cancha
- ✓ Reparación marcos de tableros cancha de BKB.
- ✓ Conformación de taludes
- ✓ Excavación y Compactación zanjo colector de descarga A.LL.
- ✓ hechura de pretilos zona de juegos.

En cuanto a medidas de prevención COVID 19.

- Limpieza de herramientas entrada y salida
- toma de temperatura
- Lavado de manos
- ✓ Aplicación de Alcohol Gel.
- Uso de mascarillas
- mantener distancia entre personas.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No. 035

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA y REMODELACION en COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COSTAQUEQUE
 Municipio: Sapopango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: M.C. Constructores S.A. de C.V.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Julio 17/2020

DEL SUPERVISOR:

Este día se hizo presente al proyecto el Ing. Jua Rosales, (Administrador del Proyecto) con quien hicimos un recorrido de verificación de las obras y las condiciones actuales, se me instruyó sobre el seguimiento de las medidas de bioseguridad, de tal forma de garantizar en la medida de lo posible el no contagio del COVID-19, dentro de las actividades que se estaban llevando a cabo este día se pueden mencionar:

- La continuación de la extensión de la grama artificial
- Instalación y pechón de puentes metálicos
- Restauración de estructura metálica de ~~varios~~ mardos de cancha de basket ball.
- Trabajos iniciales de limpieza en general.
- Colocación de cascós.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Urias No A-1371



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)

HOJA Nº 036

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de cv.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 20-07-2020

del Constructor:

- Se continúa con la instalación de grama sintética
- Se trabajo en la Compactación de zanjo de Agua lluvias -
- Conformación de taludes
- Limpieza general
- Enchape de paredes en. S.S.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Lisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)




HOJA No 037

Nombre del Proyecto: Obras Nueva y Remodelación en COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: Finca Av. Cortapeque
 Municipio: Sopran Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: ML Constructores
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Martes 21/7/2020

Del SUPERVISOR

En esta visita se le indica al constructor planificar inicio de inmediato los trabajos siguientes

- Concreto Estampado
- Hechura de fajas
- Trabajos de Jardines y ornamentación
- Instalación de divisiones entre salidas sanitarias.
- Hechura de pozo de Aguas lluvias.
- Suministro y equipo de bombeo en cisterna
- Colocación de tablero de cancha de basket ball.
- Instalación de Cocina leída en cafetería
- Construcción de caminos de pavadere
- Construcción de BARRERAS DE DEFLECTOS SOLARES.
- Demarcación de cancha de Basket ball
- Pintura final
- Complemento en muros de acera. entre otros




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)


HOJA No. 038

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final N. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores S.A. de C.V.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 21-07-2020.

DEL CONSTRUCTOR:

Con el fin de mejorar la circulación perimetral y a la vez proteger la parte sur de las Canchas de BKB se propone en espera de revisión y/o Aceptación, lo siguiente:

Construir Acera en esa zona, para proteger ambas canchas. según propuesta:

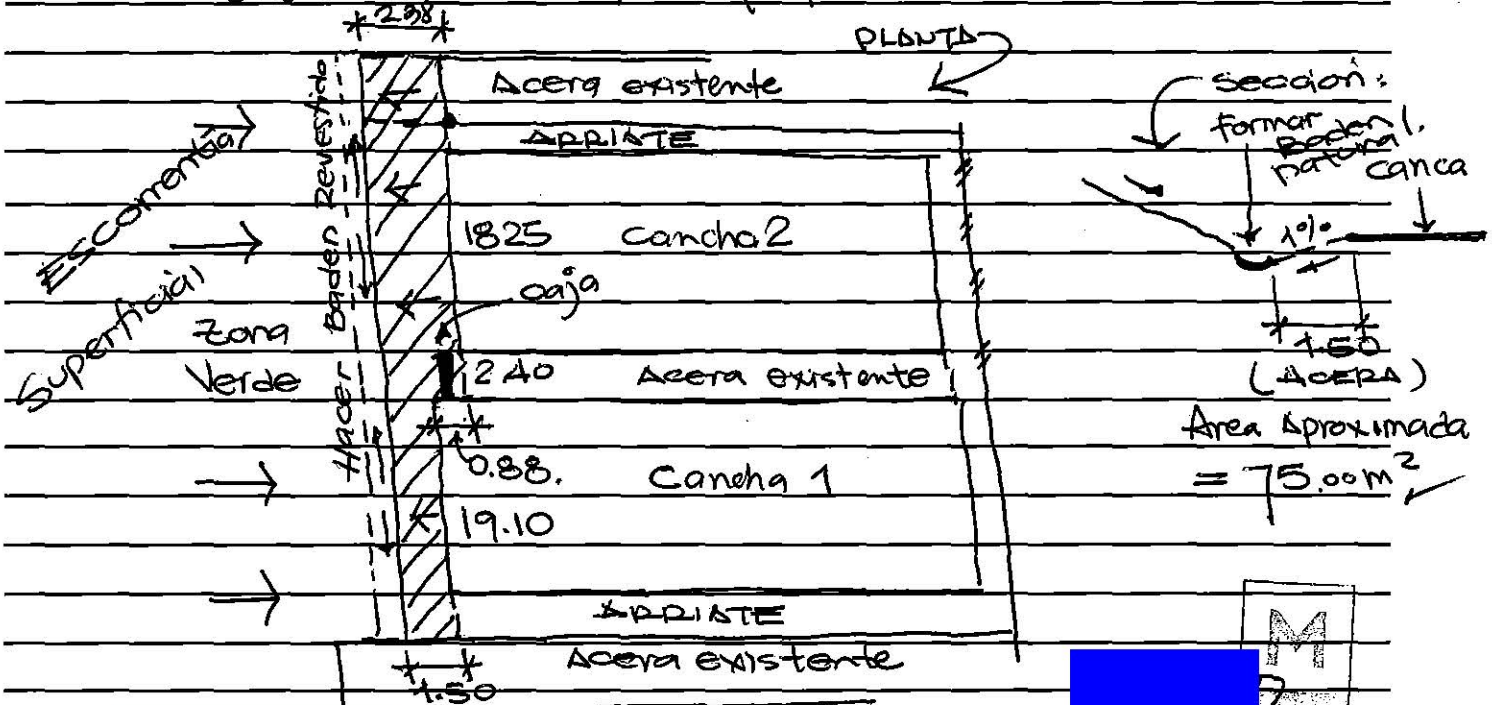

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No. A-1374



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No. 039

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación en col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: SS
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 23-07-2020

DEL CONSTRUCTORA:

Actividades en proceso

- ✓ Conformación de taludes
- ✓ Limpieza general zona juegos
- ✓ Compactación en zanjo A.LL.
- ✓ hechura de pretiles.
- ✓ desalajo interno de tierra.
- ✓ hechura Jardinera frente a Servicio Sanitario.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Lisneros Jrias

Representante Supervisor No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL



Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)


HOJA No. 040

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación col. credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructoras SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 24-Julio-2020.

Del Constructor.

1/2

* Con el fin de evitar erosión y daños en viviendas adyacentes en el sector poniente de las canchas de Basketball, se propone la construcción de caja colectora y Colector de descarga hacia la Calle. Este colector evacuará las aguas procedentes del talud y zona aledaña a viviendas e iniciará en el límite del proyecto donde está el cerco de malla ciclón, haciendo un recorrido de 20 mts aproximadamente, según se detalla:

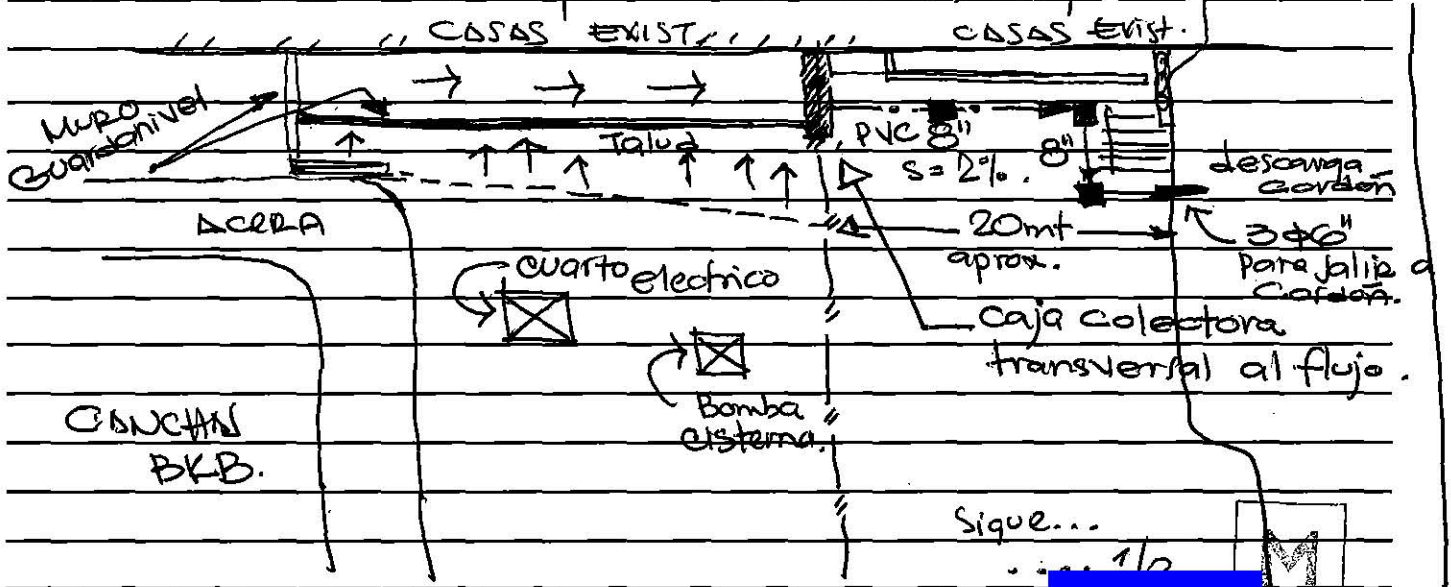

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Representante Superior: **Walter Herbert Cisneros Jrias**
No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 041

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación en Col. Crediso

Ubicación del Proyecto: Final N. Coatepeque

Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador



Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV. 2/2

Código del Proyecto: 344310 Fecha: 24-Julio-2020.

2/2 ... Viene de 1/2

... Continúa

✓ toda la escorrentía de la zona aledaña a las viviendas así como la del talud y la que no logre ser captada por el sistema de cajas en la parte superior será recibida por dicha caja colectoras:

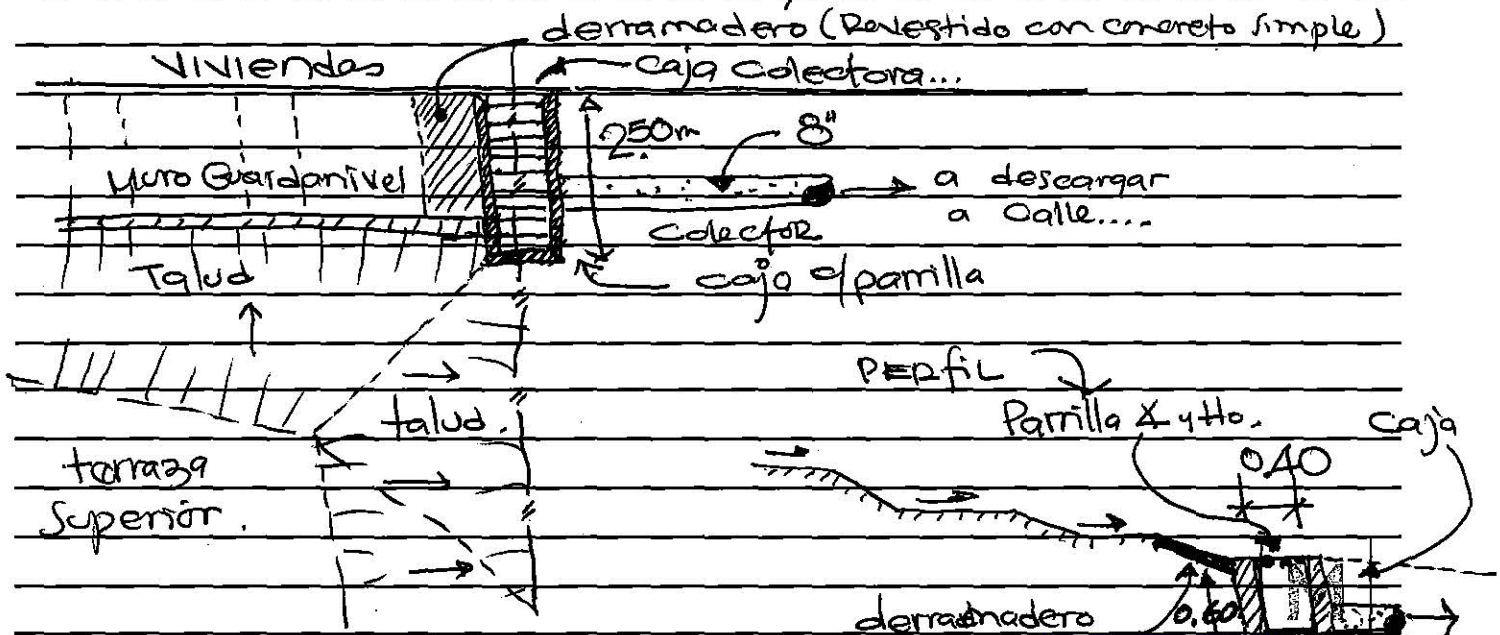

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA

Nº 042

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación en col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de C.V.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: JULIO 24/2020

DEL SUPERVISOR

Me refiero en esta ocasión a responder la hoja #38 de fecha 21 JUNIO 2020, en la que el constructor propone hacer una acera longitudinal al costado sur de las canchas de basketball, en ese sentido requiero que se considere en lugar de acera la colocación de cascay, esto minimiza la disponibilidad de fondos que existen para el proyecto.
 Se continúa con trabajos de compactación en zona donde se construya el poyo ubicado al centro de la Av. Coatepeque, el poyo al que me refiero es de aguas lluvias




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

No A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 043

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Urb. Ciudad Credisa
 Municipio: Soyapango Departamento: SS
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 24.07.20

FISDL

En cuanto a las propuestas planteadas por el realizador en hojas de bitácoras # 38, 40 y 41, estas deberán ser analizadas técnicamente por la supervisión para emitir su dictamen, y bajo ninguna circunstancia deberán significar un incremento en el monto del proyecto.

Las actividades se realizan con normalidad, aunque el # de personal es limitado. Se implementan medidas sanitarias para evitar contagio de COVID-19 entre el personal.


Actividades en proceso:

- Excavación/carpintería para colocar A.U. en área Coatepeque.
- Instalación de grama sintética en cancha fútbol
- Construcción de perfiles en áreas Juegos Infantiles y Cafetería
- Trazo de obra en entrase Pool, frente a vigilancia.
- Hecura de Pretil para jardinería frente a S.S.
- Conformación de baldos, sector pte. cancha B.K.P.
- Limpieza general.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Jrias
 No A-1374

Representante Supervisor



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



HOJA

Nº 044

Nombre del Proyecto: OBRES NUEVAS Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUEL.
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Martes 28 Julio 2020

Del SUPERVISOR:

He leído la propuesta técnica planteada por el constructor relacionada a la evacuación de las aguas lluvias que se dan en el sector próximo de los cancha de basket ball y me parece que es aceptable la propuesta descrita en hojas 40 y 41 de esta bitácora. Asimismo se describen algunas actividades a considerarse y a continuar para esta semana:

- Completar taludes en estado próximo de cancha de BKB
- Petiles en zona de sendero sanitario y juegos infantiles
- Petiles en zona de concreto estampado.
- Retiro de malezas zona acento de los edificios CICC.
- Compactación en área de vigilancia
- Remoción de pavimento asfáltico.
- Construcción de prop de agua lluvias.
- Unplayo en zona verdes donde se entrará.
- Desarrollo exterior de acopio de basura y Nps.
- Construcción de acera en área alrededor de cancha



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Jrias
 No A-1324

Representante Supervisor



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 045

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: M2 CONSTRUCTORES SA. de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Julio 30/2020

Del SUPERVISOR:

- Este día se revisaron las actividades de estado de obra con los datos a mano de capetia, así mismo trabajos de confirmación de terreno en área donde se colocará empuje estampado, (estado puente de edificio C.I.CC).
- Se empujan con trabajos de excavación y compactación de prep de aguas lluvias en final Av. Coatepeque).
- Se le han indicado de carácter urgente al contratista en realizar trabajos de desalojo de escombros y Npio, producto de obras de construcción.
- Se requiere iniciar a la brevedad las siguientes actividades:
 - Instalación de grama natural.
 - Instalación de fascia
 - Colocación de Tableros en cancha de basket ball
 - Cámaras de jugadores en cancha de fútbol
 - Marcación de cancha de Basket ball
 - Instalación de equipo de kumbeo de estera entre otros.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Jrias
 No A-1374



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA N° 046

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Urb. ~~Santa~~ Ciudad Credisa
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: NC Constructores, S.A de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 29.07.20

- FISDL
- Se solicita al Contratista retirar urgentemente todo el material de desalojo depositado sobre avío colopaque, para evitar inconvenientes con la Comunidad.
 - Se recomienda efectuar una limpieza general de las instalaciones.
 - Se solicita coordinar con la municipalidad, la entrega y retiro de materiales de desmontaje que aún se encuentran en el proyecto.
 - Se solicita al Contratista informar sobre el avance en la sección del suministro de los juegos infantiles y de los tramites de instalación de conexiones domiciliarias de A.P. y B.O. para el proyecto.
- Se recomienda agilizar los trabajos que se ejecutaran y subcontrato, por ejemplo: instalación de fascia-cornisa; instalación de concreto estampado; colocación grama en áreas filu; instalación de banquetas de jugadores, etc.

[Redacted] **REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS**
Walter Herbert Cisneros Jrias
 Representante Supervisor **No A-1324**

[Redacted] **M**
 Representante Contratista
 [Redacted]




Representante Comunidad/
 Otros
 (Si Aplica)

Nombre del Proyecto: Obra nueva y Remodelación Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 31-07-2020.

Actividades en proceso...

- ✓ hechura de Aceras Area de acceso sector SUR.
- ✓ Fundación pozo Aguas lluvias (
- ✓ Preparación area concreto estampado. (Moldeado).
- ✓ pretiler zona S. Sanitarias.
- ✓ Terracería para Aceras Acceso sector SUR.
- ✓ Limpieza y poda sector poniente Cancha BBIB.
- ✓ Limpieza sector cancha foot ball.

Detalle pozo A.L.L. A construir

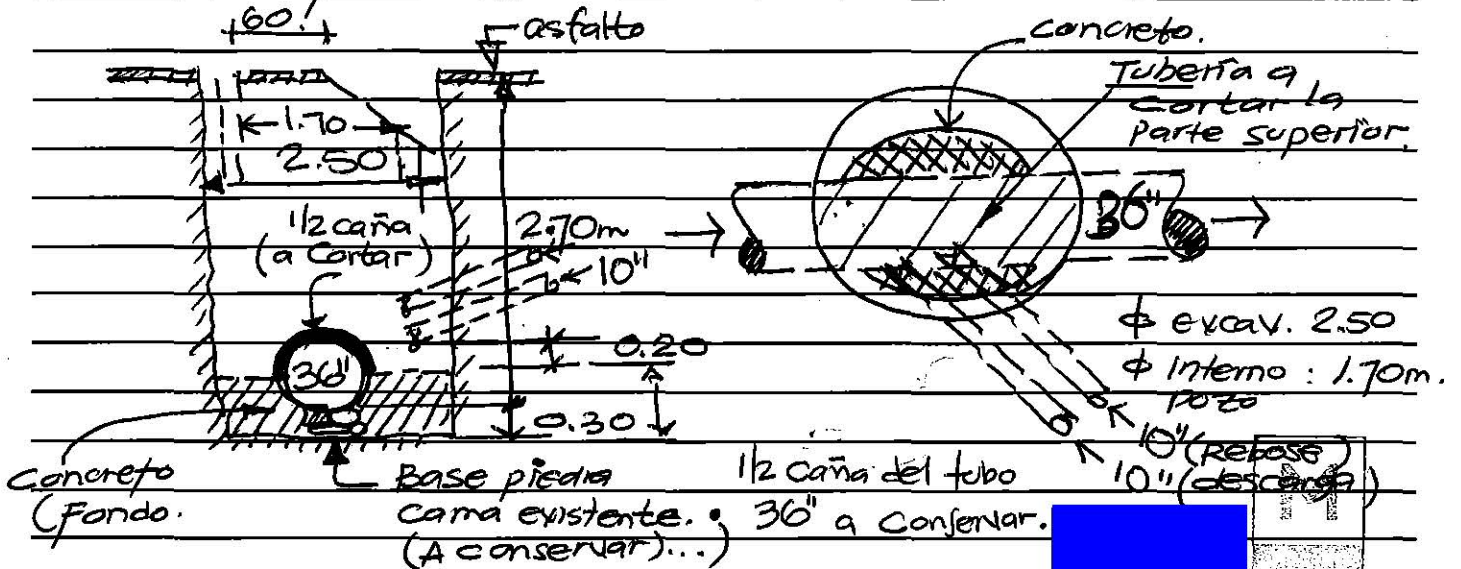

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Representante Superior Walter Herbert Cisneros Jrias
No A-1324



Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Representante FISDL

HOJA

Nº 048

Nombre del Proyecto: 0 BDA NUEVA Y REMODELACION CON CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINCA SV. COSTEPEQUE
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Contratista
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 3/2020

DEL SUPERVISOR


- Este día se ha verificado los trabajos que se están haciendo en cuanto a la conformación de torva donde se colocara el concreto estampado
- Se requiere que se vaya tomando en cuenta los divisores de milimetro de Inicos Savitais, ~~para verificar la calidad de los trabajos~~
- Tambien realizar a la brevedad la poda de las areas donde se hayan los arboles respectivamente
- Asi como proveer de los arboles que se necesitan sembrar ya que estos deberan estar marchitos al momento de recibir la obra.
- Se necesita de caracer urgente iniciar con los trabajos de instalación de FASOA, en la edificación CICC



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Jrias

Representante Supervisor No A-1321



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)

HOJA N° 049

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación cal. Credisa
Ubicación del Proyecto: Final AV. Coatepeque
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: 04-08-2020

Del Constructor:

Obras EN proceso:


- Pozo Aguas Pluvia
- Conformación de taludes zona Sur y pte. Sector 2
- Aceras Acceso principal
- Portón Acceso principal.
- Limpieza general.
- Acabado en cajas Bajadas de A.U.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS

Walter Herbert Lisneros Urias

Representante Supervisor No A-1374



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa

Ubicación del Proyecto: Due

Municipio: Soyapango Departamento: S.S.

Nombre del Contratista: MC Constructores SA docv

Código del Proyecto: 344310 Fecha: 07.08.20

Asesor FISDL

* Se llevó a cabo reunión de seguimiento junto con personal del Contratista, supervisión y Administrador de Contrato. Se solicita a Supervisor levantar acta.

* Se recordó al Contratista agilizar las gestiones para la instalación de acometidas domiciliarias de Agua potable y Aguas Negras, requeridas por el proyecto.

* También se recomendó el inicio de las actividades que se ejecutarán x subcontrato (Colocación tierra negra y ensermado, Colocación fascia-cornisa, estructuras metálicas, colocación de divisiones interiores, etc).

Es necesario y se solicita que el Contratista incremente el personal en el proyecto. Existen muchas actividades que pueden intervenir y están en abandono por falta de personal.

* El Contratista deberá continuar de forma permanente, la implementación de las medidas sanitarias entre el personal, para evitar contagios de COVID-19, evitar también el ingreso de personal con fiebre. (M)



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Representante Supervisor **Walter Herbert Cisneros Jrias**
No A-1324



Representante Contratista




Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

BITÁCORA

HOJA No. 001

LIBRO 7



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local



Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA y REMODELACION COL. CREDISA.
Ubicación del Proyecto: FINAL AVE COATEPEQUE
Municipio: SOYA PATO Departamento: SAN SALVADOR.
Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 7/2020

ESTE DÍA SE HACE ENTREGA DE LA BITÁCORA DEL PROYECTO, ESTA BITÁCORA ES PROPIEDAD DEL FISDL Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL Y SUPERVISOR EL MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES.

EN LA BITÁCORA SE LLEVARÁ ANOTADO LAS ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL CONTRATO, TEBIENDOC COMO OBJETIVO PRINCIPAL FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS, CONTRATISTA PRINCIPAL, SUPERVISOR Y EL FISDL.

LA BITÁCORA DEBE PERMANECER, BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL Y DEBE SER SIEMPRE ACCESIBLE AL SUPERVISOR Y AL REPRESENTANTE DEL FISDL.


DURANTE LA EJECUCIÓN LA HOJA ORIGINAL PERMANECERÁ EN LA OBRA, LA PRIMERA COPIA SERÁ DEL FISDL, LA SEGUNDA DEL SUPERVISOR Y LA TERCERA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL, LA HOJA ORIGINAL DEBE SER SIEMPRE FIRMADA POR TODAS LAS PARTES.

PODRÁN HACER USO DE LA BITÁCORA: EL CONTRATISTA PRINCIPAL, EL SUPERVISOR O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE AMBAS PARTES Y EL FISDL.

AL FINALIZAR EL CONTRATO TODOS LOS ORIGINALES DE LA BITÁCORA SERÁN ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA PRINCIPAL AL FISDL EN SUS OFICINAS.

EN EL CASO DE NECESITAR MÁS HOJAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL SOLICITARLAS AL FISDL.

[Redacted Signature] Representante Supervisor



[Redacted Signature] Representante Contratista

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)



[Redacted Signature] Representante FISDL

HOJA Nº 002

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Costeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 7/2020


DEL SUPERVISOR

- ✓ Este día se sostuvo reunión con Administrador del contrato FISDL, representación de MC Constructores y de permiso, se trataron puntos tales como la agilización en cuanto a la tramitación que hacer con ANDA, para hacer el entronque de Agua Potable y Aguas Negras
- ✓ También se le solicitó la agilización en cuanto a la instalación de los juegos infantiles.
- ✓ Además se le dieron indicaciones al Contratista de incrementar el número de personal, para diferentes actividades pendientes de ejecutar
- ✓ Asimismo se le recuerda sobre cumplir a la brevedad los trabajos relacionados a la hechura de fascias, así como el concreto estampado.
Entre otros.

[Redacted]
 Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324

[Redacted]
 Representante Contratista



Representante Comunidad/
 Otros (Si Aplica)




[Redacted]
 Representante FISDL

HOJA No. 003

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación Col. Credisa
Ubicación del Proyecto: final Av. Coatepeque
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
Nombre del Contratista: MC Constructores S de CV.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: 10-AGOSTO-2020.

DEL CONSTRUCTOR:

* Propuesta Colector drenaje Zona oriente de Carretera de BKB.

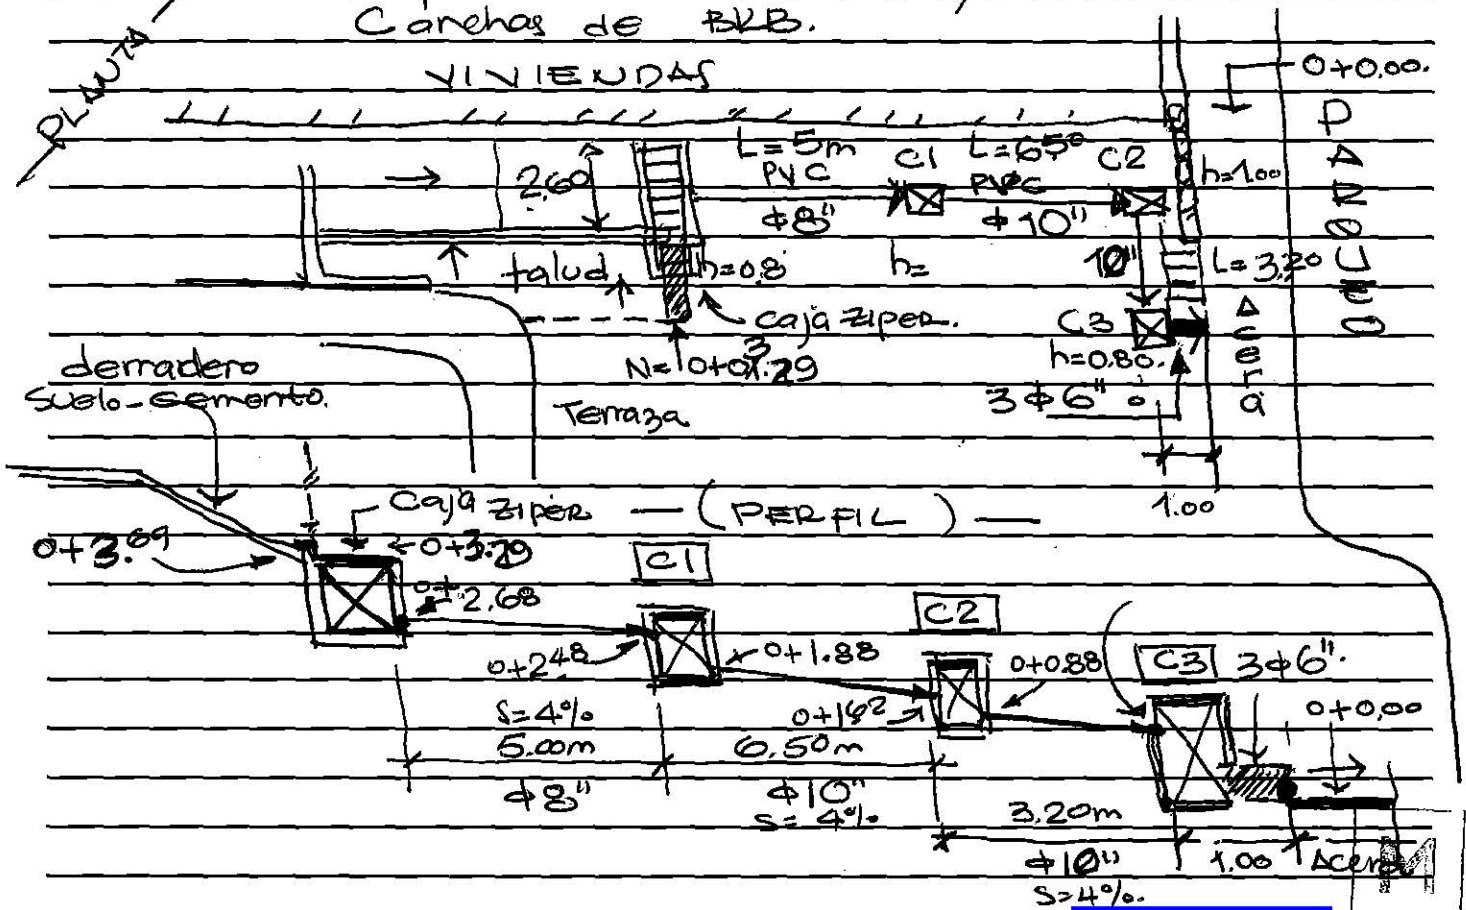

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A- 1324

Representante Contratista

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 004

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION COL. ROSA
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Cortapeque
 Municipio: Soyapango Departamento: Sr. San.
 Nombre del Contratista: MC Constructores
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 11/2020

DEL SUPERVISOR,

- Se le ha aprobado al contratista las obras de drenaje de aguas lluvias en el sector puente - SUR de las canchas de basket ball.
 - Asimismo he verificado los trabajos de concretado de aceras adyacentes al área de cafetería,
 - Se le insiste nuevamente al contratista considerar el incremento del personal ya que existen detalles constructivos que son necesario superar tales como
 - Repare en áreas específicas de cancha de fútbol basket
 - Repare o mejore acabado en pedestales de luminarias/planchas
 - Continuar con proceso de enchape en baños
 - Hechura de repisa de edificio de cafetería.
- Entre otros
- También se continúa con trabajos de pegado alfombra de alfombra de grama sintética.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. 0-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No 005

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION en cd. CREOLSA
 Ubicación del Proyecto: Fraje Av. Cortapeque
 Municipio: Sapanguo Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: M.C. CONSTRUCTORA SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 12/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ Este día ingresaron 200 bolsas de cemento, las cuales se usaron para complementar el área de concreto estampado y otras áreas faltantes entre otras
- ✓ Asimismo se requiere que se vayan suprimiendo las observaciones que se han identificado, de tal forma de corregir algunas deficiencias.
- ✓ Se requiere también que se vaya trayendo al proyecto los diferentes tipos plantas que se mencionan en el plano ambiental, así como los trabajos de siembra de grama Sn. Agustín.
- ✓ En cuanto al suministro de arena, dice que la subcontratista se ha comprometido a traerla a partir del día martes 18. para ser colocada en la grama artificial que ya está instalada.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uribe
 No. A-1924



Representante Contratista



Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 006

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Dos Cantopague
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 13.08.20

Asesor FISCAL

- * En cuanto a la alternativa de A.L.L. del sector pte. de Conchas de BKA de tallado en hoja de bitácora #003 se declara que estas son necesarias como obras de mitigación a los daños ocasionados x tormentas Amanda y Cristobal en talud adyacente existentes, y que no deberán significar un aumento al monto del contrato.
- * Se solicita al contratista poner al día los informes ~~mensuales~~ mensuales de CC, el cuadro de Control de defectos y la matriz de resultados de laboratorio, es decir, toda la documentación relacionada a Control de calidad.
- * Se recomienda al contratista incrementar el personal en la obra, y agilizar las obras que corresponden a sub-contratos.
- * En cuanto al proceso de colocación de grama Sintética, el proceso se encuentra muy avanzado y este se ejerce al diseño aprobado, y al cumplimiento de los especificaciones técnicas respectivos.
- * Nuevamente se solicita a todo el personal en el proyecto el cumplimiento de medidas Sanitarias de prevención para evitar Contagio de Covid-19



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No 007

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA y REMODELACION en COL. CRODISA
 Ubicación del Proyecto: Final Av. COSTA RICA
 Municipio: SOYAPANGO. Departamento: SS.
 Nombre del Contratista: M.L. CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 14/2020


DEL SUPERVISOR

- ✓ Se le recuerda al contratista ir ordenando toda la documentación relacionada con lo de control de calidad, separandola por rubros, ep.
 - controles mensuales
 - Resultados de pruebas de laboratorio
 - Informes de preparativos
 - Libro de defensas etc.
- ✓ Tambien se le recordó el nuevo canalizado de ANDA, en donde se hace la solicitud de conexión de Agua Potable y Aguas Negras.
- ✓ Se le pide al contratista de nos informe cual es la situación actual de la instalación de los juegos infantiles de tal forma de conocer su fecha de instalación en los mismos, en el area proyectada para dichos juegos



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 008

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Oredisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque.
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 14-AG-2020


Del Constructor

ACTIVIDADES

- ✓ hechura de portón Acceso principal.
- ✓ Compactación pozo descarga Aguas lluvias
- ✓ Preparación deera Costado Sur Canchas BKB.
- ✓ Inst. tuberías colector sector poniente Zona Sur.
- ✓ Afinado en Bases postes de luminarias.
- ✓ Limpieza general en ambos sectores.
- ✓ Reparación Superficies agrietadas en Canchas de BKB.
- ✓ Colocación de Cascajo franjas laterales canchas de BKB.

PERSONAL

- ✓ 1 Ing. Residente
- ✓ 1 Aux. de Ingeniero
- ✓ 1 TCO Asistente
- ✓ 1 Bodeguero
- ✓ 1 Maestro de obras
- ✓ 2 mecánicos
- ✓ 6 auxiliares
- ✓ 5 albañiles.
- ✓ 2 Grana sintéticas



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urdinola
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



HOJA No. 009

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: Finca AV. COATEPEQUE
 Municipio: Soyapango. Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA SA. de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 17/2020

DEL SUPERVISOR:

- \ Este inicio de semana no ha habido incremento de personal se mantienen los descuentos por el Ingeniero Residente en hoja #008 de esta bitácora, a pesar que se le ha seguido un incremento de personal para agilizar la finalización de la obra en desarrollo.
- \ Aun no se han presentado a trabajar los subcontratistas que harán los trabajos de:
 - Hechura e instalación de FASCIA
 - Hechura y colocación de concreto estampado
 - Instalación de divisones de Melamina en Salidas Exteriores
 - Hechura de banquetas de jugadas
 - Instalación de cubierta de Área de banqueta de jugadas
 - Siembra de Tierra Negra, entre otros



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Méndez
 No. 201200



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA Nº 010

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Dño Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 19.08.20

Asesor FISDL

- * Durante visita efectuada este día al proyecto se encuentran las actividades suspendidas, tanto en cancha de fútbol como en el sector del cicc.
- Se solicita al Contratista superar todos los inconvenientes que han generado la suspensión de los trabajos en el proyecto e informar a supervisor y administrador/contrato las causas de dicha suspensión.
- Se solicita a supervisión presentar los informes pendientes (reporte de multa de 30-60 días, informe mensual de supervisión, informe semanal de supow, con fecha 16-Ago-20).
- Se solicita al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas para el proceso constructivo, supervisión deberá valorar el cumplimiento de esta indicación.
- Se recuerda que el proyecto se encuentra en etapa de multa, y estas suspensiones de labores empeoran la situación y extienden aún + una fecha probable (probable de finalización).



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uruza
 19/08/2020



Representante Contratista

Representante Comunidad/
 Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 011

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Finca N. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de cv.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 20-08-20.

Del Constructor:

✓ ACTIVIDADES

- ✓ Golado Acera, Sector Sur cancha.
- ✓ Hechura cajas colector Sector Poniente Canchas BKB.
- ✓ Señalización franja Blanca cancha grama sintética
- ✓ Limpieza General.



Representante Supervisor



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL



HOJA Nº 012

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL. AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA SA DE CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 20/20

DEL SUPERVISOR

- SE DEJA REGISTRADO EN ESTA VISITA, QUE AUN FALTA ~~VA~~ EL SUMINISTRO DE UN FARDO DE GRAMA, SIN EMBARGO AVANZAN CON LA DEMARCACIÓN DE LA CANCHA (CON LINEAS COLOR BLANCO)
- SE HAN TRAÍDO AL PROYECTO ESTEDIA 14 PIEZAS DE ELECTROMANUA PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE CONJUNTO DE ACERDA, EN COSTADO SUR DE LAS CANCHAS DE BASKET BAL
- SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL PROXIMO DIA 24 DE AGOSTO VENCE EL TERCER PERIODO DE MULTA Y EL AVANCE DURANTE ESTE PERIODO NO HA SIDO SIGNIFICATIVO, POR LO QUE SE LE EXHORTA A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA NO AUREAR MAS EL PERIODO DE MULTA, EL CUAL A PARTIR DEL PROXIMO 25 DE AGOSTO INICIA EL 4º PERIODO DE MULTA,



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Urias

No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 013

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
Nombre del Contratista: MC CONSTRUCCIONES SA DE CV.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: AGOSTO 21/2020.

DEL SUPERVISOR:

ESTE DIA SE HA VERIFICADO Y CONSTATADO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE CORDON DE ACERA COSTADO SUR DE CANCHAS DE BASKET BALL.

SE LE REQUEREA AL CONTRATISTA DARLE SEGUIMIENTO A ALGUNAS ACTIVIDADES QUE AUN NO HAN SIDO FINALIZADO EJEMPLO DE ESO:

- > CIELO FALSO
-> INSTALACION DE PISO DE CERAMICO
-> COLOCACION DE ENCHAPE DE PAREDES
-> COLOCACION DE ZOCALO
-> TERMINACION DE LAVABRITOS, entre otros.

ADEMAS DE INICIAR A LA BREVEDAD LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA FASIA, CONCRETO ESTAMPADO, DIVISIONES EN BAÑOS, INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, ENTRE OTROS.

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Uribe
No. A-1398

Representante Contratista

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 014

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 24-06-2020.

DEL CONSTRUCTOR:

- ✓ Se trabaja en la hechura de Acera costado sur cancha. BKB
- ✓ Se continúa con la hechura de cajas en colector poniente.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ Resanes en general.
- ✓ Colocación de Cascajo en Areas de Canchas BKB

PERSONAL:

- 5 Auxiliares
- 2 Mecánicos
- 5 albañiles
- 1 Maestro de obra
- 1 Técnico Aux.
- 1 Aux. de Ing.
- 1 Ing. Residente.
- 1 bodeguero.

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Uribe
No. A-1334

Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Representante FISDL



HOJA Nº 015

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación cal. Ovedisa.
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque.
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sade CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 25-Ag-2020

DEL CONSTRUCTOR:


- ✓ Continúa hechura de Aceras Sector sur cancha.
- ✓ Colocación de Cáscabe
- ✓ Limpieza
- ✓ Resanes en paredel.
- ✓ hechura de Colector
- ✓ En cancha grama sintética: pegado de grama Blanca para señalización.

- Estado del tiempo: nublado y amenaza de lluvia.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA N° 016

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Agosto 27/2020


DEL SUPERVISOR

- \ Este día inicia el periodo de multa en este lapso de tiempo la instalación de la grama artificial quedando pendiente de ejecutar
- \ Asimismo se verifica el seguimiento de los trabajos relacionados a la estructura de la fascia del edificio CICC
- \ En cuanto al estampado de concreto estampado, este se ha programado hasta la proxima semana, debido a que el area donde se implementara queda abrip en donde actualmente estan colocando la fascia y no se puede colar bajo esas circunstancias.
- \ Se requiere de ir buscando las diferentes especies de arbustos y/o arboles que estan distribuidos en todo el proyecto



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)

HOJA Nº 017

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: final Av. Coatepeque.
 Municipio: Soyapango. Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: UC CONSTRUCTORES SA DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 27-AG.2020

Del Constructor..

- ✓ Se trabaja en la Colocación de tierra negra en las zonas verdes.
- ✓ Se continua con la hebhua de fase 9
- ✓ Trabajos de limpieza y desarrollo terreno
- ✓ Enchapes en Servicios Sanitaria
- ✓ En cancha de foot ball, se Coloca señalización (demarcación) franja Blanca.
- ✓ Se está Colocando Cascajo en Arriates laterales a Canchas de BKB.
- ✓ Enchape piso Caseta Vigilancia.

PERSONAL

- ✓ 1 Ing. Residente
- ✓ 1 Aux. de Ing.
- ✓ 1 técnico Auxiliar
- ✓ 1 Bodeguero.
- ✓ 6 Albañiles.
- ✓ 6 Auxiliares.
- ✓ 3 mecánicos obra de Banco.
- 3 Engramadores grama sintética.
- ✓ tiempo, nublado y amenaza de lluvia.

* enmendado Auxiliares (voto)

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324

Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 018

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en Colonia Crodisea
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: _____ Fecha: 28.08.20

Asesor FISCAL

- * Se solicita a Supervisión exigir al realizador y a persona mayor significativamente los acabados de todas las actividades en ejecución.
- * Se incluye la Posición y Supervisión, recorrer todo el proyecto y enlistar todas aquellas observaciones en los acabados para proceder a su intervención. Nuevamente se solicita que todas las actividades en ejecución deben cumplir, las especificaciones técnicas respectivas, utilizando los materiales adecuados.
- * Es necesario que el Contratista incremente el personal en la obra y abrir nuevos frentes de trabajo para agilizar la entrega del proyecto.
- * En cuanto al tema de Control de Calidad, se solicita mantener al día toda la documentación correspondiente al Control de Calidad (Preparativos, fase seguimiento, informes mensuales de CC, cuadro de deficiencias, reportes de laboratorio, etc).

[Redacted]
 Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324

[Redacted]
 Representante Contratista



Representante Comunidad/
 Otros
 (Si Aplica)

[Redacted]
 Representante FISDL

HOJA No 019

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODALACION EN COL CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA.
 Código del Proyecto: 344310. Fecha: Agosto 28/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ ESTE DIA CONTINUA CON LOS PROCESOS DE COLOCACION DE FASDA, SE NECESITA AGIJAR LOS DIFERENTES TRABAJOS PENDINGES E INCREMENTAR LA CANTIDAD DE PERSONAL PARA ~~COMPLETAR~~ NO ATRASAR MAS EL AVANCE DEL PROYECTO
- ✓ TAMBIEN SE REQUIERE QUE A LA BREVEDAD COLOQUE LA TAPADERA DE AGUA LUVIA QUE ~~EST~~ VA UBICADA EN FINAL DE AV. COATEPEQUE
- ✓ SE REQUIERE TAMBIEN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES COMPRA:
 - EQUIPO DE BOMBEO DE CISTERNA
 - EXTINTORES
 - DETECTORES DE HUMO.
 - TABLERO DE BASKET BALL.

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324

Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No 020

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 31.08.20

Asesor FISDL

* Se le recuerda al Contratista que no se adelantará el trámite y pago de estimaciones que incluyen obra que no está finalizada al 100%.

* Durante esta visita se observó poca actividad en ejecución debido al poco recurso humano. Se reitera al Contratista que es su responsabilidad proveer de todos los materiales y mano de obra suficientes para mantener un ritmo aceptable de labores.

Con las limitaciones que se observan este día y el ritmo con el que se desarrolla el proyecto NO es posible proveer una fecha estimada del Proyecto.

* Se recuerda al Contratista lo establecido en la cláusula Decima Primera: Multas y Penalizaciones, donde se establece que podrá declararse la caducidad del Contrato cuando el valor total acumulado por multa represente hasta el doce por ciento (12%) del valor total del Contrato procedera la caducidad del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.




ISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

ter Herbert Cisneros Urias

No. A-1224

Representante Supervisor



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA Nº 021

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODALACION en COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 31. AGOSTO 2020

DEL SUPERVISOR:

- \ ESTE DIA SE LE EXIGE AL CONTRATISTA, ACELERAR EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO, Y PARA ELLO SE LE SOLICITA INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL,
- \ ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE ESTE DIA EN EL TRANSURSO DE LA TARDE HUBO LUBVIAS QUE PARALIZAN LA JORNADA VESPERTINA
- \ TAMBIEN SE LE RECUERDA QUE YA EXISTEN AREAS PARA TRABAJAR EN CUANTO AL ENGRUAMADO
- \ POR OTRA PARTE EL CONCRETO ESTAMPADO, AUN NO SE PUEDE INSTALAR DEBIDO A QUE SE ESTAN HACIENDO TRABAJOS DE INSTALACION DE FASUA, EN LA PARTE SUPERIOR EN DONDE SE INSTALARA EL CONCRETO ESTAMPADO



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Urias

Representante Supervisor



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 022

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación col. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: Finjal Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: UC Constructores Sa de Cv.
 Código del Proyecto: 344310. Fecha: 31-sept. 2020.

Del Constructor:

• Actividades en proceso.

- ✓ Hechura de fascia-cornisa
- ✓ Enchapado en Servicios Sanitarios
- ✓ Cobocación de tierra negra en áreas de engramado.
- ✓ Señalización Cancha football.

CONDICIONES DEL TIEMPO: nublado con amenaza de lluvia.

✓ Este día fue instalada la Cortina Metálica de la Cafetería. por parte de SARTI



Representante Supervisor



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 023

Nombre del Proyecto: ABRIL NUEVA Y REMEDIACIÓN EN CC. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COSTEPEQUE
 Municipio: SAN JUAN Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Sept 2/2020


DEL SUPERVISOR:

- ESTE DIA INICIO EL PROCESO DE VACADO DE ARENA SIU CE, SIN EMBARGO DICHO SE HA VISTO SUSPENDIDO POR LA PRESENTACION DE LUBIAS, SE MENCIONA DE PARTE DEL MINSTCUBO AMBIENTE, QUE PARA LOS PROXIMOS DIAS SE PRESENTARA TORMENTA TROPICAL "NANA" ESTO AFECTARA LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN GENERAL DEL PROYECTO.
- SE REQUIERE QUE SEAN INSTALADAS A LA BREVEDAD LAS DIVISIONES DE MEXCAL, YA QUE LOS ARTEFACTOS SANTANAS ESTAN LISTOS PARA SER INSTALADOS,
- ASIMISMO SE REQUIERE COMENZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE BANAJILIB EN LA CANCHA DE FOOTBALL
- TAMBIEN SE AUTORIZA PINTAR EL MURO NORTE QUE AL COSTADO DE LA CANCHA DE FOOTBALL, ASI COMO LAS CASETAS ELECTIVAS Y LA CASETA DONDE ESTO LA BOMBA DE LA CISTERNAS,



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uribe
 No. A-1224



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA Nº 024

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COSTEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: SEPT 3/2020

Del SUPERVISOR.

ESTE DIA SE DETUVIERON ALGUNAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEBIDO A LLUVIAS CONSTANTES QUE SE PRESENTARON DESDE LAS 11AM, HASTA HORAS DE LA TARDE, ESTO AFECTA EL DESARROLLO DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA.

SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA LA COMPRA DE:

- DIFERENTES ESPECIES DE ARBUSTOS Y ARBORES
- BOMBA DE OSTERM
- EXTINTORES
- DETECTOR DE HUMO
- 2 UNIDADES FALTANTES
- TABLEROS DE ANCHAS DE BASKET BALL.
- LAS DIFERENTES ROTULOS.

ESTE DIA SE LES RECHAZO LA TAPADERA METALICA QUE VA EN EL POZO UBICADO EN FINAL AV. COSTEPEQUE DEBIDO A QUE LA LLAMADA ESTABA MAL

[Redacted Signature]

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Urias

No. A-1324

[Redacted Signature]

Representante Contratista



Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Representante FISDL

HOJA No 025

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación Col. Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque.
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
 Nombre del Contratista: MC Constructo Sa de C.
 Código del Proyecto: 344310. Fecha: 04-Sept-2020.

DEL CONSTRUCTOR:

- * Se continúa con la instalación de faja y comienza en edificio CICC.
- * Se le da continuidad a la colocación de tierra negra en las diferentes zonas a Engramar.
- * Se trabaja en enchape de lavabrazos y la instalación de tuberías de drenaje y Agua Potable.
- * Se continúa con el proceso de penalización de las diferentes zonas de la cancha de foot ball.
- * Se hacen tareas de limpieza y desalojo en

→ **PERSONAL ESTE DÍA:**

- Grupo de instaladores tabladones y estructura faja = 3
- Albañiles — 3
- Auxiliares — 6
- Equipo instalador de Grama sintética — 3 personas.
- Personal administrativo — 2
- Dirección técnica (incluyendo control de calidad) — 3.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Urias

No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No. 026

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Septiembre 4/20.

DEL SUPERVISOR.

- ✓ Este día continúan los trabajos de pintura en muro sur de cancha de football, se requiere a la brevedad colocar la tapadina metálica de Aguos limpios que va al final de la banda Coatepeque.
- ✓ El avance de la instalación de la fascia-cornisa se calcula en 20%.
- ✓ Se solicita al contratista darle seguimiento al trámite de ANDA (conexión) y los trámites relacionados con los aspectos eléctricos.
- ✓ También se requiere que los áreas de trabajo se mantengan limpias, retirando todo aquello que no se este utilizando.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)




Representante FISDL

HOJA No. 027

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Sept. 7/2020


DEL SUPERVISOR

- ✓ ESTE DIA HA SIDO NOTORIA LA INASISTENCIA DE PERSONAL DEBIDO A QUE EL PAGO QUE SE LES DIO EL FIN DE SEMANA FUE INCOMPLETO, SOLO ESTAN TRABAJANDO LOS SUBCONTRATISTA RESPONSABLES DE LA INSTALACION DE LA FASUA - CORUZA, Y LOS QUE ESTAN TRABAJANDO EN ACUARDAR FIRMAS DE MARCACION DE CANCHA DE FOOTBALL, SE REQUIERE AGIJAR EL VAUADO DE LA ARENA SIUCE, PARA ELLOS ES NECESARIO TRIPlicAR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES
- ✓ TAMBIEN SE NECESITA DESALQUIAR LOS ESCOMBROS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
- ✓ SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA NO DESCUIDAR LAS MEDIDAS SANITARIAS DE BIASEGUNDAD,



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS
Valter Herbert Cisneros Urias
No. A. 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL



HOJA Nº 028

Nombre del Proyecto: OBRAS NUEVA Y REMODELACION EN COL. CRECOSA
Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: SEPT 9/2020

DEL SUPERVISOR:

- ESTE DIA SE PRESENTARON PERSONAL ENCARGADO DE INSTALAR LAS GUIAS DE GRAMA SAN AGUSTIN, CU PERAZON COLOCANDOLA EN LA PARTE PONENTE DE LA CANCHA DE FOOTBALL, EL DIA DE MAÑANA CONTINUARAN EN LA PARTE DE LAS CANCHAS DE BASKET BALL Y PARCE ORIENTAL DE EDIFICACION CICC.
CONTINUA SIENDO INEFICIENTE EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL PROYECTO, Y ES NECESARIO Y URGENTE INCREMENTARLO YA QUE EXISTEN VARIAS OBSTRUCCIONES QUE LE HAN HECHO AL CONTRATISTA PARA QUE LAS SUPEREN
EN RELACION A LA COLOCACION DE LA FASCIA Y CORONA SE PUEDE MENCIONAR QUE DE ESTIMA UN AUMENTO FISICO DE UN 35%, DE LO ESTA EXIGIENDO ACILIZAR DICHO PROCESO PRINCIPALMENTE LA FASCIA Y CORONA QUE ESTA EN LA PARTE PONENTE DE LA EDIFICACION CICC, YA QUE DEBIDO A LOS ANDAMIOS QUE ESTAN EN ESA AREA DE TRABAJO, NO PUEDE AVANZAR EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO ESTAMPADO.

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1324



Representante Contratista
Representante FISDL

Representante Comunidad/ Otros (Si Aplica)

HOJA No 029

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: Dos Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: _____
 Código del Proyecto: 347490 Fecha: 10.09.20

FISDL

- * Este día se le ha solicitado al GCC poner al día la documentación correspondiente a CC, específicamente resultados de ensayos de laboratorio, cuadro matriz de resultados de laboratorio, Informes mensuales de CC, elaborar preparatorios de actividades X realizar, etc.
- * Este día se constata poca actividad en el área del CICC debido al limitado recurso humano. Se recuerda al Contratista sus responsabilidades Contractuales en cuanto al suministro de todos los materiales necesarios y personal suficiente en la obra, más aun por encontrarse el proyecto en periodo de multa.
- * Al Supervisor y GCC se los solicita ser más acuciosos y exigentes con la calidad de los acabados de las actividades que realizan los obreros, refinándose específicamente a todas las observaciones hechas en los acabados en baños de Hombres y mujeres.
- * Agilizar las siguientes actividades o suministros pendientes: Suministro de juegos infantiles, concreto estampado, finalizar lust. de fascia y Cornisa, finalizar colocación de caucho en cancha fútbol.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL


Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación Col. Credisa
 Ubicación del Proyecto: final N. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sade CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 10/09/2020

DEL CONSTRUTOR.

- ✓ Se continúa con la instalación de fascia-corniza
- ✓ Se continúa con la instalación de Grama natural en áreas verdes.
- ✓ Se coloca tierra negra en zona Escuela y Edificio CICC.
- ✓ Se trabaja en Limpieza general en áreas de Juegos mecánicos y Canchas de foot ball.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uriza
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL



HOJA No. 031

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR.
 Nombre del Contratista: MC CONTRATISTAS SA DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Sept 14/2020

Del SUPERVISOR:

- ✓ Este día se presentaron lluvias en la jornada de la mañana, situación que sigue afectando el desarrollo de las actividades constructivas.
- ✓ Asimismo se presentaron los subcontratistas responsables de la instalación de las divisiones de la melamina que van en los servicios sanitarios.
- ✓ Se le ha dado indicaciones al contratista corregir todas aquellas deficiencias de acabados que se han señalado en los buabrazos tanto en sus azulejos como en los tuberas.
- ✓ Los trabajadores que están sembrando la grama San Agustín este día terminaron de colocarla en todas aquellas áreas identificadas en los planos de medio ambiente, es importante mencionar que estas áreas deberán de ser regadas constantemente hasta que logre su adherencia.

[Redacted Signature]

Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Merwin Cisneros Urdinola
 No. 0-1224

[Redacted Signature]

Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

[Redacted Signature]

HOJA Nº 032

Nombre del Proyecto: Obra nueva y Remodelación Col. Credisa.
 Ubicación del Proyecto: final Avenida Coatepeque....
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de cv.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 14-SEP-2020.

✓ DEL CONSTRUCTOR:

- Este día se procede a la colocación de divisiones en servicios sanitarios
- Se avanza en la colocación de fascia-cornisa
- Se continúa con la colocación de grama en las zonas verdes. (Grama San Agustín).
- Se procede a hacer trabajos de limpieza general en áreas intervenidas con obras de albañilería.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Uribe
No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No. 033

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL N. COSTEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALV.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Sept. 17/2020

Del SUPERVISOR

Este día se les pagó a los trabajadores, el equivalente a 2 catorcenos, situación que afecta el avance de las obras ya que ~~los~~ mayoría de los trabajadores se ausentan por el incumplimiento

Durante la mañana cayó una fuerte tormenta y se identificó que el edector adyacente ubicado en terreno del teleferico será necesario limpiarlo ya que está obstruido y debido a ello se rebalsa y toda la suciedad de hojas y tierra quedan en la parte donde se encuentra en puerta de malla ciclón que está ante ambas propiedades

Se le recuerda al Residente y Gerente de Control de Calidad que el día de mañana Viernes 18 de Sept. de Veron todas aquellas actividades que han sido señalados como "pendientes" en los diferentes periodos de multa,



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

Walter Herbert Cisneros Urias

No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 034

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación Colonia Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Carr. Coatepeque.
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: 347490 Fecha: 18.09.20

Asesor Fisa

* Durante visita efectuada esta día, se ha verificado la limitada seguridad debido al poco recurso humano presente en el proyecto. Se reitera al Contratista que se encuentra en periodo de multa y que es su responsabilidad proveer al proyecto de todos los materiales y recurso humano suficientes para finalizar los alcances del Contrato en el menor tiempo posible.

- Retomar la recomendación de nuevos planes de trabajo, tal como se hizo en fecha 10.09.20, bitácora # 029
- Así también, se recuerda lo señalado por el Administrador de Contrato en bitácora # 020, de fecha 31.08.20, relacionado a la cláusula Décima Primera: Multas y Sanciones, relacionada al caso cuando la multa acumulada alcanza el 12% del monto Contratista.

* Al GCC se le solicita su seguridad Supervisión, los informes mensuales de GCC periódicos, y los resultados de ensayos de laboratorio pendientes.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Supervisor

Representante Contratista

Representante Comunidad/
 Otros
 (Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No 035

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 21 - Sept - 20

Asesor FISCAL

* Este día se llevó a cabo reunión en el proyecto con la supervisión para revisar los % de obra pendientes para aplicación de multa.
 * Se reitera el llamado al Contratista de incrementar el recurso humano, obreros específicamente, para iniciar y/o finalizar actividades que han quedado pendientes de terminar; se detallan por ejemplo: señalización de cancha de fútbol; habilitación de pasamanos; finalizar pintura y colocación de tableros en estructura metálica (A.C.); finalización de base y perfil en zona de juegos infantiles; Colocación de fascia-cornisa en cafetería; colocación de armadería y tapón tipo en piso sobre ave Coatepeque; cambio de cubriente de techo en cuarto eléctrico; equipamiento de bomba de agua (sistema bomba completo); Suministro y plantación de arbustos y árboles; finalizar pintura en muro existente cancha de fútbol; reparación de corte de pavimento en ave Coatepeque; finalizar divisiones y puertas melamina en S.S.; etc.
 * Al GEL se solicita entregar a supervisión los informes mensuales de CC pendientes; los informes de resultados de ensayos de laboratorio ped. y finalizar la matriz de resultados de laboratorio.

[Redacted]
 Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324

[Redacted]
 Representante Contratista

Representante Comunidad/
 Otros (Si Aplica)



[Redacted]
 Representante FISDL

HOJA No. 036

Nombre del Proyecto: Obra nueva y Remodelación Col. Credisa -
Ubicación del Proyecto: final Av. Cortespeque
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
Nombre del Contratista: MC. Constructora Sa de ca.
Código del Proyecto: _____ Fecha: 21-sept.-2020

DEL CONSTRUCTOR.

- ✦ Se continúa con trabajos de facia-corniza en Edificio Principal
- ✦ Se trabaja en
- ✦ Se hacen preparativos para la hechura del concreto estampado:
 - ✓ trazo
 - ✓ Limpieza.
 - ✓ conformación de suelo
 - ✓ Moldeado. ; entre otros.
- ✦ Se trabaja en Acabados de Banea múltiple.




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA N° 037

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: 9 FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 21.9.2010

DEL SUPERVISOR.



Este día se ha incrementado la cantidad de trabajadores y han sido distribuidos para trabajar en lo referente a:

- Preparar la terraja del area de concreto estampado
- Instalación de artefactos sanitarios
- Afinado de banca de concreto
- pretil en cancha de basket ball.
- Hechura de moldes para bebederos
- Trabajos finales de electricidad, instalación de placas de interruptores, tomas corrientes entre otros.

En el transcurso de la tarde se presentaron lluvias moderadas, esto esta contribuyendo a la adherencia de la grama san agustin recién sembrada, en este sentido se le recuerda al contratista suministrar los arbustos y arboles que son requeridos de acuerdo a plano ambiental.



Representante Supervisor



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)




Representante FISDL

HOJA No. 038

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y RECONSTRUCCION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEC
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 22.9.2020


DEL SUPERVISOR.

- Se le dieron indicaciones al contratista de corregir las malas posiciones en las que han sido colocado los artefactos sanitarios en el área de hombres, asimismo la posición de los chorros de los lavabrazos de ambos generos.
- En cuanto a la instalación de la tapadera metálica del pozo es preciso y de carácter urgente llevar al proyecto dicha tapadera y evitar el riesgo de un accidente vehicular o un accidente de alguna persona.
- Se continúa con el proceso de pintar muro sur del Centro Escolar CREDISA (Muro exterior, colindante con terreno del proyecto).
- Se presentaron nuevamente lluvias moderadas.
- Se requiere también colocar o hacer las parillas faltantes para las cajas de aguas lluvias.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 039

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA,
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO, Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Septiembre 24/2020

DEL SUPERVISOR

- Este día se suspendió el proceso de colado de concreto estampeado por haber lluvias que no iban a permitir un homogéneo colado.
- También se colocó la tapadera metálica de Aguas lluvias sobre final Av. Coatepeque
- Se le solicita al constructor continuar con la instalación de divisiones de melamina en los baños de hombres y mujeres
- Se continúa con la instalación de la fascia en parte del oriente de edificación C.I.C.C., además de la instalación de fascia en capetiva
- Se retomó las actividades de los bebederos ~~en~~ ubicados en área infantil y cerca de cancha de basket ball.
- Se le solicita al contratista documentar ~~relacionada~~ y actualizada del estado de los juegos infantiles.




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uribe
 No. A-1824



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 040

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, SA de CV
 Código del Proyecto: ~~347490~~ 344310 Fecha: 25.09.20

Asesor Fisco Enmendado Vale

- * Durante visita de este día se efectuó recorrido por las instalaciones del proyecto, haciendo varias observaciones a procesos constructivos de este día: en colocación de luminarias en servicios sanitarios hombres y mujeres; en techura, colocación de grifer y tuberías de drenaje del lavabos; en el proceso de colocación de concreto estampado; en tapaderas del piso eléctrico al final de ciclo. Se solicita a Supervisión dar seguimiento a las recomendaciones hechas.
- * Se solicita a Supervisión preparar y entregar el próximo lunes 28 el siguiente informe de multa correspondiente al corte de este día.
- * Durante la presente semana se ha observado mayor presencia de personal, se están interviniendo mayor cantidad de actividades.
- * Se recomienda iniciar/continuar la corrección de observaciones en totalidad durante inspección realizada por Supervisión en fecha anterior.
- * Informar fecha probable de arribo de los juegos infantiles al proyecto.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uribe
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL



HOJA No. 041

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Sept 25/2020

DEL SUPERVISOR.

- El día de ayer se terminó la actividad del concreto estampado, en area frente a la edificación CICC, así como en area de juegos. Se verificó la textura y color, así como el proceso constructivo.
- Se continúa con la actividad de instalación de la fascia en la parte oriente de edificación CICC, y además en carpentería.
- Se le solicita al contratista limpiar de grava, arena y otros materiales que se encuentran en la cancha de basket ball, ya que se hace pronto la pintura y señalización de dichas canchas.
- Los electricistas continúan colocando placas de toma corriente y haciendo trabajos pendientes.




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)




Representante FISDL

HOJA Nº 042

Nombre del Proyecto: Cara Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: AUS Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores, S.A. de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 28.09.20


Asesor FISDL

- * Este día se trabajó con la supervisión, en revisar al detalle el primer corte de obra pendiente para aplicación de multa. S.
- * Se efectuaron recomendaciones a detallar de procesos constructivos en ejecución este día en recorrido efectuado con la supervisión, verificar el cumplimiento de estas recomendaciones.
- * Se mantiene intervención este día en varios frentes de trabajo, se recomienda al Contratista garantizar el suministro de materiales y agilizar la entrega del proyecto.
- * Al residente se le solicita informar y responder las gestiones que se efectúan en ANDA.
- * A la supervisión se le solicita presentar el Informe requerido en hoja de bitácora # 040
- * Verificar la entrega de toda la documentación relacionada al CC, Informes mensuales, resultados de laboratorio pendientes, matriz de resultados. Aplicar las penalidades que correspondan.




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Uribe
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



Representante FISDL



HOJA Nº 043

Nombre del Proyecto: Obra nueva y remodelación Col. Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 29-Sep-2020.

Constructor.

- ✓ trabajos de Limpieza en Area Sur canchas, BKB confirmación de talud.
- ✓ hechura Cuadrados de pretiles Area de Juegos
- ✓ Bordillo proteccion cancha BKB
- ✓ Alambrado y plaguero
- ✓ Hechura fascia - corniza costado oriente edificio GLEC.
- ✓ En Area de concreto Estampado, trabajos de Retiro de Moldes para hechura de pretiles. (cuadrados) en los desniveles.




Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

HOJA No 044

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODERACION EN COL. AERISA.
 Ubicación del Proyecto: FINL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: Sept 30/2020

DEL SUPERVISOR:

DIAGONAL
 POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE FINANZO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA HOJA DE BITÁCORA *reemplazada*



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 045

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Ave Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, S.A. de C.V
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 01.10.20

Asesor FISDL

- * Se continuó con el supervisor durante toda la jornada, en revisar al detalle los Informes de Carter mensuales de obra pendiente para aplicación de multa.
- * Se solicitó nuevamente a supervisión, entregar el siguiente Informe de Carter mensual de obra pendiente, con fecha Carter el 25-sept-20.
- * Se requiere también del Supervisor reportar los Incumplimientos del Contratista relacionados a los docs. Control de Calidad, P/ Imposición de Penalidades.

Actividades en ejecución este día:

- Colocación divisiones melamínea
- Hachura perfiles
- Moldeado de labederos
- Continuo lustre en fascia y Cornisa
- Contraccios en lust. hidráulica [arabescos]
- Limpieza general.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No. 046

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 2/2020

DEL SUPERVISOR

- ✓ EL DIA DE AYER SE ME INFORMO QUE YA ARRIVARON LOS JUEGOS AL PUERTO DE ACAJUTLA, SE ESPERA A LA BREVEDAD TRAERLOS AL PROYECTO DE TAL SUERTE QUE SE VERIFIQUE LAS CARACTERISTICAS ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
- ASIMISMO ES NECESARIO HACER LA PLATAFORMA DONDE ESTARA ASENTADO EL JUEGO DEL CASTILLO.
- ✓ SE REQUIERE DEL CONTRATISTA, SUMINISTRAR TODAS LOS ARBUSTOS Y ARBOLES REQUERIDOS EN EL PLANO AMBIENTAL, Y SE DEBERA VERIFICAR SU ADHERENCIA A LAS AREAS DONDE SERAN SEMBRADOS.
- ✓ SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE FASCIA Y REPARACIONES DE TRABAJOS QUE FUERON OBSERVADOS CON ANTERIORIDAD.
- ✓ SE RETOMARON LOS TRABAJOS DE HECHURA DE BEBEDEROS (MOLDEADO Y CONCRETEADO).



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 'Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL



HOJA Nº 047

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREOLISA.
 Ubicación del Proyecto: FINL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SS
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 5/2020


DEL SUPERVISOR

- SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ~~PARA~~ SUMINISTRAR LA BOMBA DE LA CISTERNA Y HACER LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ASIMISMO TODOS AQUELLOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE NECESITAN PARA BEBEDEROS, LAVABOS, DUCHAS, ETC. ENTRE OTROS
- SE ESTA TRABAJANDO EN PRETILES EN LA PARTE PONENTES DE LA CANCHA DE ~~FOOT~~ BASKET BALL.
- SE CONTINUA CON TRABAJOS DE FASCIA EN AREA DE CAFETERIA,
- TAMBIEN SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA SUMINISTRAR LOS TABLEROS DE BASKET BALL, Y UMPIAR LAS SUPERFICIES DE LAS CANCHAS DE BKB, PARA INICIAR CON LA PINTURA PARA DEMARCAACION DE LAS MISMAS.
- POC OTRO LADO SE REQUIERE PROVER EL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA COATEPEQUE, ESPECIFICAMENTE EN EL TRAMO QUE VA DESDE EL POZO DE ALL RECIENTE CONSTRUIDO HACIA CUNETA NORTE DE LA AVENIDA EN REFERENCIA,



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA No. 048

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: MIÉRCOLES 7/10/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ EL DIA DE AYER MARTES 7, VINERON LA EMPRESA DEL CONCRETO ESTAMPADO, PARA HACER EL ACABADO FINAL DEL AREA QUE ESTA ENFRETE DEL EDIFICIO CICC, SE LE APLICÓ UNA CAPA DE BARNIZ
- ✓ SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL CONCRETO ESTAMPADO AL MOMENTO DE PINTAR EL ACERO, DE TAL FORMA DE NO MANCHAR DICHA AREA, PARA LO QUE RECOMIENDO LA COLOCACION DE PASTICO NEGRO
- ✓ SE LE INSISTE AL CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE EXTINTOR, DETECTOR DE HUMO, ASI COMO HACER O APLICAR LA 2da MANO DE PINTURA EN TODAS LAS EDIFICACIONES CICC, ASPECTIVA.
- ✓ TAMBIEN SE LE RECUERDA SOBRE EL SUMINISTRO DE LOS ARBUSTOS Y ARBOLES A SEMBRAR EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS EN EL PLANO AMBIENTAL.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No 049

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en Colonia ~~Credisa~~
 Ubicación del Proyecto: Duo Coatoposque
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 08.10.20

Asesor FISDL

- * Se solicita a Supervisión solicitar la información técnica del caucho utilizado en cancha de fútbol, para verificar especificaciones técnicas y características del producto.
- * Se deberá sustituir cualquier cantidad de producto que no cumple las especificaciones requeridas.
- * Se solicita al Contratista atender los requerimientos anotados x Supervisión en hojas de bitácoras # 046, 047 y 048, específicamente lo siguiente:
 - Traer los juegos infantiles a bodega del proyecto.
 - Suministro de arboles y arbustos.
 - Suministro de tableros de B&H y banquillos jugadores fútbol.
 - Suministro de equipo de bombeo de cisterna.
 - Hacer las reparaciones en cortes del pavimento asfáltico.
 - Suministro de extintores, detectores de humo, señalética.
- * Se realizó recorrido junto con el Residente, chequeando los alrededores en proceso listo día; se solicita conseguir las observaciones señaladas, se verificará en la próxima visita.

[Redacted Signature]
 Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324

[Redacted Signature]
 Representante Contratista

Representante Comunidad/
 Otros (Si Aplica)



[Redacted Signature]
 Representante FISDL

HOJA No 050

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Cobnía Credisa
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV
 Código del Proyecto: _____ Fecha: 09-07-2020

DEL CONSTRUCTOR:

- ✓ Se trabaja en limpieza general, canchales de BKB -
- ✓ Divisiones de melamina en servicios sanitarios -
- ✓ Faja-corniza, zona Cafetería -
- ✓ Enchape de lababrazol, en S.S -
- ✓ Refane fisural en paredes -
- ✓ Complemento obras eléctricas: Alambreado y plaqueado -
- ✓ Bordillos en áreas de Engramado cancha BKB -
- ✓ Cuadradas en bordillos -
- ✓ Desalojo interno.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A. 1958

ZONA CENTRAL
 BITÁCORA VERIFICADA PARA ENTREGA DE NUEVO BLOCK
 FIRMA: _____
 FECHA: 12/10/2020



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros (Si Aplica)



Representante FISDL

BITÁCORA

HOJA Nº 001

**ZONA CENTRAL
BITACORA VERIFICADA PARA
ENTREGA DE NUEVO BLOCK**

FIRMA: [Redacted]

FECHA: 12/10/2020

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

FISDL

LIBRO 8

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION COL CREDISA
Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
Nombre del Contratista: MC Constructores del Sa de C.A.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: 12 - octubre - 2020

ESTE DÍA SE HACE ENTREGA DE LA BITÁCORA DEL PROYECTO, ESTA BITÁCORA ES PROPIEDAD DEL FISDL Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL Y SUPERVISOR EL MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES.

EN LA BITÁCORA SE LLEVARÁ ANOTADO LAS ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL CONTRATO, TEBIENDOC COMO OBJETIVO PRINCIPAL FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS, CONTRATISTA PRINCIPAL, SUPERVISOR Y EL FISDL.

LA BITÁCORA DEBE PERMANECER, BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL Y DEBE SER SIEMPRE ACCESIBLE AL SUPERVISOR Y AL REPRESENTANTE DEL FISDL.

DURANTE LA EJECUCIÓN LA HOJA ORIGINAL PERMANECERÁ EN LA OBRA, LA PRIMERA COPIA SERÁ DEL FISDL, LA SEGUNDA DEL SUPERVISOR Y LA TERCERA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL, LA HOJA ORIGINAL DEBE SER SIEMPRE FIRMADA POR TODAS LAS PARTES.


PODRÁN HACER USO DE LA BITÁCORA: EL CONTRATISTA PRINCIPAL, EL SUPERVISOR O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE AMBAS PARTES Y EL FISDL.

AL FINALIZAR EL CONTRATO TODOS LOS ORIGINALES DE LA BITÁCORA SERÁN ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA PRINCIPAL AL FISDL EN SUS OFICINAS.

EN EL CASO DE NECESITAR MÁS HOJAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL SOLICITARLAS AL FISDL.

[Redacted Signature]


Representante Supervisor



[Redacted Signature]

Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA

Nº 002

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 13/2020

DEL SUPERVISOR.

- ↳ Este día se verificó los trabajos de enchapes de lavabos, así como la instalación de divisiones de melamina en servicios sanitarios de hombres y mujeres
- ↳ Se le recuerda al contratista el suministro de arboles y arbusto.
- ↳ Asimismo se le solicita dar seguimiento a los juegos infantiles, a esta fecha a pesar de que se me informó que la semana pasada estaban en punto de acajilla y aún no están en el proyecto



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urala
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 003

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación en Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Dos Coatepeque
 Municipio: Soyapaungo Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores, S.A. de C.V
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 13.10.20

Asesor FISDL

* Se recomienda que el Contratista aumente personal en la obra para tener mejores avances en la atención de los acabados y Contracción de observaciones efectuadas en el proyecto.

* Se recuerda al Contratista que se encuentra en periodo de multa, por que debe enfocarse en el Suministro de los accesorios y/o equipos siguientes: Juegos Infantiles, equipo de bombeo (cisterna); Tableros de BKB; banquillos de jugadores en cancha de futbol; arboles y arbustos; extintores, detectores de humo, sonaletica; etc.

* Es urgente que el Contratista implemente medidas en el proyecto, para finalizar los alcances del Contrato a la mayor brevedad posible.

* El personal tecnico del Contratista esta obligado a cumplir su permanencia en la obra de acuerdo a lo establecido en los documentos Contractuales. Supervisindos debe reportar cualquier incumplimiento en este sentido.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 004

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación ed. Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Finca Av. Coatepeque.
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
 Nombre del Contratista: MG Constructores Sa de cl.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 14- octubre -2020.

DEL CONSTRUCTOR,


✓ Se trabajó en lo siguiente:

- ✓ Pintura fasia y cornisa,
- ✓ Divisiones servicios sanitarios.
- ✓ Refare fisuras en paredes para acabado final y Arregla para pintura final.
- ✓ Complemento Bebederos
- ✓ Enchapes Lavabrazos y pocetas Duchas.
- ✓ Limpieza y Desalojo Interno.

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Supervisor



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 005

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINCA AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: SAN SALVADOR
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES SA DE CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 15/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ Se le solicita al contratista presentar a la supervisión un programa calendarizando las actividades pendientes de finalizar de tal forma de dimensionar el tiempo que están terminando, y no llegar al siguiente periodo de multa
- ✓ Asimismo se le vuelve a recordar considerar los trabajos pendientes en la cancha de basketball talis como la demarcación de las mismas, tableros, entre otras.
- ✓ También se requiere para las chapas correspondientes en las puertas metálicas y hacer aquellas que están pendientes.
- ✓ He verificado todas las modificaciones que han hecho en los lavabos y las doy por aceptadas



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA

Nº 006

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Col. Credisa.
Ubicación del Proyecto: Final St. Coatepeque.
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de ca.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: 10 - octubre - 2020

• Constructor:

- ✓ Limpieza general.
- ✓ Pintura fascia - corniza.
- ✓ Resanes en paredes
- ✓ Inst. Artefactos Sanitarios
- ✓ Desagüe interno.
- ✓ hechura de pretilas.
- ✓ Enchapes de servicios Sanitarios.
- ✓ Divisiones de melamina en Baños.
- ✓ Pintura postes luminarios en canchas BKB.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A- 1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 007

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Con Tepique
 Municipio: SUYAPANGO Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA SA de CV.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 19/2020

DEL SUPERVISOR:

- ✓ A esta fecha continuo con la insistencia de solicitar al constructor el suministro en el proyecto de los juegos infantiles que ya han sido traído al país como me lo han estado manifestando.
- ✓ Tambien se requiere de traer al proyecto los arboles y arbustos para que sean sembrados de acuerdo al plan de medio ambiente, tomando en cuenta las características que se solicitan.
- ✓ Se requiere tambien comprar y aplicar la mezcla asfáltica que esta considerada aplicar en la ruptura que se hizo en esa misma calle.
- ✓ Se continúan con trabajos de limpieza, asimismo se requiere que se hagan los gestiones pertinentes con los transportistas de tal suerte de desalojar escombros y otros residuos que se dan en el proyecto.



REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Supervisor

Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA

Nº 008

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 20/20

DEL SUPERVISOR

- ✓ SE CONTINUA CON TRABAJOS DE REPARACIONES EN FISURAS ENCONTRADAS EN PAREDES.
- ✓ SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA IR LIMPIANDO LAS AREAS YA TERMINADAS EN SUS PROCESOS DE CONSTRUCCION.
- ✓ SE LE SOLICITA ~~MONITOREAR~~ A LOS INGENIEROS DE PARTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA, RETIENE DE INMEDIATO AL ENCARGADO DE BODEGA POR PRESENTAR CONDUCTAS INAPROPIADAS DENTRO DEL PROYECTO.
- ✓ INUEVAMENTE SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA TRABAJAR AL PROYECTO ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES:
 - EXTINTORES
 - BOMBA DE LA CISTERNA
 - DETECTORES DE HUMO
 - PUNTAS Y ARBUSTOS
 - TABLERO DE ANCHAS DE BKB.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 009

Nombre del Proyecto: Obra nueva y Remodelación Col. Credisa.
 Ubicación del Proyecto: Final Av. Coatepeque
 Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
 Nombre del Contratista: MC Constructores Sa de Cv.
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 21-12-2010

• DEL CONSTRUCTOR:


Actividades Generales

- ✓ Limpieza Canchas BKB
- ✓ Colocación de Arena en Area de Juegos
- ✓ Pintura de fascia y Corniza.
- ✓ Hedura de tapadera foro Eléctrico.
- ✓ Desalojo interno.
- ✓ Resane en paredes.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1524



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL



Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREOLSA

Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE

Municipio: SOYAPANGO Departamento: San Salvador

Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORA

Código del Proyecto: 344310 Fecha: Octubre 22/20

DEL SUPERVISOR

- Este día le estoy dando seguimiento a los trabajos de reparaciones, retoques de pintura, limpieza, desalojo de escombros, instalación de chapas en puertas metálicas, instalación de tubera perforada en área de juegos infantiles.
- También este día se trajeron al proyecto los diferentes juegos infantiles (castillo; sube y baja...)
- Asimismo se le solicita traer a la brevedad la nueva gratoria, ya que esa se me informó que se ~~era~~ elaboró en el país, la cual se verificará que cumple con las dimensiones y características descritas en los planos y en las especificaciones técnicas.
- Se le indica al contratista hacer gestiones pertinentes para desalojar de la Avda Coatepeque todo aquello que sea escombros, basuras, vallas entre otros, ya se hace necesario comenzar a dejar limpias todas aquellas áreas de trabajo.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1824



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA N° 011

Nombre del Proyecto: Obra nueva y Remodelación col. CREDISA.
Ubicación del Proyecto: Final AV. Coatepeque
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.
Nombre del Contratista: MC Constructores Sade CV.
Código del Proyecto: 344310. Fecha: 23-10-20

DEL CONSTRUCTOR.

- ✓ Limpieza general.
- ✓ Inst. artefactos sanitarios.
- ✓ Resanes en paredes.
- ✓ Pintura en paredes internas y externas.
- ✓ Hechura de puertas: complemento.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación col. CREDISA

Ubicación del Proyecto: Finca N. Coatepeque.

Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador.

Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV.

Código del Proyecto: 344310. Fecha: 26-10-20.


DEL CONSTRUCTOR

- ✓ Se continúa con trabajos de limpieza y Desalojo interno.
- ✓ Inst. de Artefactos Sanitarios.
- ✓ hechura de puertas.
- ✓ Resane en paredes.
- ✓ Pintura en paredes.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1524



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA Nº 013

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: Sanjafango Departamento: San Salvador
 Nombre del Contratista: MC Constructoras SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 26/2010

DEL SUPERVISOR

Este día en el transcurso de la tarde continuamos depurando actividades pendientes, y programando aquellas que necesitan de suministro o compras directas tales como las que se han venido señalando:

- EXTINTORES
- ~~ALAR~~ DETECTORES DE HUMO
- BOMBA DE CISTERNA.
- ROTULOS
- MANDAR HACER EL ARTE DE LA PISA DE BRONCE
- TABLEROS DE BASKET BALL
- INODORO PARA DISCAPACITADOS, entre otros


- Se le ha pedido al Residente ajustar todas aquellas actividades que faltan en un cronograma no pasándose de 15 días, Cabe mencionar que ya entramos en otro periodo de multa

- Se requieren los planos y arbores.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



Representante FISDL

HOJA No. 014

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y remodelación Col. Credisa
Ubicación del Proyecto: Final N. Coatepeque.
Municipio: Soyapango Departamento: San Salvador
Nombre del Contratista: MC Constructores Sade C.A.
Código del Proyecto: 344310 Fecha: 27-10-20

del Constructor:


Se trabaja en lo siguiente:

- ✓ Instalación de artefactos sanitarios
- ✓ Resane general en paredes.
- ✓ Pintura en paredes.
- ✓ Limpieza general
- ✓ desalojo interno.
- ✓ Instalación de puertas.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA N° 015

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COL. CREDISA
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: JN.
 Nombre del Contratista: MC CONSTRUCTORES
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 28/2020


DEL SUPERVISOR:

- ESTE DIA SE PRESENTO LA SUBCONTRATISTA DE LOS JUEGOS INFANTILES, SE LE INDICO LA NECESIDAD DE LA INSTALACION INMEDIATA DE LOS MISMOS, SE DEFINIO LA POSICION DE LOS DIFERENTES JUEGOS TAL Y COMO APARECEN EN LOS PLANOS.
- ASIMISMO SE VERIFICO LA ACTIVIDAD DE DESAJOTO, DE ESCOMBROS Y RUIDO QUE HAY EN ACERCA SUR DE CANCHA DE FOOTBALL
- TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TECHO EN CASITA DE ELECTRICIA.
- SE CONTINUA CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA FINAL EN EDIFICACION CICG



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS
Walter Herbert Cisneros Urias
No. A-1324



Representante Contratista

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)



HOJA Nº 016

Nombre del Proyecto: Obra Nueva y Remodelación Colonia Credisa
 Ubicación del Proyecto: Ave Costepegue
 Municipio: Soyapango Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: MC Constructores SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: 29.10.20

Asesor FISCAL

Se revisó estimación de obra #10, con Presidente y Supervisor.
 Se hicieron observaciones que deberán ser superadas x el contratista.
 Esto día se entregó nota a Contratista recordándole que al 24 oct 2020 ha acumulado 150 días calendario en periodo de multa.
 Se recomendó al Contratista agilizar la finalización de las obras pendientes y atender todos las observaciones hechas a los acabados de los procesos Constructivos, para pasar a etapa de recepción del Proyecto.
 Se solicita al GCC entregar a supervisión todos los documentos de Control de Calidad pendientes.
 Es necesario efectuar una limpieza general en el perímetro de la cancha de fútbol retirar los sobrantes de materiales.
 Sr. Contratista, agilice la finalización de las obras a la mayor brevedad; atienda las recomendaciones del administrador de Contratos.

REGISTRO [Redacted] S
 Walker [Redacted] S
 Representante Supervisor



Representante Contratista, DE C.V




Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

Nombre del Proyecto: OBRA NUEVA Y REMODELACION COL CREDISA.
 Ubicación del Proyecto: FINAL AV. COATEPEQUE
 Municipio: SOYAPANGO Departamento: S.S.
 Nombre del Contratista: ME CONSTRUCTORES SA de CV
 Código del Proyecto: 344310 Fecha: OCTUBRE 30/20

DEL SUPERVISOR.

- Este día se suministro material relacionado a la hechura de pavillos de aguas lluvias, as como tambien para la hechura de la estructura del area de banquillos.
- Se le solicita al contratista traer de inmediato los arboles y arbustos, que de acuerdo a personal de ME, ya se encuentran reservados en un vivero de San Juan Opico.
- Asimismo se requiere ir colocando todos los rotulos de señalatica distribuidos tanto en ~~la~~ area de cancha de football como en area de basket ball.
- Tambien se hace necesario hacer las diligencias necesarias para la instalacion de los tablos de basket ball, as como el suministro de la tamba de cisterna y los extremos.



Representante Supervisor

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
 E INGENIEROS
 Walter Herbert Cisneros Urias
 No. A- 1324



Representante Contratista



Representante FISDL

Representante Comunidad/
Otros
(Si Aplica)

