

# CONTRIBUCIÓN LAIF AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES EN EL SALVADOR

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO



## Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.



NOVENA REUNIÓN DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
Mayo 2017

## AGENDA IX REUNIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO



### IX Reunión Comisión de Seguimiento PROGRAMA DE CAMINOS RURALES EN EL SALVADOR

FECHA Y LUGAR: 17 de mayo de 2017, 14:30 horas.  
Sala 1 Segundo Nivel del Despacho Ministerial MOPVUSU

#### ASISTENTES:

- MOPVUSU:
  - Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas
  - Rosal Apala, Viceministro de Obras Públicas
  - Cristóbal Quebar, Jefe del Despacho Ministerial
  - Walter Alvarado, Gerente General de la Gestión Corporativa
  - Marta Gómez, Gerente de Desarrollo Institucional
  - Verónica Masferrer, Directora de Cooperación Institucional
  - José Miguel Martínez, Gerente e Inicicador Institucional
  - Alicia Castro, Especialista de Seguimiento del Despacho
  - Jorge Valencia, Gerente Técnico de Infraestructura del Proyecto LAIF
  - Luisa Trinidad, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto LAIF
- RREE: Ana Valiquén, Directora de Cooperación Multilateral, Regional y Organizaciones No Gubernamentales Internacionales
- UDI: Marlene Palacios, Técnica de Cooperación Multilateral
- UDI: Peter Ballester, Jefe de Cooperación
- AICD: Yelanda Celis, Gestora de Proyectos
- AICD: Ignacio Nicolás, Coordinador General AICD
- AICD: Susana Carrara, Responsable de Cooperación Financiera
- BID: Natalia Orlandini, Responsable de Programas de Cooperación
- BID: Gabriel Casallo, Jefe de Operaciones
- BID: Carlos Moran, Especialista de Transacción
- BID: Raul Casanova, Gerente de país

#### Agenda de la Reunión:

1. Bienvenida por parte del Ministro - (10 min)
2. Informe de gestiones realizadas y situación actual del préstamo - (10 min)

3. Informe de ejecución del Proyecto (A+ 1061 - 122ms)
  - a. Informe de ejecución de los proyectos de construcción
  - b. Informe de ejecución de Plan de Acción y actividades de cierre del Proyecto
  - c. Situación de las gestiones de devolución de fondos devengados en concepto de IVA en 2014 y 2015

#### 4. Propuesta de sostenibilidad de fortalecimiento institucional de la Unidad de Diseño (A+ 123 ms)

5. Varios
  - a. Coordinación de fechas para entrega de proyectos
    1. Recepción del MOPVUSU por parte de UDI y AICD de los Proyectos de Caminos Rurales
    2. Entrega de Proyectos de Caminos Rurales a las comunidades (Cabañas y Morazan)
  - b. Varios

#### Se somete a aprobación:

- a. Aprobación del Plan de Cierre del proyecto vía correo electrónico.



## INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS RURALES



1. MEJORAMIENTO DEL CAMINO Terciario CAB19N, TRAMO: VICTORIA - DESVÍO EL ZAPOTE - CASERÍO SANTA MARTA, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS. [4.9 KM]



2. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, TRAMO: MOR18N, CANTÓN CASERIO TEJERA-PASO EL MONO, MUNICIPIO DE PERQUIN Y MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. [13 KM]



CAMINOS RURALES LAIF												
NOMBRE DEL PROYECTO	Monto presupuestado	Monto contratado	Ahorro	Km	Plazo Ejecución Total	Fecha de Orden de Inicio	Fecha de Finalización Contractual	Orden de Cambio Monto	Fecha de Finalización de Supervisión	Monto Total Realizado	Monto Total Realizado	Empresa contratista
	Sin IVA	Sin IVA			(Días)			Sin IVA		Sin IVA	CON IVA	
1- Tramo Victoria-Desvío el Zapote-Caserío Santa Marta, Municipio de Victoria, Dpto de Cabañas.	\$ 1000,000.00	\$876,146.50	\$123,853.50	4.8 km	240 (8 meses)	24/08/2016	20/04/2017	\$ 172,705.91	16/05/2017	\$ 1048,852.41	\$1185,203.23	CONSTRUEQUIPOS S.A. de C.V.
2- Tramo: MOR18N, Cantón Caserio Tejera-Paso El Mono, Municipio de Arambala, Dpto de Morazán.	\$ 735,500.00	\$610,211.20	\$125,288.80	12.5 km	217 (7.23 meses)	19/09/2016	23/04/2017	\$ 76,436.38	13/05/2017	\$ 686,647.58	\$775,911.77	CONSTRUEQUIPOS EL AGUILA, S.A. de C.V.
	\$ 1735,500.00										\$1861,115.00	



1. MEJORAMIENTO DEL CAMINO Terciario CAB19N,  
TRAMO: VICTORIA - DESVÍO EL ZAPOTE - CASERÍO SANTA  
MARTA, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE  
CABAÑAS.



Antes y Después  
0+400



Antes y Después  
0+500



Antes y Después  
0+400



Antes y Después  
0+500



Antes y Después  
3+477



Antes y Después  
4+700








**2. MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, TRAMO:  
MOR18N, CANTÓN CASERIO TEJERA-PASO EL  
MONO, MUNICIPIO DE PERQUIN Y MUNICIPIO DE  
ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.**



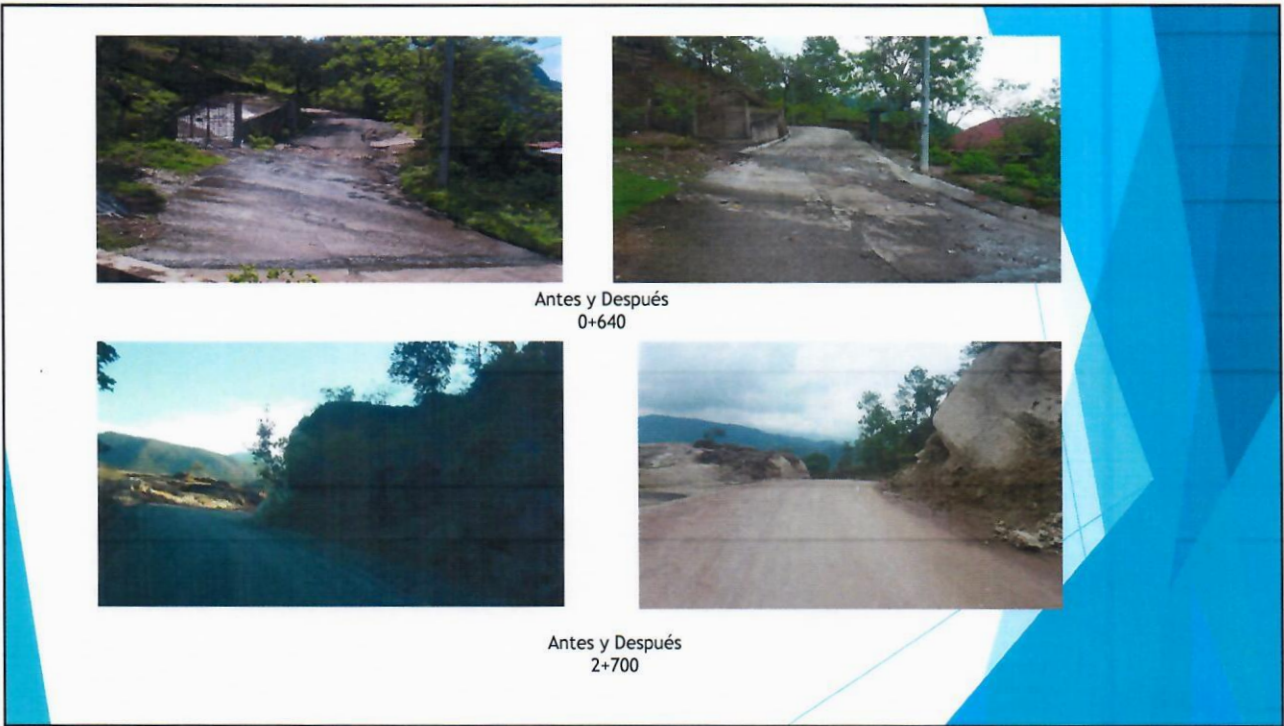

000021



Antes y Después  
9+850



Antes y Después  
12+350



Otras  
Panorámicas



## INFORME DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

Actividad	AÑO 2014		AÑO 2015		AÑO 2016		AÑO 2017		ORGANO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES										
	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2													
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.A1.1: Contratación de personal del Equipo de Gestión																		Coordinación de Equipo de Gestión	Al mes de diciembre 2016, todo el Personal de la Unidad Ejecutora contratado. Se gestionaron las revisiones de contrato por mutuo acuerdo de la Coordinadora General a partir de mayo 2017
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.1A.2: Contratación de personal de la unidad de Diseño																		Equipo de Gestión	Todo personal contratado en proceso que van desde el 5 de diciembre de 2014 hasta el 25 de febrero del 2017. Se gestionó la ejecución de contrato por mutuo acuerdo de un especialista en Derecho de vía y Reasentamiento a partir de mayo 2017
PLANIFICADO EJECUTADO	R2.A2.1: Adquisición de mobiliario, software, hardware, equipo especializado y vehículos																		Equipo de Gestión	Se han adquirido la totalidad de los vehículos, además se ha adquirido el 100% de los Software y hardware y todo el equipo especializado de adaptación al Cambio Climático
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.A2.2: Adquisición de instalaciones para Unidad de Diseño																		Gerencia de Informacional/Equipo de Gestión	Proceso iniciado el 17 de marzo 2015, declarado desierto en dos ocasiones. Se inició por tercera vez el 07 de junio y se logró la contratación el 06/08/2016 se emitió Orden de Inicio para el 10/10/2016 para finalizar el 07/04/2017. Se generó un primer pago en tiempo que finalizó el 08 de mayo del 2017

Actividad	AÑO 2014		AÑO 2015		AÑO 2016		AÑO 2017		ORGANO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES										
	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2													
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.A1.1: Diseño del programa de reparaciones																		Equipo de Gestión	Proceso iniciado en el mes de junio 2015.
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.A1.2: Desarrollo del programa de capacitación y entrenamiento																		Equipo de Gestión	Se ha contemplado con las capacitaciones al personal del MOPVOT. Se han finalizado como parte de acciones y actualmente se encuentra en proceso de ejecución en el mes de febrero y marzo de 2017. Se generó un primer pago en tiempo que finalizó el 08 de mayo del 2017
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.A1.3: Contratación personal de gestión de calidad, bajo la norma ISO 9001, en su redacción según respecto a la forma de contrato.																		Equipo de Gestión	Seguimiento desde el mes de junio 2015. En el segundo semestre se realizó una auditoría al sistema de gestión de calidad y se generó un informe y se finalizó en el primer semestre 2017. Se generó un primer pago en tiempo que finalizó el 08 de mayo del 2017 para la Contratación que se encuentra en proceso de ejecución y se inició en junio
PLANIFICADO EJECUTADO	R1.A1.4: Desarrollo de proyectos de mejoramiento de caminos																		Equipo de Gestión/Unidad de Diseño	Finalización de obras iniciadas en junio. Se logró iniciar el primer Proyecto el 10/08/2016 y el segundo el 02/09/2016. Ambos proyectos finalizados en mayo y se iniciaron en ejecución en junio de 2017, para el 18 de mayo, Oficina San Martín a 18 de mayo, Oficina Tarma a 18 de mayo, Oficina Tarma a 18 de mayo, Oficina Tarma a 18 de mayo.
PLANIFICADO EJECUTADO	Actividades transitorias (auditorías, evaluaciones, etc.)																		Equipo de Gestión/Unidad de Diseño	Terminó la auditoría como prioridad y se están en proceso. La Auditoría y se están en proceso de contratación y la Auditoría Final se ha emitido a la OAG para su publicación

## SITUACIÓN DE LAS GESTIONES DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS DEVENGADOS EN CONCEPTO DE IVA

FECHA	GESTIÓN O ACTIVIDAD REALIZADA
26-Feb-2015	Gestión Ministerial solicitando exención de pago de IVA al Ministerio de Hacienda
28-Jul-2015	Respuesta del Ministerio de Hacienda sobre exención al MOP, pero no así a los proveedores
25-Feb-2016	Solicitud a la Gerencia Financiera Institucional la devolución del monto en concepto de IVA durante 2014 y 2015 ante el Ministerio de Hacienda por US\$141,191.21
29- Nov-2016	La Gerencia Financiera Institucional recibió respuesta de Ministerio de Hacienda declarando sin lugar lo solicitado y señala que AECID deberá hacer la solicitud por ser el "Organismo Delegado" que efectúa el desembolso de los fondos.
05-Dic-2016	Se remitió la disposición del Ministerio de Hacienda a AECID
13-Mar-17	Respuesta de AECID determinando que el MOPTVDU como organismo ejecutor y beneficiario de los fondos de la subvención es quien debe asegurar el IVA como gasto no elegible.
16-Mayo-17	Solicitud a Ministerio de Hacienda de pronunciamiento sobre la devolución de IVA de cara a la finalización del Programa.
