

INFORME Y ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° 59/2018-85EGRAL-96-FISDL

“SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN” CÓDIGO 346680

En la Sala de Reuniones del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), a las ocho horas y treinta minutos del día veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos los suscritos miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Wladimir Salazar Del Cid como Representante de la Unidad Solicitante; Víctor Edgardo Rebollo Melara, como Experto en la Materia; ambos de la Gerencia de Infraestructura; Edith Guadalupe Andrade Argueta, como Analista Financiera de la Gerencia de Finanzas y Sandra Margarita Méndez de Alvarado, como delegada por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con el propósito de evaluar oferta técnica y económica de la referida Licitación Pública.

Participantes:

El día 24 de septiembre de 2018 se recibieron cuatro ofertas, siendo presentadas por los siguientes Oferentes:

1. **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.**
2. **PRODEL, S.A. DE C.V.**
3. **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**
4. **MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**

❖ Observaciones consignadas en el Acta de Apertura de Ofertas:

No presenta observaciones




OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

De acuerdo a los métodos de evaluación para ofertas incluidos en el documento de Licitación Pública y a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y del Reglamento y Políticas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), se procedió a revisar la documentación del sobre N° 1 y N° 2 de las ofertas correspondientes a la LICITACION PUBLICA N° 59/2018-85EGRAL-96-FISDL “SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN” CÓDIGO 346680.

❖ Referente a la evaluación y comparación de ofertas cláusula IGO 23 y 24:

De acuerdo a lo establecido en la cláusula GO 23 EXAMEN PRELIMINAR Y CORRECCIONES DE ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS de las Bases de esta Licitación Pública, se procedió a analizar las operaciones aritméticas del plan de oferta de los participantes evaluados; constatándose que en la oferta económica presentada por los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., PRODEL, S.A. DE C.V., ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; no existen errores aritméticos. Los Oferentes presentaron el plan de oferta en el archivo .xml requerido en las bases del proceso, por lo tanto el resultado de la oferta económica corresponde al cálculo efectuado en el archivo con el ingreso de los precios unitarios y el costo indirecto definido por los Oferentes.





Página 1 de 10
FO-A.5.1.2.2-4-3


Determinándose las ofertas económicas y ordenadas de forma ascendente respecto al monto, de acuerdo al cuadro siguiente:

ORDEN POR VALOR OFERTADO	OFERENTE	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO CORREGIDO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL
1	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$209,875.18	\$209,875.18	\$216,655.43	-3.13%
2	PRODEL, S.A. DE C.V.	\$211,216.70	\$211,216.70		-2.51%
3	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$215,302.59	\$215,302.59		-0.62%
4	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$215,511.56	\$215,511.56		-0.53%

Con el monto resultante de la revisión aritmética de la oferta económica, de todos los Oferentes, se procedió a realizar la fórmula estadística, de conformidad a lo establecido en la Sección III Criterios de Calificación y Evaluación, **Aplicación de Fórmula Estadística**, de las bases de esta Licitación Pública, obteniendo el siguiente resultado:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL	\$216,655.43	RESULTADO
ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$209,875.18	OFERTA DESCALIFICADA
PRODEL, S.A. DE C.V.	\$211,216.70	OFERTA ACEPTADA
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$215,302.59	OFERTA ACEPTADA
MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$215,511.56	OFERTA ACEPTADA
MEDIA ARITMÉTICA (De todas las ofertas presentadas y la asignación presupuestaria FISDL)	\$213,712.29	
DESVIACIÓN ESTANDAR DE LA POBLACIÓN (TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL)	\$2,660.07	
PARÁMETRO DE MEDICIÓN (Resta del MEDIA ARITMÉTICA menos DESVIACIÓN ESTÁNDAR)	\$211,052.22	

OBSERVACIONES:

Como resultado de la aplicación de la fórmula estadística, el monto de la oferta económica presentada y revisada (**\$209,875.18**) del Oferente **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, está abajo del parámetro de medición calculado para esta Licitación Pública (**\$211,052.22**) (Obtenido de restarle a la MEDIA ARITMÉTICA de todas las ofertas presentadas incluyendo la asignación presupuestaria, la DESVIACIÓN ESTÁNDAR de éstas), de acuerdo a lo establecido en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, Aplicación de Fórmula Estadística, numeral 4) "Obtenido el valor de la referida resta, se procederá a descalificar y ya no se continuaran evaluando aquellas ofertas, cuyos montos sean menores al valor de restar a la media aritmética el valor de la desviación estándar" (incluye todas las ofertas presentadas y la asignación presupuestaria).

Por lo anterior la Comisión de Evaluación de Ofertas, determinó descalificar la oferta presentada por el Oferente **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**; conforme a lo establecido en la cláusula IGO 23.5 que literalmente dice: Durante el proceso de evaluación se descalificará cualquier oferta en los siguientes casos: literal u) Si el monto ofertado es menor al resultado de aplicar la fórmula estadística indicada en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación.



0000618

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, ya no se continuó evaluando en las siguientes etapas.

Las ofertas económicas presentadas por los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, **PRODEL, S.A. DE C.V.**, y **MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; cumplen con el parámetro de medición de la Aplicación de Fórmula Estadística y continuaron evaluándose en las siguientes etapas.

La Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a verificar que las ofertas contenidas en el **SOBRE N° 1** de los Oferentes presenten todas las hojas selladas y foliadas, en orden correlativo y que todas las hojas contenidas en el **SOBRE N° 2**, estén impresas, foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas por el Oferente Representante o Apoderado Legal, de conformidad a lo solicitado en la IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, Sección I, Instrucciones Generales a los Oferentes.

El Oferente: **PRODEL, S.A. DE C.V.**, presenta en Sobre N° 1 la documentación foliada en orden correlativo y sellada, en Sobre N° 2 esta foliada en orden correlativo y sellada, sin embargo **NO están firmados los folios 22 al 25**. La IGO 10 dice: "Todas las hojas contenidas en el Sobre N° 2, deben presentarse impresas, selladas, firmadas por el Oferente, Representante o Apoderado Legal y foliadas al frente en orden correlativo, en números arábigos iniciando con 1". La Comisión de evaluación de Ofertas determinó descalificar al oferente **PRODEL, S.A. DE C.V.**, conforme a la cláusula IGO 23.5, p) que establece: Durante el proceso de evaluación, se descalificará cualquier oferta en los siguientes casos: *Literal p) Si el Oferente no presenta su oferta económica (Sobre N° 2) impresa con todas sus páginas completamente foliadas, selladas y firmadas, conforme a lo requerido en la cláusula IGO 10.*

El oferente **PRODEL, S.A. DE C.V** no se continuó evaluando en las siguientes etapas.

Las ofertas presentadas por los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.** y **MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; están foliadas en orden correlativo y selladas (Sobre N° 1) y foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas (Sobre N° 2) por el Oferente, Representante o Apoderado Legal, por lo que se continuó evaluando en las siguientes etapas.

I. REQUISITOS LEGALES Y OTROS (CUMPLE/NO CUMPLE)

La Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento de las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso:

a) Cumplimiento de presentación de las solvencias vigentes solicitadas en la IGO 10

Determinándose que el Oferente: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.** y **MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; cumplen con la presentación y vigencia de todas las solvencias requeridas, conforme a la cláusula IGO 10 Documentos que componen la oferta.

El detalle de la verificación de los requisitos legales y otros, se muestra en cuadro anexo y forma parte integral del acta.

❖ Referente al requisito de las IGO 2 Oferentes con capacidad para contratar y la IGO 3 Oferentes impedidos para ofertar.

b) No estar afectados o involucrados en prohibiciones legales o inhabilitación de acuerdo a las Instrucciones Generales a los Oferentes, IGO 2 y 3 y la LACAP.

c) Estar registrado de acuerdo a lo solicitado en la IGO 2.1 de las bases variables del proceso.

De acuerdo a la información presentada por los Oferentes, en el formulario 2 "Acta Notarial de Aceptación Plena y Compromiso", la Comisión de Evaluación de Ofertas revisó que los Oferentes: **MATERIALES,**



Página 3 de 10
FO-A.5.1.2.2-4-3
[Handwritten signatures]

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V., no estuviesen afectados o involucrados en prohibiciones legales o inhabilitación de acuerdo a las Instrucciones Generales a los Oferentes, Cláusula 2 y 3 y la LACAP; asimismo se verificó en la base de datos del Banco de Contratistas del FISDL que estuviesen calificados en el Banco de Contratistas del FISDL, como: **REALIZADOR**, Especialidad en **INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**, Categoría 4 o 5, Nivel de desempeño **A, B o C**, según la cláusula **IGO 2** de las Bases de Licitación Pública. **Los Oferentes cumplen con este requisito.**

Se concluye que los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, se encuentran capacitados para contratar y continúan con la siguiente etapa de evaluación.

Se anexa reporte de calificación del Sistema del Banco de Contratistas del FISDL, y reportes de Contratistas Inhabilitados e Incapacitados publicados en el sitio web de Comprasal, que forma parte integral de esta acta.

❖ **Referente a la visita de inspección al lugar de la obra y sus alrededores de carácter obligatorio (Requisito de la cláusula IGO 5 Visitas al lugar de la obra):**

- d) Haber realizado la visita de inspección al lugar de la obra y sus alrededores de carácter obligatoria.

La Comisión de Evaluación de Ofertas constató mediante **ACTA DE VISITA DE CAMPO AL PROYECTO**, que los Oferentes participantes en esta Licitación Pública: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, realizaron la visita obligatoria al lugar de la obra y sus alrededores en **fecha 10 de septiembre de 2018. Cumplen con este requisito.**

El detalle de los participantes a la visita de campo se muestra en anexo y forma parte integral de esta acta.

- e) De acuerdo al **Formulario 6** presentado por los Oferentes, la Comisión de Evaluación de Ofertas, verificó si los Oferentes no tienen adjudicados, contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados), simultáneamente tres (3) proyectos para personas jurídicas y dos (2) proyectos para personas naturales, incluyendo todas las categorías y tipos de proyectos. Este criterio no se aplica para proyectos que posean 90% o más de avance físico en su ejecución.

Se hace constar, según información presentada en el **formulario 6**, que los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; no tiene adjudicados, contratados y/o en ejecución en forma simultánea tres (3) proyectos. **Cumple con este requisito.**

Asimismo se hace constar que se verificó en el Sistema del Banco de Contratistas (proyectos asignados), los proyectos adjudicados, contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados), simultáneamente del Oferente: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; determinándose que **NO poseen tres (3) proyectos asignados.**

Se anexa reporte del Sistema del Banco de Contratistas del FISDL, de proyectos de los Oferentes, que forma parte integral de esta acta.

De acuerdo a la información presentada, en el **Formulario 7**, por los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**; se establece que **NO** presentan contratos extinguidos por causas imputables al Oferente en los últimos 5 años, ni tampoco litigios pendientes.

❖ **Referente al examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables. Cláusula IGO 23 (Se anexa cuadro de revisión preliminar de ofertas que forma parte integral de esta acta):**

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a revisar la documentación solicitada en la cláusula **IGO 10 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA**, de las Bases de esta Licitación Pública.



Página 4 de 10
FO-A.5.1.2.2-4-3

[Handwritten signatures and initials]

0000619

MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.

No presentan observaciones.

Por lo anterior la oferta presentada por los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, continúan evaluándose en las siguientes etapas.

❖ Referente a los criterios de Calificación y de Evaluación (Sección III de las Bases de Licitación Pública):

A continuación se procedió a verificar que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la cláusula **IGO 24 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS** y en la **SECCIÓN III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN**.

II. FINANCIEROS (CUMPLE/NO CUMPLE)

De acuerdo a la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, la evaluación financiera se realizó, calculando y calificando los dos índices siguientes, establecidos en las bases de Licitación Pública:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	MAP Y CT OBTENIDOS PARA ESTE PROYECTO	OFERENTES	
		MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
a) Facturación Anual Facturación Anual del Oferente, de acuerdo a los Ingresos Brutos plasmados en los Estados Financieros, deberán ser igual o mayor al MAP (Monto Anualizado del Proyecto) obtenido para este proyecto.	MAP	FA	FA
	\$487,470.22	\$2,326,302.37	\$503,246.93
	FA del Oferente >= MAP	CUMPLE	CUMPLE
b) Capital de Trabajo Activo Líquido (Activo Corriente menos Pasivo Corriente), de las cifras del Balance General del Oferente, deberá ser igual o mayor al Capital de trabajo obtenido para este proyecto.	CT	CT	CT
	\$54,163.36	\$263,998.07	\$152,765.75
	CT del Oferente >= CT del proyecto	CUMPLE	CUMPLE

Los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, cumplen con los criterios de la evaluación financiera y continuaron con la siguiente etapa de evaluación.

El resultado y detalle de la Evaluación Financiera se muestra en el cuadro anexo y forma parte integral del acta.

II. PERSONAL PROPUESTO

Sobre la base de la **SECCIÓN III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN**, que dice: "Las obras a considerar serán aquellas cuyo monto sea superior al mínimo especificado para precalificar en la categoría de contratistas requerida para este proceso, de acuerdo con las Instrucciones Específicas IGO 10". Queda entendido que las obras a ser consideradas en la evaluación de la experiencia del personal propuesto, serán los de similar naturaleza y complejidad al proyecto objeto de la presente Licitación Pública; de acuerdo con la Sección VI Instrucciones Específicas a los Oferentes IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, de las bases de ésta.

La especialidad de proyecto a evaluar para el personal propuesto será:
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA:



Handwritten signatures and stamps. Includes a stamp: "Página 5 de 10 FO-A.5.1.2.2-4-3" and a large handwritten mark resembling 'S' or 'SS'.

Construcción o ampliación de líneas eléctricas de sub-transmisión en primario y/o secundario; alumbrado público; subestaciones; y todo lo relacionado con Infraestructura Eléctrica, canalización de líneas de telefonía y/o transmisión de datos, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos alternativos.

Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente serán las relacionadas a infraestructura evaluada.

Monto mínimo de los proyectos a evaluar para los Oferentes será de: **NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$95,000.00)** monto correspondiente a la Ejecución.

Los Oferentes deben incluir dentro del personal propuesto para la ejecución del proyecto profesionales graduados, de acuerdo a lo establecido en este criterio:

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	OFERENTE	OFERENTE
	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
RESIDENTE DEL PROYECTO:	MARIO ALEX MATA MAGAÑA	JOSE ROLANDO MONTERROSA BARAHONA
Profesional graduado en Ingeniería Eléctrica. Con experiencia como Gerente de Proyecto y/o Residente de Proyecto, en proyectos de Realizador (construcción de la obra / ejecución de la obra) de similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años	CUMPLE	CUMPLE
Número de visitas requeridas 5.5 Visitas a la semana de 8 H C/U	CUMPLE	CUMPLE





Con relación al personal asignado al proyecto, y dando cumplimiento al requisito de que el personal propuesto en su Oferta Técnica: Gerente del Proyecto y Residente de Proyecto está asignado a cualquiera de los otros proyectos que actualmente tiene adjudicados (centralizados), contratados y/o en ejecución (centralizada y descentralizada). Este motivo de descalificación no se aplica para proyectos en ejecución que posean 90% o más de avance físico, esto a la fecha de recepción de ofertas.

los Oferentes evaluados: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, cumplen con este requisito, ya que según información presentada en el formulario 6, el personal propuesto Residente de Proyecto, en su respectiva oferta no está asignado a ningún otro proyecto. Este motivo de descalificación no aplica para proyectos que posean 90% o más de avance físico en su ejecución, esto a la fecha de la recepción de ofertas. Por lo cual continuaron con el proceso de evaluación de ofertas.

III. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió con la Evaluación Técnica de los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, obteniéndose el siguiente resultado:






 Página 6 de 10
 FO-A.5.1.2.2-4-3


0000620

		OFERENTE	OFERENTE
Monto asignado para este proyecto:	\$216,655.43	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
A. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES		PUNTOS	
		20.00	20.00
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto mayor al 80% del monto asignado para este proyecto.		20.00	
		PROYECTO 1	PROYECTO 1
		\$ 572,820.35	\$ 199,999.00
		PROYECTO 2	PROYECTO 2
		\$ 455,232.12	\$ 180,000.00
Mayor a: \$173,324.34		20.00	20.00
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto igual o mayor al 60% y menor o igual al 80% del monto asignado para este proyecto.		10.00	
		-	-
Mayor o igual a: \$129,993.26			
Menor o igual a: \$173,324.34			
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto menor al 60% del monto asignado para este proyecto		5.00	
		-	-
Menor a: \$129,993.26			

B. PUNTAJE TÉCNICO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	PUNTAJE MÍNIMO	PUNTAJE MÁXIMO	OFERENTE	OFERENTE
	30	40	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
Residente del proyecto			40	40
TOTAL DE PUNTAJE TÉCNICO			40	40
C. NIVEL DE DESEMPEÑO BANCO DE CONTRATISTAS FISDL	PUNTAJE MÍNIMO	PUNTAJE MÁXIMO		
	2	10	10	10
PUNTAJE TÉCNICO TOTAL (A+B+C)			70	70

IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a realizar la evaluación económica de acuerdo al siguiente criterio:

CRITERIO	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
(Oferta económica más baja de las ofertas favorables / Oferta que se evalúa) x 30	(215,302.59/215,302.59)*30	(215,302.59/215,511.56)*30
	30.00	29.97

La Comisión de Evaluación de Ofertas constató que el procedimiento seguido para evaluación de este proceso, es el establecido en las bases de esta Licitación Pública, y que responden a la Política Institucional y sobre la base de las cuales se hacen las recomendaciones establecidas en esta acta.



Los Oferentes: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, cumplen con los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación Pública, en los siguientes aspectos: Requisitos Legales y Otros y Personal Propuesto; y obtuvo como resultado de la Evaluación de los Criterios Técnicos y Económicos la puntuación que se detalla en el siguiente cuadro:

OFERENTE	PUNTAJE TÉCNICO Y ECONÓMICO				PUNTAJE FINAL	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO EVALUADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO	NIVEL DE DESEMPEÑO BANCO DE CONTRATISTA	ECONÓMICA					
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	20.00	40.00	10.00	30.00	100.00	\$215,302.59	\$215,302.59	\$216,655.43	-0.62%
MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.	20.00	40.00	10.00	29.97	99.97	\$215,511.56	\$215,511.56		-0.53%
PRODEL, S.A. DE C.V.	-----	-----	-----	-----	-----	\$211,216.70	-----		-2.51%
ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	-----	-----	-----	-----	-----	\$209,875.18	-----		-3.13%

❖ **CONCLUSIONES:**

Después de haber analizado toda la documentación, la oferta técnica y económica, la Comisión de Evaluación de Ofertas presenta la siguiente conclusión:

Sobre la base de lo indicado en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, que dice: “La Comisión de Evaluación de Ofertas recomendará la adjudicación de la Licitación Pública, al Oferente cuya oferta cumpla con los requisitos establecidos en los Romanos I y II y que OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE (A+B+C+D), respecto a las demás ofertas evaluadas, resultante de la suma de los criterios técnicos y económicos (Romanos III y IV). De acuerdo a lo establecido en la Cláusula IGO 26 se concluye:

Que la oferta presentada por el Oferente: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. y MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.**, cumplen con los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación Pública, en los siguientes aspectos: Requisitos Legales y Otros y Personal; y la oferta **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V** obtuvo el mayor puntaje respecto a las demás ofertas evaluadas, dando como resultado un puntaje total de **100** de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO:

ORDEN DE MERITO	OFERENTE	PUNTAJE TÉCNICO Y ECONÓMICO				PUNTAJE FINAL	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO EVALUADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL	OBSERVACIONES
		EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO	NIVEL DE DESEMPEÑO BANCO DE CONTRATISTA	ECONÓMICA						
1	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	20.00	40.00	10.00	30.00	100.00	\$215,302.59	\$215,302.59	\$216,655.43	-0.62%	A ADJUDICAR
2	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.	20.00	40.00	10.00	29.97	99.97	\$215,511.56	\$215,511.56		-0.53%	FAVORABLE
---	PRODEL, S.A. DE C.V.	-----	-----	-----	-----	-----	\$211,216.70	-----		-2.51%	DESCALIFICADA
---	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	-----	-----	-----	-----	-----	\$209,875.18	-----		-3.13%	DESCALIFICADA



Página 8 de 10
FO-A.5.1.2.2-4-3

[Handwritten signatures and initials]


OFERENTE	OBSERVACIÓN	BASE LEGAL
ROMAD, S.A. DE C.V.	<p>Como resultado de la aplicación de la fórmula estadística, el monto de la oferta económica presentada y corregida (\$209,875.18) por el Oferente ROMAD, S.A. DE C.V., está abajo del parámetro de medición calculado para esta Licitación Pública (\$211,052.22) (obtenido de Restarle a la MEDIA ARITMÉTICA de todas las ofertas presentadas incluyendo la asignación presupuestaria, la DESVIACIÓN ESTÁNDAR de éstas), de acuerdo a lo establecido en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, Aplicación de Fórmula Estadística, numeral 4) "Obtenido el valor de la referida resta, se procederá a descalificar y ya no se continuaran evaluando aquellas ofertas, cuyos montos sean menores al valor de restar a la media aritmética el valor de la desviación estándar" (incluye todas las ofertas presentadas y la asignación presupuestaria).</p> <p>Por lo anterior la Comisión de Evaluación de Ofertas acordó descalificar la oferta presentada por el Oferente ROMAD, S.A. DE C.V.; y ya no se continuó evaluando en las siguientes etapas.</p>	<p>Conforme a lo establecido en la cláusula IGO 23.5 Durante el proceso de evaluación, se descalificará cualquier oferta en los siguientes casos:</p> <p>Literal u) Si el monto ofertado es menor al resultado de aplicar la fórmula estadística, indicada en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación.</p>
PRODEL, S.A. DE C.V.	<p>presenta en Sobre N° 1 la documentación foliada en orden correlativo y sellada, en Sobre N° 2 esta foliada en orden correlativo y sellada, sin embargo NO están firmados los folios 22 al 25. La IGO 10 dice "<u>Todas las hojas contenidas en el Sobre N° 2, deben presentarse impresas, selladas, firmadas por el Oferente, Representante o Apoderado Legal y foliadas al frente en orden correlativo, en números arábigos iniciando con 1°.</u>"</p>	<p>Conforme a lo establecido en la cláusula IGO 23.5 Durante el proceso de evaluación, se descalificará cualquier oferta en los siguientes casos:</p> <p>Literal p)</p> <p>Si el Oferente no presenta su oferta económica (Sobre N° 2) impresa con todas sus páginas completamente foliadas, selladas y firmadas, conforme a lo requerido en la cláusula IGO 10.</p>


RECOMENDACIONES:


Por lo tanto la Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda la **ADJUDICACIÓN** de la LICITACION PUBLICA N° 59/2018-85EGRAL-96-FISDL "SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN" CÓDIGO 346680., al Oferente: **MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, por un monto total de **DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$215,302.59)**, IVA incluido, con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) días calendario** a partir de la orden de inicio.

No habiendo más que hacer constar, firmamos la presente acta que consta de diez páginas, a las diez horas con treinta minutos del día dos de octubre del año dos mil dieciocho.


 Wladimir Salazar Del Cid
 Representante de la Unidad Solicitante


 Víctor Edgardo Rebollo Melara
 Experto en la Materia


 Edith Guadalupe Andrade Argueta
 Analista Financiera


 Sandra Margarita Méndez de Alvarado
 Delegada del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

0000622


**DECLARACION JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

LICITACION PUBLICA N° 59/2018-85EGRAL-96-FISDL

“SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN” CÓDIGO 346680

Nosotros:

1. Wladimir Salazar Del Cid
2. Víctor Edgardo Rebollo Melara
3. Edith Guadalupe Andrade Argueta
4. Sandra Margarita Méndez de Alvarado

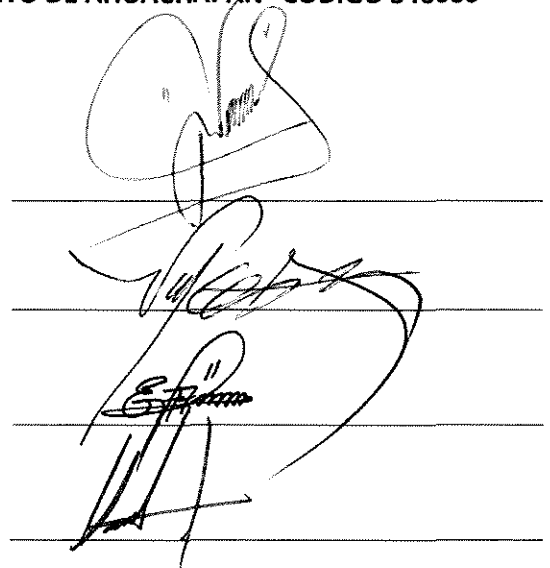

Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, declaramos bajo juramento que:

A. ----- Sí existe conflicto de intereses interno con los participantes de este proceso, el cual se detalla de la siguiente manera:

(En este espacio colocar el (los) nombres del (de los) contratista(s) y el grado de parentesco que existe con el empleado).

B. X no existe conflicto de intereses con los participantes de este proceso y así mismo declaramos bajo juramento que lo aquí expresado es verdad.

En el caso de existir conflicto de intereses entre uno o más ofertantes y uno o varios miembros de la referida Comisión, estos últimos se sustituyen por:

Antiguo Cuscatlán, 25 de septiembre de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA N° 59/2018-8SEGRAL-96-FISDL

"SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRÉS, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN". CÓDIGO 346680


SOBRE N° 2	OFERENTE	OFERENTE	OFERENTE	OFERENTE
OFERTA ECONÓMICA	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PRODEL, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO ESTABLECIDO	\$216,655.43			
Las hojas contenidas en el SOBRE N° 2, estén impresas, foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas por el oferente Representante o Apoderado Legal. CUMPLE/NO CUMPLE	SI	NO	SI	SI
Oferta Económica presentada (Formulario 7)	\$215,302.59	\$211,216.70	\$209,875.18	\$215,511.56
Oferta Económica corregida	\$215,302.59	\$211,216.70	\$209,875.18	\$215,511.56
Diferencia entre oferta presentada y corregida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Oferta Económica corregida menor al 80% del presupuesto oficial (\$216,655.43*0.80) \$173,324.34	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Programa de Trabajo para la ejecución de las obras (Diagrama de GANTT) 120 días	SI	----	----	SI
Justificación de Anticipo (Formulario 8)	SI	----	----	SI
Monto del Anticipo. Los anticipos no excederán los siguientes valores: 30% del Precio del Contrato.	\$64,590.78	----	----	\$64,653.47
Porcentaje de Anticipo. Los anticipos no excederán los siguientes valores: 30% del Precio del Contrato.	30%	----	----	30%
Medio óptico (CD o DVD) conteniendo el archivo digital de la oferta económica y el programa de trabajo.	SI	----	----	SI
VARIACIÓN PORCENTUAL	-0.62%	-2.51%	-3.13%	-0.53%

OBSERVACIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 59/2018-85EGRAL-96-FISDL
"SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN". CÓDIGO 346680

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA ESTADÍSTICA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL	\$216,655.43	RESULTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$209,875.18	OFERTA DESCALIFICADA	-3.13%
PRODEL, S.A. DE C.V.	\$211,216.70	OFERTA ACEPTADA	-2.51%
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$215,302.59	OFERTA ACEPTADA	-0.62%
MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$215,511.56	OFERTA ACEPTADA	-0.53%
MEDIA ARITMÉTICA (De todas las ofertas presentadas y la asignación presupuestaria FISDL)	\$213,712.29		
DESVIACIÓN ESTANDAR DE LA POBLACIÓN (TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL)	\$2,660.07		
PARÁMETRO DE MEDICIÓN (Resta del MEDIA ARITMÉTICA menos DESVIACIÓN ESTÁNDAR)	\$211,052.22		



LICITACIÓN PÚBLICA N° 59/2018-8SEGRAL-96-FISDL
"SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO,
PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE
AHUACHAPAN". CÓDIGO 346680

SOBRE N° 2		OFERENTE	OFERENTE	OFERENTE	OFERENTE
OFERTA TÉCNICA		MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PRODEL, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
13	Asignación de Personal (Formulario 3)	SI	----	----	SI
	Hoja de Vida del Gerente del Proyecto (Formulario 4)	SI	----	----	SI
	RESIDENTE DEL PROYECTO:	MARIO ALEX MATA MAGAÑA	----	----	JOSE ROLANDO MONTERROSA BARAHONA
	Profesional graduado en Ingeniería Eléctrica. Con experiencia como Gerente de Proyecto y/o Residente de Proyecto, en proyectos de Realizador (construcción de la obra / ejecución de la obra) de similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años	SI	----	----	SI
	Carta de Compromiso del Residente de Proyecto: (Formulario 5)	SI	----	----	SI
	Numero de visitas requeridas 5.5 Visitas a la semana de 8 H C/U	SI	----	----	SI
12	Proyectos en Ejecución (Formulario 6).	SI	----	----	SI
13	El personal propuesto (Residente de Proyecto) es el mismo asignado a cualquiera de los proyectos que actualmente tiene adjudicados (Centralizados), contratados o en ejecución, (Centralizados y Descentralizados) según Formulario 6. Este motivo de descalificación no aplica para proyectos que posean 90% o más de avance físico en su ejecución, a la fecha de la recepción de ofertas.	NO	----	----	NO
14	Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario no tener incumplimientos contractuales ni litigios pendientes (Formulario 7).	SI	----	----	SI
15	Experiencia del Oferente (Formulario 9)	SI	----	----	SI

La Especialidad de proyecto a evaluar para el personal propuesto será:

ESPECIALIDAD: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA:

Construcción o ampliación de líneas eléctricas de sub-transmisión en primario y/o secundario; alumbrado público; subestaciones; y todo lo relacionado con Infraestructura Eléctrica, canalización de líneas de telefonía y/o transmisión de datos, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos alternativos.

Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente serán las relacionadas a infraestructura evaluada.

Monto mínimo de los proyectos a evaluar será: \$95,000.00

CRITERIO DE EVALUACIÓN: SI PROPONE ; NO PROPONE



LICITACIÓN PÚBLICA N° 59/2018-8SEGRAL-96-FISDL

“SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN”. CÓDIGO 346680

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		OFERENTE	OFERENTE
1. EVALUACIÓN FINANCIERA	CUMPLE NO CUMPLE	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
1.1.) Facturación Anual: El valor obtenido MAP o Monto Anualizado del Proyecto, será el valor de la Facturación anual, de acuerdo a los ingresos Brutos plasmados en los Estados Financieros, que un oferente deberá cumplir o superar para ser considerado elegible de adjudicación.		CUMPLE	CUMPLE
1.2.) Capital de Trabajo: El valor obtenido para el Capital de Trabajo, será el valor en Activos Líquidos (Activo Corriente menos Pasivo Corriente) que será obtenido de las cifras del Balance General y que un oferente deberá cumplir o superar para ser considerado elegible de adjudicación.		CUMPLE	CUMPLE

2. EVALUACIÓN TÉCNICA 70%		PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE MÍNIMO	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A. DE C.V.
1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES		20.00	5.00	20.00	20.00
Monto asignado para este proyecto:		216,655.43			
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto mayor al 80% del monto asignado para este proyecto.	Mayor a:	20.00		PROYECTO 1	PROYECTO 1
				173,324.34	572,820.35
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto igual o mayor al 60% y menor o igual al 80% del monto asignado para este proyecto.	Mayor o igual a:	10.00		PROYECTO 2	PROYECTO 2
				129,993.26	455,232.12
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto menor al 60% del monto asignado para este proyecto	Menor o igual a:	5.00			
				173,324.34	20.00
1.2. PUNTAJE TÉCNICA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO		40.00	30.00	40.00	40.00
RESIDENTE DEL PROYECTO				40.00	40.00
No cumple con ningún proyecto		-		-	-
Cumple con 1 proyecto		20.00		-	-
Cumple con 2 proyecto		30.00		-	-
Cumple con 3 proyectos o más.		40.00		40.00	40.00
1.3. NIVEL DE DESEMPEÑO (BANCO DE CONTRATISTAS)		10.00	2.00	10.00	10.00
Calificación en nivel de desempeño "A"		10.00		10.00	10.00
Calificación en nivel de desempeño "B"		5.00		-	-
Calificación en nivel de desempeño "C"		2.00		-	-
PUNTAJE TÉCNICO TOTAL		70.00	37.00	70.00	70.00
EVALUACIÓN ECONÓMICA 30%					
(Oferta económica más baja de las ofertas favorables / Oferta que se evalúa) x 30		30.00	N/A	30.00	29.97
PUNTAJE TOTAL		100.00		100.00	99.97
ORDEN DE MÉRITO				1	1

OBSERVACIONES:

Fondo de Inversión Social Para el Desarrollo Local
LICITACIÓN PÚBLICA N° 59/2018-85EGRAL-96-FISDL

0000627

"SELECCIÓN DE REALIZADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE CÓDIGO 346680

Cuadro de Verificación de Requisitos Financieros

DESCRIPCIÓN	E.F. Presentados	MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V	MONTAJES ELECTRICOS CIVILES, S.A DE C.V
A) Documentación General (IGO 10)		1	4
10 Presentar los Estados Financieros correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre del año anterior depositados en el Registro de Comercio con dictamen del Auditor Externo. La acreditación del depósito en el Registro de Comercio se realizará mediante cualquiera de las condiciones siguientes: a) Estados Financieros originales, en los cuales corre agregada la resolución o auto de depósito del Registro de Comercio, o b) Certificación Literal de los Estados Financieros depositados, la cual es expedida por el Registro de Comercio. c) Copias notariadas de los Estados Financieros, con dictamen del Auditor Externo. Las ofertas que sean presentadas en los primeros cinco meses del año cuyos estados financieros aún no han sido depositados en el Registro de Comercio, deberán ser los correspondientes al 31 de diciembre del año anterior al establecido en el primer párrafo. El Oferente deberá anexar a los Estados Financieros, las notas que soportan las cifras comparativas con el periodo anterior, la opinión del auditor externo e incluir el estado de cambios en el patrimonio. En los casos de socio, cada entidad deberá presentar sus estados financieros depositados en el Registro de Comercio o institución fiscalizadora del estado aplicable, y adicionalmente deberá presentar los estados financieros combinados o consolidados (en lo aplicable) de conformidad a la Normas de Contabilidad generalmente aceptadas en El Salvador. Dichos estados deberán venir acompañados del dictamen de un auditor externo con sus notas de la combinación o consolidación, en adición a la hoja de trabajo de los estados financieros con las referencias de las partidas de eliminación o compensación respectivas. No se requerirá dictamen del Auditor Externo, para las personas naturales de conformidad a lo que establece el Código de Comercio en su art. 474 (cuando aplique). Para las entidades que no estén obligadas a presentar los Estados Financieros al Registro de Comercio, deberán acreditar su presentación ante la autoridad competente.	Registrado		
	E. F.	SI	SI
	Notas a E.F.	SI	SI
	Opinión Auditor	SI	SI
1- Monto asignado al proyecto	216,653.43		
2- Monto mensualizado del proyecto (MMP) = Monto asignado al proyecto/Plazo de ejecución de las obras	MMP	54,163.36	54,163.36
3- Monto Anualizado del Proyecto (MAP) = MMP*12meses*FFA	MAP	487,470.22	487,470.22
4- Capital de Trabajo del Oferente = Activo Corriente - Pasivo Corriente	CT	263,998.07	152,765.75
5- Capital de Trabajo del Proyecto = MMP*FCT	MMP*FCT	54,163.36	54,163.36
6- Plazo de Ejecución de la Obra: 120 días = 4 meses	4		
7- Factor para calcular la facturación media anual (FFA) y Factor para calcular el Capital de Trabajo (FCT)			
Monto asignado al proyecto por FISDL	Plazo de ejecución de las obras establecidas POR FISDL	Factor para calcular la facturación media anual (FFA)	Factor para calcular el Capital de Trabajo (FCT)
Monto variable	0-3 meses	0.50	1
Monto variable	3-6 meses	0.75	
Monto variable	mayor de 6 meses	1.25	
B) MONTO OFERTADO: según Acta de Apertura		\$ 215,302.59	\$ 215,511.56
C) CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN			
1- Facturación Anual	Ingresos Brutos > ó = a MAP	CUMPLE	CUMPLE
2- Capital de Trabajo	> ó = a MMP*FCT	CUMPLE	CUMPLE
D) OBSERVACIONES			
E) CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES			
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		\$ 164,754.63	\$ 19,121.03
CUENTAS POR COBRAR		\$ 216,038.53	\$ 118,557.30
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
PRESTAMOS Y ANTICIPO A EMPLEADOS			\$ 500.00
CUENTAS P/COBRAR - (sin accionistas ni empleados)			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			\$ 6,315.04
DEPOSITOS EN GARANTÍA		\$ 1,073.60	\$ 1,120.00
CREDITO FISCAL		\$ 1,954.38	\$ 2,900.10
PARTES RELACIONADAS		\$ 1.33	
INVENTARIOS			\$ 97,003.65
OBRAS EN PROCESO			\$ 34,713.66
INVERSIONES			
PAGO A CUENTA			\$ 9,802.64

[Handwritten signatures and initials]

Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V

NIT: 02102203991015

0000629

Código	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
107070	REPARACION DE CALLE CASERIO EL COCALITO	\$53,279.43	HMD	730	R/107070	\$53,279.27	DES IV
114840	ELECTRIFICACION EN CASERIO VALLE NUEVO	\$12,578.13	ENA	730	R/114840	\$12,578.13	DES IE
118090	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CANTON LA UNION	\$20,863.66	HMD	730	R/118090	\$20,863.66	DES IE
121020	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SILLON	\$27,331.43	JEMH	730	R/121020	\$27,331.43	DES IE
126970	REPAR. Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	\$29,371.31	HMD	730	R/126970	\$29,371.31	DES IV
148400	INFRAESTRUCTURA CENTRO ESCOLAR CANTON LLANO GRANDE	\$32,330.35	DPT	730	R/148400	\$32,330.35	DES E
149470	REP. Y CONCRETEADO CALLES AV. DEPORTIVA, CTON. EL PARAISO Y TECOLUCO	\$82,640.00	DPT	635	R/149470	\$82,640.05	DES IV
149810	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$31,419.37	RAAP	730	R/149810	\$31,419.37	DES IH
154100	EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CAS TEXIS JUNCT	\$19,605.84	JEMH	730	R/154100	\$19,605.84	DES CR
8210	CONCRETEADO DE AVENIDA MANUEL JOSE ARCE Y PASAJE EL NIÑO	\$10,797.88	RAAP	635	R/158210	\$10,797.88	DES CR
189550	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO ESCOLAR CANTON LAS PILAS	\$12,575.51	DPT	730	R/18955.0-2007	\$12,575.51	CEN E
191930	CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE A CRIÓ. EL VOLCANITO	\$42,061.98	CEVC	730	R/191930	\$41,412.66	DES IV
194051	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON SICAHUITE	\$111,718.10	DPT	730	R/194051	\$111,709.71	DES IH
197380	EMPEDRADO FRAGUADO CON SUP TERMINADA EN CRIÓ LOS PLANES	\$103,869.31	DPT	730	R/197380	\$103,869.31	DES IV
197700	COLECTOR PARA EL DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS EN AREA URBANA GUALOCOCTI	\$119,200.96	JLFA	730	R/197700	\$119,200.96	DES IH
205891	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PORTILLO	\$102,546.33	DPT	730	R/205891	\$102,546.33	DES E
208050	ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICO EN CASERIOS DE JUJUTLA	\$75,399.46	JACC	730	R/20805.0-2010	\$75,399.46	CEN IE
212780	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ZARCERA	\$14,909.00	REAM	730	R/212780	\$14,909.00	DES IH
214331	MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERÍO LOMA DEL CEMENTERIO, CANTÓN SAN ISIDRO	\$294,952.17	CIRDG	730	R/21433.1-2011	\$294,952.17	CEN IV
217070	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CEIBA	\$63,026.03	DPT	730	R/217070	\$63,026.03	DES E
217410	APERTURA DE LA CALLE AL CASERIO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	\$50,000.00	DPT	730	R/217410	\$50,000.00	DES IV
236480	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLES URBANAS DE SAN JOSÉ GUAYABAL	\$178,952.74	CAGV	730	R/236480	\$178,952.74	DES IV
236640	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR HÉROES DE CHAPULTEPEC	\$111,966.15	RAVM	730	R/236640	\$111,966.15	DES E
242920	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS Y COLONIA SAN ANTONIO	\$136,182.89	CBSR	730	R/242920	\$136,182.89	DES IE
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	\$391,107.11	JVGC	735	R/25585.1-2013	\$391,107.11	CEN E
255890	CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL, CASERÍO LOMAS DEL FRÍO.	\$21,192.06	MLDLA RZ	730	R/255890	\$21,192.06	DES IV
255900	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO COMUNIDAD EL MILAGRO, CASERÍO EL MILAGRO, CANTÓN LAS DELICIAS.	\$31,680.59	MLDLA RZ	730	R/255900	\$31,680.59	DES IV
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$6182,912.81	

Usuario:
nmenjivar


TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO

Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V

NIT: 02102203991015

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
259880	MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LA ANGOSTURA, CANTÓN EL CHAGUITE	\$49,318.01	NAVS	730	R/259880	\$56,538.44	DES IV
265230	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: LOS MANGOS, CASCO LA HACIENDA Y EL TANQUE DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO	\$394,332.44	JNPDL	730	R/265230	\$433,742.47	DES IH
265250	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: EL ZAPOTE, EL CAMPO Y LA AJONJOLINERA DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO	\$383,805.63	JNPDL	730	R/265250	\$486,395.87	DES IH
267970	REHABILITACIÓN DE 3.4 KILÓMETROS DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL SALITRE	\$196,997.79	AEFA	730	R/267970	\$196,997.79	DES IV
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	\$293,037.13	CAGV	735	R/26823.0-2013	\$293,037.13	CEN E
293240	ETAPA II, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CALLE A CANTÓN EL CARACOL. (SECTOR PLAZA Y ESCUELA)	\$25,084.97	JMSR	730	R/293240	\$25,084.97	DES IV
293320	CONCRETEADO TRAMO DE CALLE CAS. Y CAN. LOS ALFARO; CAN. LOS LAURELES, CONTINUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CONCRETEADO EN: CALLE CAS. SAN JOSÉ CAPULATASTE; CALLE PPAL. CAN. ESPERANZA DEL CENTRO A LA IGLESIA Y CUESTA DEL CAN ESPERANZA AL CAN. CRUZ	\$81,725.60	MLAD	730	R/293320	\$81,725.60	DES IV
293440	MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN EL CANTÓN SAN FRANCISCO ECHEVERRÍA.	\$30,283.52	JMSR	730	R/293440	\$30,283.52	DES IV
295681	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	\$270,618.33	JCRM	730	R/29568.1-2016	\$270,618.33	CEN E
295701	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	\$187,274.71	OMGB	735	R/29570.1-2017	\$187,274.71	CEN E
297770	ADOQUINADO DE CALLE SAN ANTONIO ABAD LOS INDIOS	\$271,009.80	VERM	730	R/297770	\$271,009.80	DES IV
299160	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS PERAZA	\$73,150.78	CRLA	730	R/299160	\$73,150.78	DES IH
309650	MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.	\$18,240.50	RABC	730	R/309650	\$18,240.50	DES IV
309850	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA	\$180,853.01	RECC	730	R/309850	\$180,853.01	DES IE
313921	INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE	\$109,828.81	MLAD	735	R/31392.1-2017	\$109,828.81	CEN IH
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	\$73,356.18	RMCA	735	R/32012.0-2016	\$73,356.18	CEN E
337880	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES ZONAS DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS	\$40,620.65	WSC	730	R/337880	\$40,620.65	DES IE
337900	PAVIMENTACIÓN TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS DE CALLES DE CANTÓN SANTA CRUZ, CANTÓN EL TABLÓN Y CANTÓN VIRGINIA	\$158,452.28	OMGB	635	R/337900	\$158,452.28	DES IV
340220	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO DE SAN LUIS TALPA	\$365,777.82	REAM	730	R/340220	\$365,777.82	DES E
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$6182,912.81	

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
340270	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN ABAJO Y EL CENTRO DEL CANTÓN AGUA ZARCA.	\$82,996.69	RMDEV	630	R/34027.0-2017 <i>2017</i>	\$82,996.69	CEN IE
340700	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA PLAYA PIMENTAL, FASE II	\$349,799.48	OMGB	730	R/340700	\$349,799.48	DES E
342040	ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO.	\$216,228.01	JABR	630	R/342040	\$216,228.01	DES E
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$6182,912.81	
TOTALES PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$6182,912.81	

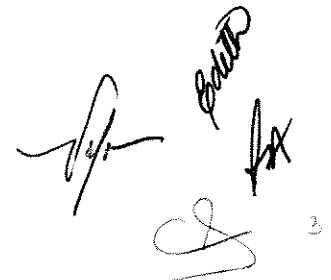

Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V


NIT: 02102203991015

Capacitado:

0000631

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	03/03/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	08/04/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON SUS DOCUMENTOS REQUERIDOS
B	05/02/2013	ACTUALIZADO DE ACUERDO A DOCUMENTOS REQUERIDOS.
B	24/11/2010	SE RESTABLECIO NIVEL POR ACTUALIZACION DE DATOS
I	09/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	19/08/2002	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

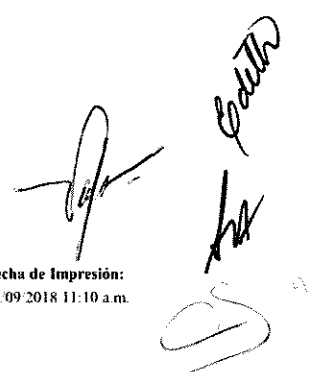

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: ANTIGUO BANCO	Sub Especialidad: ANTIGUO BANCO EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
10/01/2000	5	NUEVO INGRESO APROBADO C.T. DL-144/99 DEL18/NOVIEMBRE/99

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: CAMINOS RURALES	Sub Especialidad: CAMINOS RURALES

Fecha	Categoría	Observaciones
09/11/2007	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS

Fecha	Categoría	Observaciones
02/06/2008	4	MODIFICACION DE ESPECIALIDAD. SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DL-514/08 DEL 30/04/2008. VIGENTE DESDE 02/06/2008

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
09/11/2007	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
19/08/2002	3	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
19/08/2002	4	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
09/11/2007	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
19/08/2002	3	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
19/08/2002	3	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

proyecto
 Proyecto: 342040 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO
 Ubicación: [5] LA LIBERTAD [12] SAN JUAN OPICO [1] SAN JUAN OPICO Modalidad: DESCENTRALIZADA

contrato
 Numero contrato: R/342040
 Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V
 Fuente: 85-5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

Tipo contratista:	R			
Administrador contrato:	1824	JIMMY AMILCAR	BLANCO RODRIGUEZ	
Fecha de inicio:	10/09/2018		Estado contrato:	*
Fecha fin original:	07/02/2019		Plazo original:	150
Fecha fin actual:	07/02/2019		Prorrogas:	0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones:	0 [0]
Monto contratado:	\$216,228.01		Plazo actual:	150
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa:	0
Monto actual:	\$216,228.01		Dias en ejecución:	14
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables:	0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo:	\$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado:	\$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$216,228.01 [100.00 %]		Anticipo en proceso:	\$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$216,228.01 [100.00%]		Saldo anticipo:	\$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Porc. avance financiero:	0.00 %
			Porc. avance físico:	%

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Solicitado	Procesado	Pagado	Liquidado
1	D-1	\$216,228.01	20/12/17 3:30 pm	20/12/17 4:07 pm		

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
------	-------	-------	-------------	--------

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1824	JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ		

0000634

SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO

De: JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 06:53 p.m.
Para: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Asunto: RE: informacion de proyectos

Buenas tardes el avance del proyecto código 342040 realizado por la empresa MP Materiales, entechado de canchas de basquetbol ... San Juan Opico, es de 10% y el residente es el ing. Abel Martínez.

Saludos Cordiales.


De: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 10:33 a.m.
Para: JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ
Asunto: informacion de proyectos

Buenos días

Agradeceré me proporcione el avance físico a la fecha del proyecto código 342040 realizado por la empresa MP Materiales, entechado de canchas de basquetbol ... San Juan Opico, en el SGO indica un avance del 0.00%, por lo que necesito confirmar dicha información, así mismo me proporcione el nombre del Residente del Proyecto.

Cordiales saludos

Sandra Margarita Méndez de Alvarado
Técnico ACI
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

FISDL**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)**sistema de gestión de operaciones (sgo)
consulta detallada de proyectosPágina: 1 de 2
Fecha: 24/09/2018
Hora: 01:51:54p.m.**proyecto**

Proyecto: 340270 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN AB
 Ubicación: [9] CABAÑAS [4] GUACOTECTI [1] GUACOTECTI Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34027.0-2017
 Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V
 Fuente:
 85-5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1791	ROSEMARY	MELARA DE VALLECAMPOS
Fecha de inicio:	12/06/2017		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	11/08/2017		Plazo original: 60
Fecha fin actual:	10/10/2017		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 60 [1]
Monto contratado:	\$82,996.69		Plazo actual: 60
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Días en multa: 0
Monto actual:	\$82,996.69		Días en ejecución: 469
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Días no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$24,899.01 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$69,269.35 [83.46 %]		Anticipo en proceso: \$20,780.80 [83.46 %]
Estimado total:	\$69,269.35 [83.46%]		Saldo anticipo: \$24,899.01 [100.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$24,899.01 [30.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance físico: 99.99 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$24,899.01	06/06/17 2:09 pm	06/06/17 2:09 pm	08/06/17 12:17 pm	12/06/17 11:23 am
1	E-1	\$69,269.35	12/12/17 10:11 am	12/12/17 10:12 am	13/12/17 7:04 am	

Estimado a la Fecha: \$69,269.35**Información Garantías**

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$16,599.34	02/05/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$24,899.01	02/05/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$82,996.69	10/10/2017	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	12/06/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$82,966.69	08/01/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[3] GARANTIA DE BUENA OBRA	[1] FIANZA MERCANTIL	\$8,299.70	18/01/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

proyecto

Proyecto: 340270

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN AB

Ubicación: [9] CABAÑAS [4] GUACOTECTI [1] GUACOTECTI

Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1791	ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS	06/06/2017	29/10/2017
131	OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN	30/10/2017	10/12/2017
1791	ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS	11/12/2017	

Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.


NIT: 06142507951024

0000636

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
56720	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LA CUCHILLA (56720)	\$60,393.96	FDEMG B	730	R/5672.0-94	\$70,606.32	CEN IE
69920	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO CANDELARIA (69920)	\$46,189.31	FDEMG B	730	R/6992.0-95	\$47,083.31	CEN IE
74480	ELECTRIFICACION EN CANTON EL AMATON (74480)	\$87,023.15	LEM	730	R/7448.0-97	\$87,023.15	CEN IE
77250	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL COYOLITO (77250)	\$70,126.97	LEM	730	R/7725.0-97	\$70,126.97	CEN IE
81910	ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL RETIRO, SAN JOSE Y SAN DIEGO	\$94,314.26	LEM	730	R/8191.0-97	\$94,777.87	CEN IE
84800	ELECTRIFICACION EN COLONIA FATIMA	\$26,735.16	CEVC	730	R/84800	\$26,735.16	DES IE
102790	ELECTRIFICACION EN CANTON LOS LOPEZ	\$14,078.58	FJC	730	R/102790	\$12,213.99	DES IE
102800	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CERRO	\$4,980.71	FJC	730	R/102800	\$4,980.71	DES IE
102810	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL AMATILLO SECTOR #2	\$13,734.35	FJC	730	R/102810	\$17,962.56	DES IE
103350	ELECTRIFICACION EN CANTON ANIMAS	\$49,901.84	CEVC	730	R/103350	\$49,832.19	DES IE
105130	ELECTRIFICACION EN CANTON LA PUEBLA	\$57,149.03	JMRP	730	R/105130	\$57,149.03	DES IE
110490	ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ANDRES	\$22,712.38	JMRP	730	R/110490	\$28,059.56	DES IE
120890	ELECTRIFICACION CANTON LAS ANIMAS SECTOR LA CANCHA	\$29,028.57	NJADEV	730	R/120890	\$29,028.57	DES IE
120900	ELECTRIFICACION CANTON SAN JOSE PRIMERO	\$39,428.57	NJADEV	730	R/120900	\$39,428.57	DES IE
120990	ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL MILAGRO, SAN FCO. ANGULO, Y SANTA RANA	\$44,607.87	FRJJ	730	R/120990	\$44,606.85	DES IE
123990	ELECTRIFICACION EN CANTON EL RINCON, CASERIOS TEPEMECHIN Y MONTECRISTO	\$54,189.72	CEVC	730	R/123990	\$54,189.72	DES IE
124210	AMPLIACION SISTEMA ENERGIA ELECTRICA CANTON SAN ANDRES	\$45,659.60	MLAD	730	R/124210	\$57,014.79	DES IE
126940	ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA MARTA	\$10,304.48	MARQ	730	R/126940	\$10,304.48	DES IE
127640	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LOS PENATES, CANTON SACAZI	\$17,550.99	MARQ	730	R/127640	\$17,550.99	DES IE
127910	ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES EL CASTAÑO Y BENDICION DE DIOS	\$25,140.65	HRCM	700	R/127910	\$25,140.65	DES IE
129900	ELECTRIFICACION CS/LOS PINEDA Y LOS MENJIVAR	\$59,426.51	JGSR	730	R/131180	\$59,426.51	DES IE
131180	ELECTRIFICACION CAS/LOS MONRROY C/PLATANARES	\$51,639.04	JGSR	730	R/131180	\$51,639.04	DES IE
133060	ELECTRIFICACION LOTIF. ALTOS DE COSTA RICA	\$9,287.09	CAGV	730	R-133060	\$9,287.09	DES IE
136930	ELECT. DESDE CAS. PIEDRA PARADA A C/EL JIOTE C/LAS MARIAS HASTA SAN GR	\$154,794.76	CEVC	730	R/136930	\$154,794.76	DES IE
136940	ELECT. DESDE IGLESIA TRINIDAD HASTA CAS. HUISCOYOL C/TRINIDAD	\$82,699.35	CEVC	730	R/136940	\$82,699.35	DES IE
137440	ELECTRIFICACION EN CANTON LA ESPERANZA Y CRIOS.	\$115,612.11	WSC	635	R/137440	\$115,612.11	DES IE
139100	ELECTRIFICACION EN C/ AMATITAN ARRIBA	\$25,872.10	WSC	730	R/139100	\$25,871.08	DES IE
140460	ELECTRIFICACION EN CASERIOS EL BOSQUE, LOMA CHINA, REYES, TORRES, VEGA	\$41,282.00	CEVC	635	R/140460	\$41,281.09	DES IE
141320	ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS VENTURA, CHICHIPATE Y PUEBLO VIEJO	\$28,211.33	SAMP	730	R/141320	\$28,211.33	DES IE
144680	INSTALACION DE LAMPARAS DE MERCURIO EN SALCOATITAN	\$7,837.04	WRCM	730	R/14468.0-2002	\$7,837.04	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 144					MONTOS:	\$7848,844.40	

Usuario:
nmenjivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador

Página: 2/0

Banco de Contratistas

Fecha de Impresión:
24/09/2018 11:39 a.m.

Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.

NIT: 06142507951024

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
145370	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN MONTE SAN JUAN	\$67,940.15	WRCM	730	R/14537.0-2002	\$67,940.15	CEN IE
145460	ALUMBRADO PUBLICO EN COL. LAS VICTORIAS Y COLONIAS ALEDANAS	\$19,682.45	BCBSQ	730	R/145460	\$19,682.45	DES IE
145670	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL CASTAÑO	\$40,730.48	JGSR	730	R/145670	\$34,279.75	DES IE
146060	ELECTRIFICACIÓN EN HACIENDA EL CHINO CANTON GARITA PALMERA	\$34,926.07	JGSR	730	R/146060	\$34,926.07	DES IE
146390	ELECT. PALACIOS, MONTEPEQUE, LAMORA, LOS ALMENDROS, BARRIO, DELICIAS, LA PITA	\$209,619.15	DPT	730	R/146390	\$209,618.13	DES IE
149010	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA VILLA TSU -CHI	\$29,827.18	NASG	730	R/149010	\$29,827.18	DES IE
162990	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CRIO EL CACAO ARRIBA	\$16,165.93	NJPC	730	R/162990	\$16,165.93	DES IE
177980	ELECTRIFICACION CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEIBITA	\$32,918.72	CEMR	730	R/17798.0-2005	\$32,918.72	CEN IE
178840	ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO POTRERILLO	\$27,513.56	CEMR	730	R/17884.0-2005	\$27,513.56	CEN IE
183070	ELECTRIFICACION CASERIO EL CHUPADERO SECTOR LOS HERNANDEZ	\$9,491.09	JLFA	730	R/18307.0-2006	\$9,491.09	CEN IE
183100	ELECTRIFICACION CASERIO EL CHUPADERO SECTOR GUALPUCAS	\$15,370.41	JLFA	730	R/18310.0-2006	\$15,370.41	CEN IE
185210	ELECTRIFICACION CASERIO EL TERRERO	\$19,097.33	VECC	700	R/18521.0-2006	\$19,097.33	CEN IE
185380	ELECTRIFICACION CANTON PIEDRA PARADA	\$40,665.01	JLFA	730	R/18538.0-2006	\$40,665.01	CEN IE
185470	ELECTRIFICACION CASERIO PARADA CACERES	\$21,743.63	CIMB	730	R/18547.0-2006	\$21,743.63	CEN IE
185480	ELECTRIFICACION CASERIO LAS BARRANCAS	\$26,630.09	CIMB	730	R/18548.0-2006	\$26,630.09	CEN IE
185490	ELECTRIFICACION CASERIO LA PITA	\$20,901.03	CIMB	730	R/18549.0-2006	\$20,901.03	CEN IE
185500	ELECTRIFICACION COLONIA NARANJERA	\$8,222.41	CIMB	730	R/18550.0-2006	\$8,222.41	CEN IE
185510	ELECTRIFICACION CASERIO LOS CABEZONALES	\$30,062.79	CIMB	730	R/18551.0-2006	\$30,062.79	CEN IE
185560	ELECTRIFICACION CENTRO GOBIERNO CASERIO RANCHO QUEMADO	\$30,908.48	DAGF	730	R/18556.0-2006	\$30,908.48	CEN IE
185580	AMPLIACION ELECTRICA EN COLONIA VISTA HERMOSA	\$9,666.69	CACH	730	R/18558.0-2006	\$9,666.69	CEN IE
186260	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL CERRO	\$11,438.20	CEVC	730	R/18626.0-2006	\$11,438.20	CEN IE
186270	INTRODUCCION DE ENERGIA CANTON SAN SEBASTIAN	\$25,343.91	CEVC	730	R/18627.0-2006	\$25,343.91	CEN IE
186280	INTROD. CAS. LOMA DEL CEMENTERIO	\$11,951.72	CEVC	730	R/18628.0-2006	\$11,951.72	CEN IE
186290	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CANTON SAN ISIDRO	\$17,144.97	CEVC	730	R/18629.0-2006	\$17,144.97	CEN IE
186300	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CANTON MESTIZO	\$65,413.75	JMSR	730	R/18630.0-2006	\$65,413.75	CEN IE
186310	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO PEÑAS BLANCAS	\$31,785.44	JMSR	730	R/18631.0-2006	\$31,785.44	CEN IE
186350	INTRODUCCION ENERGIA CASERIO PIEDRAS BLANCAS	\$8,592.93	CIMB	730	R/18635.0-2006	\$8,592.93	CEN IE
190710	ELECTRIF. CAS. BARRANQUILLA Y CAS. LINDA VISTA	\$14,478.22	JNOF	730	R/19071.0-2006	\$14,478.22	CEN IE
190720	ELECTRIF. CANT CHILAMATE, CANT OJOS DE AGUA Y CAS. LA CEBADILLA	\$13,429.33	JNOF	730	R/19072.0-2006	\$13,429.33	CEN IE
190730	ELECTRIF. CAS. SANTO DOMINGO, LA JOYITA DEL	\$24,872.96	JNOF	730	R/19073.0-2006	\$24,872.96	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 144					MONTOS:	\$7848,844.40	

Usuario:
nmenjivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO

0000637

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
	CANTON EL FLOR						
190740	AMPLIA. ENERGIA ELECT. AREA URB. SANT. DE LA FRONTERA	\$20,073.74	JNOF	730	R/19074.0-2006	\$20,073.74	CEN IE
190850	REHABILITA. Y AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIC. BARRIO NUEVO	\$20,772.97	RHDBV	730	R/19085.0-2006	\$20,772.97	CEN IE
192740	ELECTRIFICACION EN CASERIO ABELINES	\$110,075.61	EAGJ	730	R/19274.0-2007	\$110,075.61	CEN IE
192750	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RETEN	\$64,690.55	EAGJ	730	R/19275.0-2007	\$64,690.55	CEN IE
192760	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL LIMON	\$124,697.49	ASG	730	R/19276.0-2007	\$124,697.49	CEN IE
193730	ELECTRIFICACION EN CASERIO QUEBRADA SECA.	\$36,905.80	JVGC	730	R/19373.0-2007	\$36,905.80	CEN IE
195170	ELECTRIFICACIÓN CASERIO LOS MATA, SECTOR LOS CRUCES Y GONZALEZ	\$29,832.00	GBFV	730	R/19517.0-2007	\$29,832.00	CEN IE
195220	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS SANCHEZ, CHILANGA	\$23,052.00	GBFV	730	R/19522.0-2007	\$23,052.00	CEN IE
195440	ELECTRIFICACION EN EL CANTON LA LAGUNA, LAS VUELTAS	\$80,837.84	DPT	730	R/19544.0-2007	\$80,837.84	CEN IE
195730	ELECTRIFICACION URBANIZACION EL PALMAR PONIENTE	\$9,424.20	JACC	730	R/19573.0-2007	\$9,424.20	CEN IE
195750	ELECTRIFICACION CRIO LACHACRA / LOS RIVAS	\$15,797.40	JACC	730	R/19575.0-2007	\$15,797.40	CEN IE
195770	ELECTRIFICACION URBANIZACIÓN EL PALMAR / C.E. REPUBLICA DE CHINA	\$8,678.40	JACC	730	R/19577.0-2007	\$8,678.40	CEN IE
196360	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS MATA, SECTOR I Y II	\$33,963.13	CMLC	730	R/19636.0-2007	\$33,963.13	CEN IE
196370	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CACERES, SECTOR I Y II	\$37,898.17	CMLC	730	R/19637.0-2007	\$37,898.17	CEN IE
197170	ELECTRIFICACION EN CASERIO LA MANZANILLA	\$42,036.00	JGAL	730	R/19717.0-2007	\$42,036.00	CEN IE
197290	ELECTRIFICACION EN CASERIOS SAN NICOLAS, LA VEGA Y EL TULE	\$144,100.00	CEMR	730	R/197290	\$131,639.89	DES IE
197410	MEJORAMIENTO ELECTRICO EN VARIOS CANTONES MONTE SAN JUAN	\$156,025.45	FRVG	730	R/197410	\$155,281.35	DES IE
197680	ELECTRIFICACION EN CRIO LINDA VISTA CANTON LAS PIEDRAS	\$23,194.38	JVGC	730	R/19768.0-2007	\$23,194.38	CEN IE
197690	ELECTRIFICACION CASERIO LA GARDUÑA CTON APANCOYO	\$45,035.47	JVGC	730	R/19769.0-2007	\$45,035.47	CEN IE
197970	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CTON EL TORTUGUERO Y CAS. JOYA ONDA	\$108,070.93	RHDBV	730	R/197970	\$108,070.93	DES IE
197980	AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CAS. LA GUAYABILLA Y CENICEROS	\$39,120.21	RHDBV	730	R/197980	\$39,120.21	DES IE
198010	AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO LA PERIQUERA	\$28,485.66	RHDBV	730	R/198010	\$28,485.66	DES IE
198020	AMPLIACION ELECTRIFICACION CASERIO SAN JOSE NACASPILO	\$21,492.99	RHDBV	730	R/198020	\$21,492.99	DES IE
198030	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN ANTONIO	\$13,245.92	RHDBV	730	R/198030	\$13,245.92	DES IE
198050	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO	\$16,823.36	RHDBV	730	R/198050	\$16,823.36	DES IE
198060	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LOTIFICACION LOMA DE LA LAGUNA	\$14,972.70	RHDBV	730	R/198060	\$14,972.70	DES IE
198660	ELECTRIFICACION EN 5 CASERIOS DE PARAISO DE OSORIO	\$70,097.02	CEVC	730	R/198660	\$70,097.02	DES IE
199030	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN	\$34,038.85	DAGF	730	R/19903.0-2008	\$34,038.85	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 144					MONTOS:	\$7848,844.40	

Código	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
199040	CASERIO LA JOYA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL LLANO LIZO	\$33,561.14	DAGF	730	R/19904.0-2008	\$33,561.14	CEN IE
201390	COBERTURA 100% ELECTRIFICACION EN SANTIAGO DE LA FRONTERA	\$164,910.00	JRMP	730	R/201390	\$164,910.00	DES IE
201490	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA FRAGUA	\$101,451.27	BGG	730	R/201490	\$101,451.27	DES IE
201500	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO LA HONDA (ZONA ALTA)	\$24,423.23	BGG	730	R/201500	\$24,423.23	DES IE
201510	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SANTA ROSA	\$23,283.50	BGG	730	R/201510	\$23,283.50	DES IE
201520	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA JOYA	\$44,098.20	BGG	730	R/201520	\$44,098.20	DES IE
201530	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CALVARIO	\$15,731.99	BGG	635	R/201530	\$15,731.99	DES IE
201540	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL CAJON Y PILETAS	\$52,932.48	BGG	730	R/201540	\$52,932.48	DES IE
201550	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CASERIO EL CHILAMO	\$19,160.46	BGG	730	R/201550	\$19,160.46	DES IE
201610	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO EL JOBO, CTON PILETAS	\$29,530.00	JRMP	730	R/201610	\$29,530.00	DES IE
204160	ELECTRIFICACION CASERIO LOMA EL CENTRO Y CASERIO LOMA TEPILO	\$37,866.75	KMDEL CGDEF	730	R/204160	\$37,866.75	DES IE
204170	ELECTRIFICACION CASERIO LOS GAMEZ, CANTON EL CHAPERNO	\$38,005.93	KMDEL CGDEF	730	R/204170	\$38,999.54	DES IE
204180	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL QUEQUEISQUE, BARRIO LAS DELICIAS	\$20,196.68	KMDEL CGDEF	730	R/204180	\$20,196.68	DES IE
204190	ELECTRIFICACION CASERIO LA CEIBA, CANTON SAN JOSE CARRIZAL	\$16,051.45	KMDEL CGDEF	730	R/204190	\$16,051.45	DES IE
204200	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL RINCON, CANTON SAN JOSE CARRIZAL	\$28,425.86	KMDEL CGDEF	730	R/204200	\$28,425.86	DES IE
205900	ELECTRIFICACION EN CANTON MAIGUERA, CRIOS LOS MARTINEZ Y LOS VASQUEZ	\$213,441.23	EAGJ	730	R/205900	\$213,441.23	DES IE
206370	AMPLIACION Y MEJORA RED ELECTRICA EN LOTIFICACION MARIA GREGORIA	\$14,696.22	JGAL	635	R/206370	\$14,695.77	DES IE
206590	ELECTRIF CRIOS EL MORENO Y CHILILLO Y LOTIF BUENA VISTA Y GIRASOLES	\$73,677.00	CIRDG	730	R/206590	\$73,677.00	DES IE
206680	ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA CHARANGA Y EL HUISCOYOL, CTON CIRIGUAL	\$158,159.15	EAGJ	730	R/206680	\$158,159.15	DES IE
209760	ELECTRIFICACION EN PARCELACION MUNICIPAL SANTA JULIA	\$23,314.72	RHDBV	730	R/209760	\$23,314.72	DES IE
210171	ELECTRIFICACION EN CASERIOS VARIOS DE MONTE SAN JUAN	\$189,358.70	GYMA	730	R/210171	\$189,358.70	DES IE
210590	ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN EL REGADILLO, CHILTIUPAN	\$187,325.20	MLDLA RZ	730	R/210590	\$187,325.20	DES IE
211360	ELECTRIFIC EN CRÍO LAS ISLETAS, SEC LOS AMAYA, CTON JOYA MATAZANO	\$42,976.66	BGG	635	R/211360	\$41,860.61	DES IE
213920	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SILO	\$122,626.29	CRLA	730	R/213920	\$122,626.29	DES IE
214080	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS REYES	\$37,613.00	KPADP	730	R/214080	\$31,081.75	DES IE
215350	CONVERSION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MONOFASICO A BIFASICO EN TABLON	\$441,997.14	AFJ	730	R/21535.0-2010	\$441,997.14	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 144					MONTOS:	\$7848,844.40	

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
219740	ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON APANCOYO ETAPA 2	\$161,277.86	KRCDR	635	R/219740	\$148,354.21	DES IE
235060	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA CRUZ GRANDE ABAJO	\$10,524.05	WMC	730	R/235060	\$10,524.05	DES IE
235070	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS PÉREZ	\$22,698.91	WMC	730	R/235070	\$22,698.91	DES IE
235080	ELECTRIFICACION EN CASERÍO SHON SHON	\$11,131.13	WMC	730	R/235080	\$11,131.13	DES IE
235090	ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO LAS TRES CEIBAS	\$22,606.84	WMC	730	R/235090	\$22,606.84	DES IE
257960	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN JOSÉ, CANTÓN CARA SUCIA.	\$37,155.43	CRLA	730	R/257960	\$37,155.43	DES IE
292061	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN AHUACHAPÁN	\$123,833.77	DPT	730	R/29206.1-2017	\$123,833.77	CEN E
296180	ILUMINACIÓN DE PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II	\$120,827.17	MDRG	730	R/296180	\$120,827.17	DES IE
298050	ILUMINACIÓN DE BULEVAR DR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ PORTH	\$181,137.78	CAGV	730	R/298050	\$181,137.78	DES IE
299680	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LOS RAMOS, CANTÓN SAN PEDRO LOMA ALTA	\$6,461.20	ALFDL	635	R/299680	\$7,130.79	DES IE
299690	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO LOS FLORES, CANTÓN SAN PABLO ARRIBA	\$10,533.29	ALFDL	635	R/299690	\$14,632.07	DES IE
299700	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN LOS REMEDIOS, BARRIO NUEVO	\$7,689.11	ALFDL	635	R/299700	\$8,092.11	DES IE
299710	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PASAJE LOS HERNÁNDEZ, BARRIO EL CENTRO	\$9,264.84	ALFDL	635	R/299710	\$9,027.42	DES IE
299720	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PALACIOS, CANTÓN SAN PABLO ABAJO	\$11,464.00	ALFDL	635	R/299720	\$11,624.68	DES IE
304430	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS OJO DE AGUA, SECTOR LOS VÁSQUEZ, COLONIA LA CEIBA, SECTOR EL CAMPO Y CASERÍO EL VOLCÁN, SECTOR LA CÍVICA; CANTÓN AGUA ZARCA	\$66,214.39	JCF	730	R/304430	\$66,214.39	DES IH
309560	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA PARTE II	\$101,245.96	GHHM	730	R/309560	\$101,245.96	DES IE
309690	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO AGUA FRÍA, CANTÓN EL ESPÍRITU SANTO	\$43,562.58	LGHP	730	R/309690	\$43,562.58	DES IE
310240	AMPLIACIÓN E INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS DE CUISNAHUAT	\$164,970.24	KPADP	730	R/310240	\$164,970.24	DES IE
312670	MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	\$24,163.46	ALFDL	730	R/312670	\$24,163.46	DES IV
312790	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, BASQUETBOL Y ZONA DE RECREACIÓN INFANTIL EN COLONIA PRADOS DE VENENCIA N°4 FE Y ALEGRÍA.	\$23,804.72	ALFDL	730	R/312790	\$23,390.25	DES E
314420	ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS DEL CANTÓN CUTUMAYO ABAJO	\$64,856.57	JVGC	660	R/31442.0-2016	\$64,856.57	CEN IE
317260	MEJORAMIENTO DE ACERAS E ILUMINACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO PERULAPÁN	\$24,944.80	JRMP	730	R/317260	\$24,944.80	DES IV
323020	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL ZARZAL, CASERIO LOS VASQUEZ Y GARCIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE	\$26,704.72	JABR	635	R/323020	\$26,704.72	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 144					MONTOS:	\$7848,844.40	

Código	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
	GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE						
332880	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CASERÍO IZOTALILLO, CANTÓN HIGUERAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	\$61,727.84	NEHM	730	R/332880	\$61,727.84	DES IE
333220	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CALLE ZACAMIL, ENTRE 29 AVENIDA NORTE Y CALLE LAS MARGARITAS	\$4,956.24	JRMP	730	R/33322.0-2016	\$4,956.24	CEN IV
333250	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE 2DA. CALLE PONIENTE, ENTRE AVENIDA JUAN ABERLE Y IERA. CALLE	\$3,717.18	JRMP	730	R/33325.0-2016	\$3,717.18	CEN IV
337890	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PABLO, LOS ROSA Y LOS BLANCO, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO	\$118,547.45	JCF	630	R/337890	\$118,547.45	DES IE
340260	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN LA JOYA	\$81,318.85	JCF	730	R/34026.0-2017	\$81,318.85	CEN IE
342630	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PEDRO, LLANO LA ESTACA, LA GUACAMALLITA Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN	\$298,389.45	JCF	630	R/34263.0-2018	\$298,389.45	CEN IE
342640	ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA	\$152,406.75	GHHM	530	R/34264.0-2018	\$152,406.75	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 144					MONTOS:	\$7848,844.40	

TOTALES PROYECTOS: 144

MONTOS:

\$7848,844.40

Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.

NIT: 06142507951024

Capacitado:

0000639

Tipo de Contratista: FORMULADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	16/10/2015	CAMBIO DE NIVEL CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
B	17/10/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA DE ACTUALIZACION
B	08/01/2013	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	02/07/2012	PRESENTO DOCUMENTACION Y DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS
B	14/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	08/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	10/09/2003	NIVEL RESTABLECIDO POR HABER FINALIZADO EL PERÍODO PARA EL CUAL FUE SUSPENDIDA.
S	09/12/2002	9 MESES 2A VEZ ATRASO 32 DÍAS PROY. 13738.0 Y 1A VEZ 11 DÍAS PROY. 13338.0.
B	10/10/2000	TRASLADO A NUEVO BANCO

Tipo de Contratista: PERFILISTA

Nivel	Fecha	Observaciones
B	02/07/2012	TIPO DE CONTRATISTA AGREGADO POR NUEVO MANUAL VER.02/01/2012
B	14/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	08/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	10/09/2003	NIVEL RESTABLECIDO POR HABER FINALIZADO EL PERÍODO PARA EL CUAL FUE SUSPENDIDA.

Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.

NIT: 06142507951024

Capacitado:

Tipo de Contratista: PERFILISTA

Nivel	Fecha	Observaciones
S	09/12/2002	9 MESES 2A VEZ ATRASO 32 DÍAS PROY. 13738.0 Y 1A VEZ 11 DÍAS PROY. 13338.0.
B	10/10/2000	CARGA AUTOMATICA CON DATOS DEL FORMULADOR

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	18/07/2018	AUMENTO DE CATEGORIA COMO REALIZADOR EDIF.
A	16/10/2015	CAMBIO DE NIVEL CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
B	17/10/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA DE ACTUALIZACION
B	08/01/2013	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	02/07/2012	PRESENTO DOCUMENTACION Y DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS
B	14/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	08/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	10/09/2003	NIVEL RESTABLECIDO POR HABER FINALIZADO EL PERÍODO PARA EL CUAL FUE SUSPENDIDA.
S	09/12/2002	9 MESES 2A VEZ ATRASO 32 DÍAS PROY. 13738.0 Y 1A VEZ 11 DÍAS PROY. 13338.0.
B	17/08/2001	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE
B	10/10/2000	TRASLADO A NUEVO BANCO

Tipo de Contratista: FORMULADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: ANTIGUO BANCO	Sub Especialidad: ANTIGUO BANCO EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
18/08/1999	2	NUEVO INGRESO APROBADO C.T. DL-134/99 DEL 11/AGOSTO/99CAALIFICADO COMISION EVALUADORA SESION CC-25/99

Tipo de Contratista: FORMULADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
10/10/2000	3	TRASLADO A NUEVO BANCO

Tipo de Contratista: PERFILISTA	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: ANTIGUO BANCO	Sub Especialidad: ANTIGUO BANCO EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
18/08/1999	2	CARGA AUTOMATICA CON DATOS DEL FORMULADOR

Tipo de Contratista: PERFILISTA	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
10/10/2000	3	CARGA AUTOMATICA CON DATOS DEL FORMULADOR

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: ANTIGUO BANCO	Sub Especialidad: ANTIGUO BANCO EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
18/08/1999	3	CALIFICADO COMISION EVALUADORA CC-25/99 Y APROBADO C.T. DL-134/99 DEL 11/AGOSTO/99CATEG. ANTERIOR: 2
10/08/1999	6	SE INHABILITA EL 10/AGOSTO/99 POR SER REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA PRODEL S.A. DE C.V.CODIGO R/3748
24/03/1998	5	APROBADO EN COMITE TEC. DL-61/98 DE FECHA 12/03/98CASO # 411/98 COMISION EVALUADORA DE CONTRATISTAS.
26/01/1998	3	CAMBIO APROBADO POR C.T. SESION DL-57/98 DE FECHA 21/01/98, CASO #372/98 COMISION EVALUADORA DE CON-TRATISTAS.REVISION DE CURRICULUM. TECNICO EN ELECTRICIDAD.
03/12/1997	2	CAMBIO DE CAT.5 A 2 MIENTRAS TERMINA LOS PROY.7725.0 Y 8191.0, PORQUE TAMBIEN ES REPRESENTANTE LEGALDE LA EMPRESA PRODEL, REGISTRADA COMO REALIZADORCODIGO 3748. EXISTE CARTA DEL REALIZADOR VENTURA DEL 24/11/97 MANIFESTANDO QUE AL TERMINAR ESTOS PROY.
13/11/1997	2	COMISION CALIFICADORA DE PROFESIONALES: 033/97,DE FECHA 31/10/97.NUEVO INGRESO


Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
18/07/2018	5	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
07/10/2011	4	CALIFICACION CON DOCUMENTACION ADICIONAL RESPALDADA
21/03/2006	2	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA CA DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2006

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
08/08/2007	5	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
24/08/2001	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
17/08/2001	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE
10/10/2000	3	TRASLADO A NUEVO BANCO

[Handwritten signatures and initials]



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador

Página: 2/2

Banco de Contratistas

Fecha:

Historico de Categorías al: 24/09/2018

24/09/2018 11:08:10 a.m.

Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.

NIT: 06142507951024

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
08/01/2013	4	CALIFICACION CON DOCUMENTACION REQUERIDA

proyecto

Proyecto: 337890 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PABLO, LOS ROSA Y LOS BLANCO, CANTÓN JOYA D
Ubicación: [13] MORAZAN [5] CHILANGA [4] JOYA DEL MATAZANO Modalidad: DESCENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/337890
Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V.
Fuente:
06-C BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016

Tipo contratista:	R		
Administrador contrato:	1604	JUAN CARLOS	FUNES
Fecha de inicio:	07/03/2018		Estado contrato: *
Fecha fin original:	05/06/2018		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	05/06/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$118,547.45		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$118,547.45		Dias en ejecución: 201
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$122,076.11 [102.98 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$122,076.11 [102.98%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance físico: 95.00 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Solicitado	Procesado	Pagado	Liquidado
1	D-1	\$122,076.11	14/12/16 3:45 pm	14/12/16 4:17 pm		
1	L-1	\$93,438.90				22/05/18 12:00 am

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
------	-------	-------	-------------	--------

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1604	JUAN CARLOS FUNES		

proyecto

Proyecto: 342640 Etapa actual: [530] EN PROCESO DE EMISIC
Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA
Ubicación: [13] MORAZAN [2] ARAMBALA [1] ARAMBALA Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34264.0-2018
Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S.A DE C.V.
Fuente:
85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1790	GERMAN HIG	HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha de inicio:			Estado contrato: RUBRICADO
Fecha fin original:			Plazo original: 90
Fecha fin actual:			Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$152,406.75		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$152,406.75		Dias en ejecución: 0
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$0.00 [0.00%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance físico: 0.00 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
-----	-----------------	-------	-----------	------------------------	------------------	-----------------------

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$30,481.35	08/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$45,722.03	08/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO

De: GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 10:57 a.m.
Para: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Asunto: RE: informacion de proyectos

Aun no se ha emitido la orden de inicio para ese proyecto.

Atte.
German Hernández.

De: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 10:31 a.m.
Para: GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ
Asunto: informacion de proyectos

Buenas días

Agradeceré me proporcione el avance físico a la fecha del proyecto código 342640 realizado por la empresa PRODEL, Electrificación diferentes sectores Municipios de Arambala, en el SGO indica un avance del 0.00%, por lo que necesito confirmar dicha información, así mismo me proporcione el nombre del Residente del Proyecto.

Cordiales saludos

Sandra Margarita Méndez de Alvarado
Técnico ACI
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

proyecto

Proyecto: 342630 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PEDRO, LLANO LA ESTACA,
Ubicación: [13] MORAZAN [3] CACAOPERA [1] CACAOPERA Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34263.0-2018 /
Contratista: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECHANICOS, S A DE C.V.
Fuente:
85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1604	JUAN CARLOS	FUNES
Fecha de inicio:	23/07/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	21/10/2018		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	21/10/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$298,389.45		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$298,389.45		Dias en ejecución: 63
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$89,516.84 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$99,758.89 [33.43%]		Anticipo recuperado: \$29,927.67 [33.43 %]
Estimado en proceso:	\$91,203.12 [30.57 %]		Anticipo en proceso: \$27,360.94 [30.57 %]
Estimado total:	\$190,962.01 [64.00%]		Saldo anticipo: \$59,589.17 [66.57 %]
Desembolsado a la fecha:	\$159,348.06 [53.40%]		Porc. avance financiero: 33.43 %
			Porc. avance físico: 64.00 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$89,516.84	20/07/18 11:30 am	20/07/18 11:30 am	23/07/18 12:32 pm	23/07/18 3:15 pm
1	E-1	\$99,758.89	23/08/18 8:12 am	23/08/18 11:29 am	24/08/18 7:35 am	30/08/18 9:42 am
2	E-2	\$91,203.12	21/09/18 4:16 pm	24/09/18 7:45 am		
Estimado a la Fecha:		\$190,962.01				

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$59,677.89	28/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$89,516.84	28/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$298,389.45	19/01/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	23/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1604	JUAN CARLOS FUNES	18/07/2018	

0000645

SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO

De: JUAN CARLOS FUNES
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 04:33 p.m.
Para: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Asunto: RE: informacion de proyectos

Buenas tardes

Remito información solicitada.


De: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 10:31 a.m.
Para: JUAN CARLOS FUNES
Asunto: informacion de proyectos

Buenos días

Agradeceré me proporcione el avance físico a la fecha del proyecto código 342630 realizado por la empresa PRODEL, Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica San Pedro .. Cacaopera Morazán, en el SGO indica un avance del 64.00%,(se mantiene el avance hasta la fecha) por lo que necesito confirmar dicha información, así mismo me proporcione el nombre del Residente del Proyecto. Ing. Jose Luis Orellana.

Cordiales saludos

Sandra Margarita Méndez de Alvarado
Técnico ACI
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

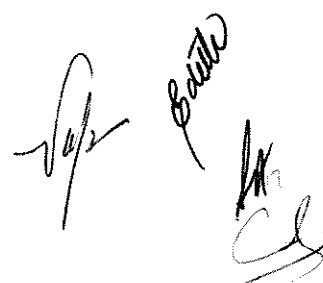

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
208541	ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ISIDRO DE BERLÍN	\$199,854.76	WOGR	730	R/208541	\$199,854.76	DES IE
211340	ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA Y CASERÍOS DEL CANTÓN EL TALPETATE, BERLÍN	\$62,006.56	WOGR	730	R/211340	\$62,006.56	DES IE
211580	ELECTRIFICACION EN CASERIO DOS CEIBAS, CANTON EL CORTÉZ	\$32,122.56	EV RV	635	R/211580	\$32,122.56	DES IE
212320	AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ÁREA URBANA PRIMERA ETAPA	\$85,795.67	CIR DG	635	R/212320	\$85,795.67	DES IE
214750	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ZAPOTE	\$86,920.59	OM GB	730	R/214750	\$86,920.59	DES IE
217021	OBRAS DE MITIGACIÓN EN SECTOR CAMALOTE, CANTÓN SAN AGUSTÍN	\$53,111.85	GY MA	730	R/217021	\$50,544.80	DES IV
217440	ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS PAMPAS	\$34,213.21	JACC	730	R/217440	\$32,455.28	DES IE
217450	ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL INDI Y CASERIO LOS PAREDES	\$36,744.33	JACC	730	R/217450	\$36,522.66	DES IE
217460	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORTECES	\$34,788.76	JACC	730	R/217460	\$33,072.99	DES IE
217470	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ROBLE	\$14,273.61	JACC	730	R/217470	\$14,181.23	DES IE
219190	ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS PILETAS, CAMPOS, EPINOZA Y LA MORITA	\$40,030.70	RAV	730	R/21919.0-2011	\$40,030.70	CEN IE
226480	ELECTRIFICACION EN BARRIOS DE CUISNAHUAT Y CANTON AGUA SHUCA	\$84,437.50	KRC DR	635	R/226480	\$83,453.22	DES IE
254470	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA SABANA	\$17,870.87	RH DBV	730	R/254470	\$17,870.87	DES IV
254750	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL PAREDÓN SAN PEDRO MASAHUAT	\$23,532.96	RH DBV	730	R/254750	\$23,532.96	DES IV
254780	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN DULCE NOMBRE	\$11,116.95	RH DBV	730	R/254780	\$11,116.95	DES IV
256350	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL LLANO, CANTÓN CARA SUCIA.	\$63,042.42	CR LA	730	R/256350	\$63,042.42	DES IE
257970	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SALAVERRÍA, CASERÍO EL NARANJITO, CANTÓN CARA SUCIA	\$34,045.86	CR LA	730	R/257970	\$34,045.86	DES IE
259890	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS APARICIOS, CANTÓN ESPINO ARRIBA	\$21,502.85	RE AM	730	R/259890	\$21,502.85	DES IE
260300	CONCRETEADO DE CALLE EN TRAMO DEL PUENTE DE SAN AGUSTÍN ARRIBA.	\$43,139.46	AL FDL	730	R/260300	\$43,139.46	DES IV
267930	EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN CUESTA EL AGUACATE, CASERÍO EL AGUACATE.	\$53,036.42	WSC	730	R/267930	\$53,036.42	DES IV
268750	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SANTA AGUEDA, CANTÓN PUNTA REMEDIOS.	\$62,165.06	CB SR	730	R/268750	\$62,165.06	DES IE
269970	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUMICIO, CANTÓN LA PUEBLA.	\$33,372.02	ML DL A RZ	730	R/269970	\$33,372.02	DES IE
299000	ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN PRADOS DE MAJAGUE, CASERÍOS EL ABRUJAL, EL CARRIZAL CENTRO, AGUA FRIA Y COMUNIDAD EL CARRIZAL SECTOR LA PLAYA	\$46,998.18	AG CH	635	R/299000	\$47,687.87	DES IE
307160	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN EL DIAMANTE	\$118,049.01	JF OS	730	R/30716.0-2015	\$118,049.01	CEN IE
307230	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL MANGO, SECTOR	\$23,508.18	JF OS	730	R/30723.0-2015	\$23,508.18	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 39					MONTOS:	\$2880,152.63	

Código	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
	CASA COMUNAL Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO VALLENUEVO, CANTÓN GUAYAPA ABAJO						
307240	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL QUEBRACHO, CANTÓN SAN ANTONIO	\$38,669.71	JFOS	730	R/30724.0-2015	\$38,669.71	CEN IE
307790	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN CAYETANO, CANTÓN TIHUICHA, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$24,586.17	JFOS	730	R/30779.0-2015	\$24,586.17	CEN IE
307820	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS EL PLANÓN, EL ANONAL Y LLANO GRANDE, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA	\$68,002.17	DPT	730	R/30782.0-2015	\$68,002.17	CEN IE
310130	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN	\$225,350.11	WSC	730	R/310130	\$225,350.11	DES IE
313460	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN EL MOJÓN, CASERÍO LAS TABLAS ZONA I Y ZONA II	\$171,316.08	MRLM	730	R/313460	\$171,316.08	DES IE
316260	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERIOS DE SANTA ISABEL ISHUATAN	\$141,110.35	CRLA	730	R/31626.0-2016	\$141,110.35	CEN IE
321920	ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS GUACOCO I, GUACOCO II, CANTÓN LOS LAGARTOS Y CASERÍO EL TEKAL, CANTÓN CHILATA.	\$104,294.07	KPADP	635	R/321920	\$104,294.07	DES IE
324030	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOMAS DE ELÍAS, FINCA GUAYALTEPE, CANTÓN GUAYALTEPE.	\$123,316.89	JFOS	730	R/324030	\$123,316.89	DES IE
332730	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA RENATO SEPÚLVEDA	\$17,743.41	JMSR	730	R/33273.0-2016	\$17,743.41	CEN IV
333080	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN BOULEVARD BELÉN	\$16,760.63	MRLM	730	R/33308.0-2017	\$16,760.63	CEN IV
340250	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA VISTA HERMOSA, SECTORES I, II Y III Y CASERÍO EL TEMPISQUE SECTORES I, II Y III.	\$83,512.07	CEMR	640	R/34025.0-2017	\$83,512.07	CEN IE
342360	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y SIRIGUAL	\$337,580.68	LDSA	630	R/34236.0-2018	\$337,580.68	CEN IE
342370	ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERÍO EL VOLCAN Y GUANAYPA, EN EL CANTÓN SAN LUCAS.	\$128,293.98	LDSA	655	R/34237.0-2018	\$128,293.98	CEN IE
342380	ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN	\$90,585.36	JLFA	630	R/34238.0-2018	\$90,585.36	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 39					MONTOS:		\$2880,152.63

TOTALES PROYECTOS: 39					MONTOS:		\$2880,152.63
------------------------------	--	--	--	--	----------------	--	---------------

proyecto	
Proyecto: 342360	Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y	
Ubicación: [13] MORAZAN [10] GUATAJAGUA [4] LOS ABELINES	Modalidad: CENTRALIZADA

contrato	
Numero contrato: R/34236.0-2018	
Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018	

Tipo contratista: [R] REALIZADOR			
Administrador contrato: 1761 LUIS DAVID	SARAVIA ARAUJO		
Fecha de inicio: 14/05/2018	Estado contrato: EN EJECUCIÓN		
Fecha fin original: 10/11/2018	Plazo original: 180		
Fecha fin actual: 10/11/2018	Prorrogas: 0 [0]		
Fecha acta recepción:	Suspensiones: 0 [0]		
Monto contratado: \$337,580.68	Plazo actual: 180		
Monto reasignaciones: \$0.00 [0.00%] [0]	Dias en multa: 0		
Monto actual: \$337,580.68	Dias en ejecución: 133		
Monto penalidades: \$0.00 [0.00%]	Dias no imputables: 0		
Monto multas: \$0.00 [0.00%]	Monto anticipo: \$101,274.20 [30.00 %]		
Estimado a la fecha: \$178,076.03 [52.75%]	Anticipo recuperado: \$53,422.81 [52.75 %]		
Estimado en proceso: \$0.00 [0.00 %]	Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]		
Estimado total: \$178,076.03 [52.75%]	Saldo anticipo: \$47,851.39 [47.25 %]		
Desembolsado a la fecha: \$225,927.42 [66.93%]	Porc. avance financiero: 52.75 %		
	Porc. avance físico: 80.00 %		

Información Movimientos									
No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas			
1	A-1	\$101,274.20	08/05/18 9:12 am	08/05/18 9:12 am	08/05/18 11:00 am	23/05/18 7:45 am			
1	E-1	\$105,740.16	05/07/18 8:32 am	05/07/18 8:33 am	05/07/18 12:51 pm	06/07/18 7:56 am			
2	E-2	\$72,335.87	10/08/18 9:03 am	10/08/18 9:33 am	10/08/18 11:58 am	15/08/18 10:40 am			
Estimado a la Fecha:		\$178,076.03							

Información Garantías					
Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador	
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$67,516.14	09/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$101,274.20	09/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$337,580.68	10/11/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	14/05/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1761	LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO	03/05/2018	

proyecto

Proyecto: 342370 Etapa actual: [655] SUSPENDIDO EN EJECU
Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERÍO EL VOLCAN Y GUANAYPA, EN EL CANTÓN SAN LUCAS.
Ubicación: [13] MORAZAN [9] GUALOCOCTI [3] SAN LUCAS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34237.0-2018
Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.
Fuente:
85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1761	LUIS DAVID	SARAVIA ARAUJO
Fecha de inicio:	04/06/2018		Estado contrato: SUSPENDIDO EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	02/09/2018		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	02/09/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [1]
Monto contratado:	\$128,293.98		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$128,293.98		Dias en ejecución: 112
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$38,488.19 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$109,039.27 [84.99%]		Anticipo recuperado: \$38,488.19 [100.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$109,039.27 [84.99%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$109,039.27 [84.99%]		Porc. avance financiero: 84.99 %
			Porc. avance físico: 92.00 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$38,488.19	31/05/18 9:52 am	31/05/18 9:52 am	01/06/18 1:46 pm	04/06/18 3:52 pm
1	E-1	\$76,591.23	02/07/18 10:08 am	02/07/18 10:09 am	02/07/18 12:03 pm	04/07/18 11:40 am
2	E-2	\$32,448.04	10/08/18 8:35 am	10/08/18 9:33 am	10/08/18 11:58 am	15/08/18 10:42 am

Estimado a la Fecha: \$109,039.27

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$25,658.80	25/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$38,488.19	25/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$128,293.98	02/10/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	04/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1761	LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO	28/05/2018	

proyecto

Proyecto: 342380 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN
Ubicación: [11] USULUTAN [11] JUCUARAN [99] VARIOS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34238.0-2018
Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	680	JOSE LUIS	FIGUEROA ALBANES
Fecha de inicio:	30/07/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	28/10/2018		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	28/10/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$90,585.36		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Días en multa: 0
Monto actual:	\$90,585.36		Días en ejecución: 56
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Días no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$27,175.61 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$22,371.38 [24.70%]		Anticipo recuperado: \$6,711.41 [24.70 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$22,371.38 [24.70%]		Saldo anticipo: \$20,464.20 [75.30 %]
Desembolsado a la fecha:	\$42,835.58 [47.29%]		Porc. avance financiero: 24.70 %
			Porc. avance físico: 35.00 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$27,175.61	17/07/18 11:59 am	17/07/18 11:59 am	19/07/18 11:37 am	20/07/18 3:19 pm
1	E-1	\$22,371.38	27/08/18 11:39 am	27/08/18 3:14 pm	28/08/18 7:44 am	30/08/18 9:44 am

Estimado a la Fecha: \$22,371.38

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$18,117.07	22/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$27,175.61	22/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$90,585.36	27/12/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	30/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
680	JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES	17/07/2018	

Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.

NIT: 06142205061046

Capacitado:


0000650

Tipo de Contratista: FORMULADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	20/05/2016	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	28/09/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	26/06/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	19/10/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	06/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	18/03/2009	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	20/05/2016	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	28/09/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	26/06/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	19/10/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	06/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	18/03/2009	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003



Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.

NIT: 06142205061046

Capacitado:

Tipo de Contratista: SUPERVISOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	20/05/2016	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	28/09/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	26/06/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	19/10/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	06/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	18/03/2009	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: FORMULADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS

Fecha	Categoría	Observaciones
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
23/10/2009	2	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
26/11/2010	4	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTACION ADICIONAL.
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS

Fecha	Categoría	Observaciones
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
23/10/2009	2	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
26/11/2010	4	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTACION ADICIONAL.
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
297370	ASFALTADO EN TRAMO DE TERCERA AVENIDA SUR	\$13,029.97	AGCH	730	R/297370	\$15,322.50	DES IV
298150	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES: LAS CRUCES, LOS JOBOS, LOS AMATES NORTE Y SUR	\$102,047.11	CEMR	635	R/298150	\$100,637.04	DES IE
298990	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO, COLONIA ALTA VISTA	\$19,020.61	CEMR	635	R/298990	\$19,020.61	DES IE
299750	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS FLORES, CANTÓN GUALINDO CENTRO	\$19,794.89	CEMR	635	R/299750	\$19,794.89	DES IE
299900	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LOS VIOLANTES, CANTÓN LA CEIBA	\$5,048.15	CBSR	730	R/299900	\$5,048.15	DES IE
300200	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTORES GUAYABITO, CABRERAS Y LOS MONTEAGUDO DEL CASERÍO JUNQUILLO, CANTÓN LAS QUEBRADAS Y CASERÍO VALLE ALEGRE DE CANTÓN EL CERRO	\$102,665.52	GHHM	730	R/300200	\$112,424.70	DES IE
300210	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ROLDANES, EL RICÓN I Y II	\$87,186.60	GHHM	635	R/300210	\$87,186.60	DES IE
300380	ELECT. EN BO ANALCO, COL. GUEVARA; COL. Y CRÍO. AVILES; CRIOS CARBALLO, ARIAS Y EL CONACASTE DEL CTÓN CERRO EL NANZAL; CRÍO LA LAURELERA, SECT LA ESCUELA Y CRIO AMATE SUR DEL CTÓN AMATE SUR; CRIOS LOS RIVAS Y SECT LOS LUNAS DEL CTÓN EL VOLCAN	\$128,445.30	JJAL	730	R/300380	\$128,445.30	DES IE
307360	INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN 9 CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	\$109,573.54	BEGM	730	R/30736.0-2015	\$109,573.54	CEN IE
307830	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PRÍNCIPE DE PAZ, Y EL PUENTE, CANTÓN SAN JUAN, MUNICIPIO DE TACUBA.	\$43,043.34	DPT	730	R/30783.0-2015	\$43,043.34	CEN IE
307850	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PEÑA PINTA, LOS ANCHETAS Y LOMAS DE SAN ANTONIO, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA	\$70,047.49	DPT	730	R/30785.0-2015	\$70,047.49	CEN IE
312830	MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO II, ZACATECOLUCA	\$14,385.64	CIRDG	635	R/312830	\$11,234.93	DES IV
312840	MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO I, ZACATECOLUCA	\$36,500.00	CIRDG	730	R/312840	\$34,106.19	DES IV
320170	ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO EN CASERÍO RÍO VERDE, SITIO VIEJO Y ESCANDINAVOS, CANTÓN LA UNIÓN.	\$12,926.06	JABR	730	R/320170	\$12,926.06	DES IE
321520	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA PANORÁMICA, CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO Y CALLE AL CASERÍO EL PEZOTE 2	\$23,913.56	JMSR	730	R/32152.0-2016	\$23,913.56	CEN IE
333340	MEJORAMIENTO EN ZONA VERDE AL FINAL DE LOS PASAJES 1 Y 2 PONIENTE DE URBANIZACION LOS CONACASTES.	\$9,951.43	JCRM	730	R/33334.0-2016	\$9,951.43	CEN IV
333370	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AVENIDA CASTRO MORÁN, ENTRE PASAJE SAN JOSÉ Y CALLE SAN PABLO	\$5,228.04	JRMP	730	R/33337.0-2016	\$5,228.04	CEN IV
333850	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOTIFICACIÓN DIVINA PROVIDENCIA, CANTÓN PRIMAVERA	\$19,001.09	JVGC	730	R/33385.0-2017	\$19,001.09	CEN IV
333930	MEJORAMIENTO EN CANCHA DE FÚTBOL URBANIZACIÓN SENSUNAPÁN, SONSONATE	\$23,906.78	KPADP	730	R/33393.0-2017	\$23,906.78	CEN E
334000	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE COCINA DE CENTRO ESCOLAR SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE	\$2,139.58	KPADP	730	R/33400.0-2017	\$2,139.58	CEN E
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$2577,489.24	

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: PROVEEDOR							
330890	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A VILLA DE SANTA CRUZ MICHAPA/ DESMONTAJE DE LUMINARIAS	\$0.01	WSC	730	P/330890	\$0.00	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 1						MONTOS:	\$0.00
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
196170	ILUMINACION DE ESTADIO MAURICIO VIDES	\$57,185.06	WSC	730	R/19617.0-2009	\$57,185.06	CEN IE
197420	ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN SECTOR N° 1	\$106,969.54	CMLC	730	R/197420	\$106,969.54	DES IE
206670	INSTALACION LINEA PRIMARIA PARA ESTACION DE BOMBEO EN CTON SAN ESTEBAN	\$15,710.42	CIRDG	730	R/206670	\$15,710.42	DES IE
208030	ELECTRIFICACION CASERIO EL ESCALON, STA CATARINA MASAHUAT	\$28,399.49	CRLA	730	R/208030	\$28,399.49	DES IE
208551	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LOS MUÑOSES	\$47,125.24	WGR	730	R/208551	\$46,742.04	DES IE
211370	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA BUENA VISTA	\$15,430.00	RACM	730	R/211370	\$15,220.48	DES IE
211380	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA EL MANGUITO	\$14,770.01	RACM	730	R/211380	\$14,707.05	DES IE
211570	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ, CTON EL DURAZNO	\$44,520.22	CMLC	635	R/211570	\$44,520.22	DES IE
212020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CASERIOS COMASAGUA	\$112,560.11	AGCH	635	R/212020	\$112,560.11	DES IE
213600	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MORA	\$35,070.04	RAV	730	R/213600	\$35,070.04	DES IE
214100	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORONA	\$19,378.00	KPADP	730	R/214100	\$19,378.00	DES IE
214560	ELECTRIFICACION EN CASERIO DIAZ MARTINEZ	\$38,750.00	KPADP	635	R/214560	\$38,099.77	DES IE
234660	ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES SAN ANTONIO Y EL DIAMANTE	\$189,370.00	WMC	730	R/234660	\$189,370.00	DES IE
246880	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT	\$77,546.00	JVGC	630	R/246880	\$77,546.00	DES IE
255330	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AL SITIO, CANTON EL CALVARIO	\$16,442.30	FRVG	730	R/255330	\$16,442.30	DES IE
256720	INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE	\$138,800.00	MRLM	730	R/256720	\$208,959.49	DES IE
290510	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MARINES AGUA ZARCA, CANTÓN METALÍO.	\$26,000.00	CBSR	730	R/290510	\$26,000.00	DES IE
291850	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	\$46,145.00	JNPDL	730	R/29185.0-2014	\$46,145.00	CEN IE
291890	ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN LOS AMATES	\$48,594.52	DPT	730	R/29189.0-2014	\$48,594.52	CEN IE
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	\$70,702.51	JVGC	735	R/29569.1-2015	\$70,702.51	CEN IE
296040	EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA AGUA ZARCA	\$33,137.25		730	R/296040	\$33,137.25	DES IV
296130	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DELA CANCHA DE BASQUETBOL EN BARRIO LA CRUZ.	\$39,764.64	JCC	730	R/296130	\$39,764.64	DES E
296780	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TONEL, CANTÓN EL JICARAL	\$31,931.68	RMCA	730	R/296780	\$31,931.68	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 49						MONTOS:	\$2577,489.24

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE							
334010	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE COLONIA ESPÍRITU SANTO	\$24,904.69	KPADP	730	R/33401.0-2016	\$24,904.69	CEN E
334040	MEJORAMIENTO EN ZONA VERDE DE URBANIZACIÓN PRADOS DE VENENCIA IV	\$9,323.15	JCRM	730	R/33404.0-2016	\$9,323.15	CEN IV
340490	OBRA DE PREVENCIÓN SITUACIONAL : ILUMINACIÓN RUTA DOS CALLE MARIONA	\$39,560.96	CBSR	730	R/34049.0-2017	\$39,560.96	CEN IV
341660	MEJORAS EN ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN LA CORUÑA 2	\$33,253.28	OMGB	660	R/34166.0-2017	\$33,253.28	CEN E
342440	OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN	\$104,015.45	JCRM	630	R/34244.0-2018	\$104,015.45	CEN E
342730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITIÑO	\$190,324.28	RMCA	630	R/34273.0-2018	\$190,324.28	CEN E
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$2577,489.24	
TOTALES PROYECTOS: 50					MONTOS:	\$2577,489.24	

Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.

NIT: 06142702081050

Capacitado:

0000654

Tipo de Contratista: FORMULADOR


Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	23/04/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	03/10/2013	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
A	23/07/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	11/06/2012	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
B	09/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACT S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: PROVEEDOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	06/10/2016	INGRESO COMO PROVEEDOR PFGL

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	14/07/2017	DESARROLLO DE PROYECTOS BID
A	21/11/2016	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	23/04/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	03/10/2013	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL



Banco de Contratistas

Fecha:

Historico de Niveles al: 24/09/2018

24/09/2018 11:37:52 a.m.

Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.

NIT: 06142702081050

Capacitado:


Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	23/07/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	11/06/2012	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
B	09/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	08/07/2015	PRESENTO SOLICITUD Y DECLARACION JURADA PARA ACTUALIZACION
A	23/04/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	03/10/2013	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
A	23/07/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	11/06/2012	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
B	09/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: FORMULADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
09/06/2008	4	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: PROVEEDOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: PFGL	Sub Especialidad: PFGL	
Fecha	Categoría	Observaciones
06/10/2016	1	INGRESO COMO PROVEEDOR PFGL
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	
Fecha	Categoría	Observaciones
21/11/2016	2	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: DESARROLLO DE PROYECTOS BID	Sub Especialidad: DESARROLLO DE PROYECTOS BID	
Fecha	Categoría	Observaciones
14/07/2017	0	DESARROLLO DE PROYECTOS BID
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
21/11/2016	3	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
07/03/2011	4	CLIFICACION DE AUMENTO DE CATEGORIA
09/06/2008	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
07/03/2011	4	CLIFICACION DE AUMENTO DE CATEGORIA
09/06/2008	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003



proyecto

Proyecto: 342440 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN
Ubicación: [6] SAN SALVADOR [6] DELGADO [99] VARIOS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34244.0-2018
Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.
Fuente:
08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1787	JULIO CESAR	ROSALES MEJIA
Fecha de inicio:	11/06/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	09/10/2018		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	09/10/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$104,015.45		Plazo actual: 120
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$104,015.45		Dias en ejecución: 105
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$31,204.64 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$22,155.80 [21.30%]		Anticipo recuperado: \$6,646.74 [21.30 %]
Estimado en proceso:	\$20,625.93 [19.83 %]		Anticipo en proceso: \$6,187.78 [19.83 %]
Estimado total:	\$42,781.73 [41.13%]		Saldo anticipo: \$24,557.90 [78.70 %]
Desembolsado a la fecha:	\$46,713.70 [44.91%]		Porc. avance financiero: 21.30 %
			Porc. avance fisico: 79.87 %

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$31,204.64	07/06/18 9:09 am	07/06/18 9:09 am	12/06/18 7:38 am	13/06/18 8:36 am
1	E-1	\$7,595.21	25/07/18 4:23 pm	25/07/18 4:33 pm	26/07/18 12:23 pm	30/07/18 4:19 pm
2	E-2	\$14,560.59	29/08/18 2:51 pm	29/08/18 2:52 pm	30/08/18 1:03 pm	31/08/18 2:24 pm
3	E-3	\$20,625.93	19/09/18 4:08 pm	19/09/18 4:15 pm	24/09/18 7:45 am	

Estimado a la Fecha: \$42,781.73

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$20,803.09	07/05/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$31,204.64	07/05/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$104,015.45	08/11/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	11/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1787	JULIO CESAR ROSALES MEJIA	07/06/2018	

SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO

De: JULIO CESAR ROSALES MEJIA
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 08:01 a.m.
Para: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Asunto: RE: Informacion de proyectos

Buenos días Margarita

Confirmándole que al 22-sept-18 el avance del proyecto era el 79.87% según lo detallado en SGO. EL residente del proyecto es el Ing. César Arturo Castaneda Siete.

Saludos


De: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 10:26 a.m.
Para: JULIO CESAR ROSALES MEJIA
Asunto: Informacion de proyectos

Buenos días

Agradeceré me proporcione el avance físico a la fecha del proyecto código 342440 realizado por la empresa MONTELEC, OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATAN, en el SGO indica un avance del 79.87%, por lo que necesito confirmar dicha información, así mismo me proporcione el nombre del Residente del Proyecto.

Cordiales saludos

Sandra Margarita Méndez de Alvarado
Técnico ACI
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



proyecto
 Proyecto: 342730 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITE
 Ubicación: [2] SANTA ANA [1] SANTA ANA [1] SANTA ANA Modalidad: CENTRALIZADA

contrato
 Numero contrato: R/34273.0-2018
 Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.
 Fuente:
 91-5 FONDOS FANTEL

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1159	RENE MAURICIO	CERRITOS ALVARADO
Fecha de inicio:	16/07/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	13/11/2018		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	13/11/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$188,378.84		Plazo actual: 120
Monto reasignaciones:	\$1,945.44 [1.03%] [1]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$190,324.28		Dias en ejecución: 70
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$56,513.65 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$0.00 [0.00%]		Saldo anticipo: \$56,513.65 [100.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$56,513.65 [29.69%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance físico: 1.46 %

Información Movimientos									
No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas			
1	A-1	\$56,513.65	13/07/18 5:33 pm	13/07/18 5:33 pm	19/07/18 7:30 am	19/07/18 11:08 am			
1	R-1	\$1,945.44	17/09/18 11:41 am						

Estimado a la Fecha:

Información Garantías					
Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador	
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$37,675.77 ***	28/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$56,513.65	28/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$188,378.84 ***	13/12/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	16/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A	

*** Fecha de Vencimiento es anterior a Fecha Fin Actual o Monto es menor a Porcentaje por Monto Contractual.

Historico de Administradores de Contrato			
Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1159	RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO	13/07/2018	

0000659

SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO

De: RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 11:20 a.m.
Para: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Asunto: RE: Informacion de proyecto

Buenos días:

El avance de dicho proyecto a la fecha es de 1.54%.

El Personal clave en este proyecto es:

Gerente Residente: Ing. Carlos Alfonso Morales Rivas

Gerente de Control de Calidad: Arq. Raúl Ernesto Ramírez Rodríguez

Atte.

René Mauricio Cerritos Alvarado
AMU


De: SANDRA MARGARITA MENDEZ DE ALVARADO
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 10:28 a.m.
Para: RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO
Asunto: Informacion de proyecto

Buenos días

Agradeceré me proporcione el avance físico a la fecha del proyecto código 342730 realizado por la empresa MONTELEC, Suministro e instalación de mono polo de 30m....Santa Ana, en el SGO indica un avance del 1.46%, por lo que necesito confirmar dicha información, así mismo me proporcione el nombre del Residente del Proyecto.

Cordiales saludos

Sandra Margarita Méndez de Alvarado
Técnico ACI
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

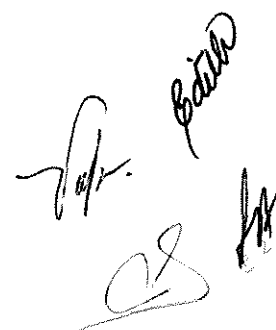

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
A&D INDUSTRIAS TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia A&D. INDUSTRIAS TEC	Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)	07/04/2016	06/04/2021	5 años	924
ABRAHAM ALBERTO MARÍN LÓPEZ	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)	26/09/2013	25/09/2018	5 años	0
ADVANCED LOGISTICS. GROUP, S.A.U.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	17/02/2018	16/02/2023	5 años	1605
AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ALCONSA. S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	01/04/2017	31/03/2022	5 años	1283
AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ALCONSA. S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	30/03/2017	29/03/2022	5 años	1281
ARCO INGENIEROS, S.A. DE C.V. ó ARCO, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	08/09/2015	07/09/2020	5 años	713
AVANCE ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia AVANCE ARQUITECTOS. S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	22/06/2016	21/06/2021	5 años	1000
BYRON FERNANDO LARIOS MARQUINA	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	18/03/2017	17/03/2022	5 años	1269
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE)	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	06/01/2016	05/01/2021	5 años	833
CIVIL-VIAL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	01/07/2015	30/06/2020	5 años	644
COMERCIAL FINANCIERA. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia COMFI. S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	24/08/2016	23/08/2021	5 años	1063
CONSORCIO ENEGOCIOS-SYSDE (Asocio-UDP, conformado por eNEGOCIOS.COM S.A. DE C.V. y SYSDE INTERNATIONAL INC.)	Banco de Fomento Agropecuario (BFA)	07/06/2017	06/06/2022	5 años	1350
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JC. S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	10/02/2018	09/02/2023	5 años	1598
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S. A. DE C. V. y CYSS, S. A. DE C. V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	26/09/2015	25/09/2020	5 años	731
CONSTRUCTORA LEO, S.A. de C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	12/04/2014	11/04/2019	5 años	198

(1 of 6)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y 12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda, Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

[Handwritten signatures and initials]

25/9/2018

Gobierno de El Salvador, CompraSal (<http://www.comprasal.gob.sv>)

CompraSal

[Inicio](#) [Como navegar \(/comprasal_web/porta...\)](#)

[Contáctenos](#)

[Mapa del sitio](#)

[Ayuda](#)



COMPRASal

Portal de gobierno para Contratos P. y S. de la Administración Pública

UNAC

([index.jsf](#))

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

[Contratistas incapacitados](#)

[Buscar](#)



Agencia Económica de Compras Públicas de El Salvador

0000661

UNAC

dex.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SALVADOREÑOS, S.A DE C.V. o CONCONSA, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	06/06/2015	05/06/2020	5 años	619
CONTRATISTA LOEL ELÍAS, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	25/03/2015	24/03/2020	5 años	546
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES DE MÉXICO, S.A. de C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	18/11/2014	17/11/2019	5 años	418
Control de Plagas y Servicios, S.A de C.V (COPSESA DE C.V)	Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)	12/07/2014	11/07/2019	5 años	289
DISTRIBUIDORA A & A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A & A, S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	02/06/2018	01/06/2023	5 años	1710
DISTRIBUIDORA A&A, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A&A,S.A. DE C.V.	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	25/08/2017	24/08/2022	5 años	1429
DOS M.G. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que se abrevia DOS M.G., S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/02/2017	21/02/2022	5 años	1245
EL LANCERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse EL LANCERO, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	19/05/2016	18/05/2021	5 años	966
ESTUDIO QUINIENTOS TRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ESTUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	10/07/2018	09/07/2023	5 años	1748
ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A de C.V. (CLIMATIK, S.A. de C.V.)	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	11/09/2014	10/09/2019	5 años	350
FELIPE ANTONIO CARRANZA FLORES	Ministerio de Salud (MINSAL)	20/04/2017	19/04/2022	5 años	1302
GRUPO 17, S.A. DE C.V	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	24/05/2014	23/05/2019	5 años	240
GRUPO BABEL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	23/07/2015	22/07/2020	5 años	666
GRUPO REP, S.A. DE C.V.	Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSAATUR)	28/02/2014	27/02/2019	5 años	155
GRUPO REP, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14/11/2013	13/11/2018	5 años	49



MINISTERIO DE HACIENDA

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y 12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



0000662



COMPRASal

Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC

dex.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
Grupo REP, S.A. de C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	25/07/2014	24/07/2019	5 años	302
HERBERT RENE CHAVEZ CENTENO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/07/2017	27/07/2022	5 años	1401
IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	29/07/2014	28/07/2019	5 años	306
IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. de C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	30/10/2014	29/10/2019	5 años	399
INTERNATIONAL TRADING S.A. DE C.V.	Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)	07/05/2015	06/05/2020	5 años	589
INTERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	25/08/2015	24/08/2020	5 años	699
INTERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	27/05/2015	26/05/2020	5 años	609
INTERNATIONAL TRADING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	22/08/2015	21/08/2020	5 años	696
INVERSIONES HABV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia HABV, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	18/01/2017	17/01/2022	5 años	1210
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ICEPROM, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	15/03/2014	14/03/2019	5 años	170
IRRIPOZOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia IRRIPOZOS, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	20/10/2016	19/10/2021	5 años	1120
Ignacio Argueta Chica propietario de la empresa O&P EL SALVADOR	Policía Nacional Civil (PNC)	31/10/2013	30/10/2018	5 años	35
J.G. SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V. (J.G. SERTEC, S.A. DE C.V.)	Ministerio de Educación (MINED)	23/08/2014	22/08/2019	5 años	331
J.G.SERTEC, S.A. de C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	18/02/2014	17/02/2019	5 años	145
JM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia JM INVERSIONES S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	01/02/2017	31/01/2022	5 años	1224



GOBIERNO
DE EL SALVADOR

MINISTERIO
DE HACIENDA

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y
12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



0000663

UNAC

dex.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados


Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
JOCELYN VERÓNICA COTO DÍAZ	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	03/06/2015	02/06/2020	5 años	616
JOCS, INGENIEROS Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse JOCS, S.A. DE C.V.	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	17/02/2018	16/02/2023	5 años	1605
JORGE ADALBERTO SALAZAR GRANDE	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	24/07/2015	23/07/2020	5 años	667
JORGE ANTONIO DE JESUS ALFARO PINEDA	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	06/10/2017	05/10/2022	5 años	1471
JOSE EDUARDO GIL MAJANO conocido por JOSE EDUARDO GIL MAJANO MONTANO	Ministerio de Salud (MINSAL)	07/10/2016	06/10/2021	5 años	1107
JOSE EDUARDO GIL MAJANO conocido por JOSE EDUARDO GIL MAJANO MONTANO	Ministerio de Salud (MINSAL)	15/09/2016	14/09/2021	5 años	1085
JOSE HERIBERTO CARRANZA SILVA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2016	24/08/2021	5 años	1064
JOSE OSWALDO ERAZO MEDINA	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	23/05/2017	22/05/2022	5 años	1335
INDICE HORTENSIA PORTAL MIRANDA	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	30/11/2013	29/11/2018	5 años	65
LUIS NAPOLEON GUARDADO VILLANUEVA	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	27/09/2015	26/09/2020	5 años	732
MALMEX, S.A. DE C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	21/03/2015	20/03/2020	5 años	542
MAQCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia MAQCO, S.A. DE C.V.	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	15/05/2018	14/05/2023	5 años	1692
MARIA LISSETTE TORRES NUÑEZ	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	30/11/2013	29/11/2018	5 años	65
MARIELOS GUZMAN GUARDADO	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	23/06/2015	22/06/2020	5 años	636
MAURICIO ANTONIO SANCHEZ VELASQUEZ	Ministerio de Educación (MINED)	23/08/2015	22/08/2020	5 años	697

(4 of 6)

25/09/2018 08:40 AM



Ministerio de Hacienda

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (<mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv>), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y 12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
0000664 MERIDION TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MERIDION TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	10/02/2018	09/02/2023	5 años	1598
NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/05/2018	21/05/2023	5 años	1699
NICOLÁS WILFREDO AGUILAR PINEDA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	17/02/2015	16/02/2020	5 años	509
OBRAS CIVILES Y CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse OCCA, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar. "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	23/05/2017	22/05/2022	5 años	1335
OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	04/12/2015	03/12/2020	5 años	800
OFICINA TÉCNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMÉRICA, S.A. de C.V o AP DE CENTROAMÉRICA, S.A. D	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	30/06/2015	29/06/2020	5 años	643
OSCAR ALEJANDRO GUERRERO MEDRANO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2016	24/08/2021	5 años	1064
PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	07/02/2017	06/02/2022	5 años	1230
PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse PRODIEL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	21/09/2016	20/09/2021	5 años	1091
PROYECTOS Y SISTEMAS PROYECTICA, S.A.	Defensoría del Consumidor	03/04/2014	02/04/2019	5 años	189
PRÓXIMA GROUP, S.A. DE C.V.	Defensoría del Consumidor	03/04/2014	02/04/2019	5 años	189
RAFAEL ERNESTO ARTIGA GUDIEL	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	16/04/2015	15/04/2020	5 años	568
ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	21/12/2013	20/12/2018	5 años	86
ERPRODISA, S.A. DE C.V.	Policía Nacional Civil (PNC)	05/02/2014	04/02/2019	5 años	132
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V o SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.	Defensoría del Consumidor	22/12/2015	21/12/2020	5 años	818

(5 of 6)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y 12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



Edificio

25/9/2018

Gobierno de El Salvador, CompraSal (<http://www.comprasal.gob.sv>)

CompraSal

[Inicio](#) [Como navegar \(/comprasal_web/portal_como_navegar.html\)](#)

[Contáctenos](#)

[Mapa del sitio](#)

[Ayuda](#)



COMPRASal

el sistema electrónico de compras del gobierno de El Salvador

UNAC

(index.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

()

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	0000665	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
A&D INDUSTRIAS TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia A&D. INDUSTRIAS TEC		Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)	07/04/2016	06/04/2021	5 años	924
ABRAHAM ALBERTO MARÍN LÓPEZ		Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)	26/09/2013	25/09/2018	5 años	0
ADVANCED LOGISTICS. GROUP. S.A.U.		Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	17/02/2018	16/02/2023	5 años	1605
AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ALCONSA. S.A. DE C.V.		Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	01/04/2017	31/03/2022	5 años	1283
AGUILAR LOPEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ALCONSA. S.A. DE C.V.		Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	30/03/2017	29/03/2022	5 años	1281
ARCO INGENIEROS, S.A. DE C.V. ó ARCO, S.A. DE C.V.		Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	08/09/2015	07/09/2020	5 años	713
AVANCE ARQUITECTOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia AVANCE ARQUITECTOS. S.A. DE C.V.		Ministerio de Salud (MINSAL)	22/06/2016	21/06/2021	5 años	1000
BYRON FERNANDO LARIOS MARQUINA		Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	18/03/2017	17/03/2022	5 años	1269
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE)		Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	06/01/2016	05/01/2021	5 años	833
CIVIL-VIAL, S.A. DE C.V.		Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	01/07/2015	30/06/2020	5 años	644
COMERCIAL FINANCIERA. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia COMFI. S.A. DE C.V.		Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	24/08/2015	23/08/2021	5 años	1063
CONSORCIO ENEGOCIOS-SYSDE (Asocio-UDP conformado por eNEGOCIOS.COM S.A. DE C.V. y SYSDE INTERNATIONAL INC.)		Banco de Fomento Agropecuario (BFA)	07/06/2017	06/06/2022	5 años	1350
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JC. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JC. S.A. DE C.V.		Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	10/02/2018	09/02/2023	5 años	1598
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SERPAS, S. A. DE C. V. y CYSS, S. A. DE C. V.		Ministerio de Salud (MINSAL)	26/09/2015	25/09/2020	5 años	731
CONSTRUCTORA LEO. S.A. de C.V.		Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	12/04/2014	11/04/2019	5 años	198

(1 of 6)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y 12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes.1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



MINISTERIO DE HACIENDA

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Eduardo'.

25/9/2018

Gobierno de El Salvador, CompraSal (<http://www.comprasal.gob.sv>)

CompraSal

[Inicio](#) [Como navegar \(/comprasal_web/portal_como_navegar.html\)](#)

[Contáctenos](#)

[Mapa del sitio](#)

[Ayuda](#)



COMPRASal

INAC

(index.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

[Contratistas incapacitados](#)

[Buscar](#)



lex.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contactenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SALVADOREÑOS. S.A DE C.V. o CONCONSA. S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	06/06/2015	05/06/2020	5 años	619
CONTRATISTA LOEL ELÍAS. S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	25/03/2015	24/03/2020	5 años	546
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES DE MÉXICO. S.A. de C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	18/11/2014	17/11/2019	5 años	418
Control de Plagas y Servicios. S.A de C.V (COPSESA DE C.V)	Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA)	12/07/2014	11/07/2019	5 años	289
DISTRIBUIDORA A & A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A & A. S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	02/06/2018	01/06/2023	5 años	1710
DISTRIBUIDORA A&A. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A&A.S.A. DE C.V.	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	25/08/2017	24/08/2022	5 años	1429
DOS M.G. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que se abrevia DOS M.G.. S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/02/2017	21/02/2022	5 años	1245
EL LANCERO. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse EL LANCERO. S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	19/05/2016	18/05/2021	5 años	966
ESTUDIO QUINIENTOS TRES. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ESTUDIO QUINIENTOS TRES. S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	10/07/2018	09/07/2023	5 años	1748
ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A de C.V. (CLIMATIK. S.A. de C.V.)	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	11/09/2014	10/09/2019	5 años	350
FELIPE ANTONIO CARRANZA FLORES	Ministerio de Salud (MINSAL)	20/04/2017	19/04/2022	5 años	1302
GRUPO 17. S.A. DE C.V	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	24/05/2014	23/05/2019	5 años	240
GRUPO BABEL DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	23/07/2015	22/07/2020	5 años	666
GRUPO REP. S.A. DE C.V.	Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSA TUR)	28/02/2014	27/02/2019	5 años	155
GRUPO REP. S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14/11/2013	13/11/2018	5 años	49


Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y
12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes. 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043__24072018

25/09/2018 08:40 AM



0000667

...ex.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
Grupo REP. S.A. de C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	25/07/2014	24/07/2019	5 años	302
HERBERT RENE CHAVEZ CENTENO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/07/2017	27/07/2022	5 años	1401
IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	29/07/2014	28/07/2019	5 años	306
IMPORTACIONES GLOBALES, S.A. de C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	30/10/2014	29/10/2019	5 años	399
INTERNATIONAL TRADING S.A. DE C.V.	Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA)	07/05/2015	06/05/2020	5 años	589
INTERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	25/08/2015	24/08/2020	5 años	699
INTERNATIONAL TRADING, S.A. DE C.V.	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	27/05/2015	26/05/2020	5 años	609
INTERNATIONAL TRADING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	22/08/2015	21/08/2020	5 años	696
INVERSIONES HABV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreva HABV, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	18/01/2017	17/01/2022	5 años	1210
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ENGELBERTO PEREZ ROMERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ICEPROM, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	15/03/2014	14/03/2019	5 años	170
IRRIPOZOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreva IRRIPOZOS, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	20/10/2016	19/10/2021	5 años	1120
Ignacio Argueta Chica propietario de la empresa O&P EL SALVADOR	Policía Nacional Civil (PNC)	31/10/2013	30/10/2018	5 años	35
J.G. SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V. (J.G. SERTEC, S.A. DE C.V.)	Ministerio de Educación (MINED)	23/08/2014	22/08/2019	5 años	331
J.G.SERTEC, S.A. de C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	18/02/2014	17/02/2019	5 años	145
JM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abreva JM INVERSIONES S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	01/02/2017	31/01/2022	5 años	1224

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y
12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



index.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
JOCELYN VERÓNICA COTO DIAZ	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	03/06/2015	02/06/2020	5 años	616
JOCS INGENIEROS Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse JOCS. S.A. DE C.V.	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	17/02/2018	16/02/2023	5 años	1605
JORGE ADALBERTO SALAZAR GRANDE	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	24/07/2015	23/07/2020	5 años	667
JORGE ANTONIO DE JESUS ALFARO PINEDA	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	06/10/2017	05/10/2022	5 años	1471
JOSE EDUARDO GIL MAJANO conocido por JOSE EDUARDO GIL MAJANO MONTANO	Ministerio de Salud (MINSAL)	07/10/2016	06/10/2021	5 años	1107
JOSE EDUARDO GIL MAJANO conocido por JOSE EDUARDO GIL MAJANO MONTANO	Ministerio de Salud (MINSAL)	15/09/2016	14/09/2021	5 años	1085
JOSE HERIBERTO CARRANZA SILVA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2016	24/08/2021	5 años	1064
JOSE OSWALDO ERAZO MEDINA	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	23/05/2017	22/05/2022	5 años	1335
ORTIZ HORTENSIA PORTAL MIRANDA	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	30/11/2013	29/11/2018	5 años	65
LUIS NAPOLEON GUARDADO VILLANUEVA	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	27/09/2015	26/09/2020	5 años	732
MALMEX. S.A. DE C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	21/03/2015	20/03/2020	5 años	542
MAQCO. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia MAQCO. S.A. DE C.V.	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	15/05/2018	14/05/2023	5 años	1692
MARIA LISSETTE TORRES NUÑEZ	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	30/11/2013	29/11/2018	5 años	65
MARIELOS GUZMAN GUARDADO	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	23/06/2015	22/06/2020	5 años	636
MAURICIO ANTONIO SANCHEZ VELASQUEZ	Ministerio de Educación (MINED)	23/08/2015	22/08/2020	5 años	697

(4 of 6)

25/09/2018 08:40 AM

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y
12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la República de El Salvador, Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
0000663 MERIDION TRADING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MERIDION TRADING GROUP, S.A. DE C.V.	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	10/02/2018	09/02/2023	5 años	1598
NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	22/05/2018	21/05/2023	5 años	1699
NICOLÁS WILFREDO AGUILAR PINEDA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	17/02/2015	16/02/2020	5 años	509
OBRAS CIVILES Y CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse OCCA, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar. "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	23/05/2017	22/05/2022	5 años	1335
OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMERICA. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	04/12/2015	03/12/2020	5 años	800
OFICINA TÉCNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V o AP DE CENTROAMÉRICA S.A. D	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	30/06/2015	29/06/2020	5 años	643
OSCAR ALEJANDRO GUERRERO MEDRANO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2016	24/08/2021	5 años	1064
PERFORACIONES VILLATORO VASQUEZ. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	07/02/2017	06/02/2022	5 años	1230
PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse PRODIEL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	21/09/2016	20/09/2021	5 años	1091
PROYECTOS Y SISTEMAS PROYECTICA, S.A.	Defensoría del Consumidor	03/04/2014	02/04/2019	5 años	189
PRÓXIMA GROUP, S.A. DE C.V.	Defensoría del Consumidor	03/04/2014	02/04/2019	5 años	189
RAFAEL ERNESTO ARTIGA GUDIEL	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	16/04/2015	15/04/2020	5 años	568
ROLAN HOMERO RODRIGO AVENDAÑO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	21/12/2013	20/12/2018	5 años	86
SERPRODISA, S.A. DE C.V.	Policía Nacional Civil (PNC)	05/02/2014	04/02/2019	5 años	132
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V o SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.	Defensoría del Consumidor	22/12/2015	21/12/2020	5 años	818

(5 of 6)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv). (503) 2244-3171 Horarios: 8:30am a 12:00m y 12:40pm a 4:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.043_24072018

25/09/2018 08:40 AM



(index.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

[Contratistas incapacitados](#)

[Buscar](#)
